Travaux d'extension et restructuration des Urgences de l'hôpital de Saint Denis.
Calendrier général des études et des travaux.

Centre Hospitalier de Saint-Denis

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**DATE CLE DU PROJET (36 MOIS)**	**785 jrs**	**Lun 30/06/25**	**Ven 30/06/28**
2	Notification du marché de MOE	0 jr	Lun 30/06/25	Lun 30/06/25
3	Dépôt PC	0 jr	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26
4	Obtention PC	0 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26
5	PC purgé	0 jr	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
6	Lancement en consultation TCE	0 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26
7	OS de démarrage travaux TCE	0 jr	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26
8	Mise en service garage SMUR	0 jr	Ven 26/03/27	Ven 26/03/27
9	Mise en service extension EST et sous dalle	0 jr	Ven 29/10/27	Ven 29/10/27
10	Mise en service phase 2 - pédiatie et SAUV	0 jr	Ven 03/03/28	Ven 03/03/28
11	Mise en service phase 3 - urgence adutes	0 jr	Ven 30/06/28	Ven 30/06/28
12	Commision de sécurité finale	0 jr	Lun 29/05/28	Lun 29/05/28
13	Réception de l'ensemble des nouvelles Urgences	0 jr	Ven 09/06/28	Ven 09/06/28
14	Fin de levée de réserves	0 jr	Ven 30/06/28	Ven 30/06/28
15	**ETUDE DE CONCEPTION (15,5 mois)**	**340 jrs**	**Lun 30/06/25**	**Ven 16/10/26**
16	**Phase APS/APD (7 mois)**	**150 jrs**	**Lun 30/06/25**	**Ven 23/01/26**
17	Lancement des études	0 jr	Lun 30/06/25	Lun 30/06/25
18	Finalisation dossier ESQ (4 semaines)	20 jrs	Lun 30/06/25	Ven 25/07/25
19	Validation dossier ESQ (4s)	20 jrs	Lun 28/07/25	Ven 22/08/25
20	Elaboration dossier APS (6 semaines)	30 jrs	Lun 25/08/25	Ven 03/10/25
21	Validation dossier APS (4s)	20 jrs	Lun 06/10/25	Ven 31/10/25
22	Elaboration dossier APD (8 semaines)	40 jrs	Lun 03/11/25	Ven 26/12/25
23	Validation dossier APD (4s)	20 jrs	Lun 29/12/25	Ven 23/01/26
24	**Dossier PC**	**179 jrs**	**Lun 26/01/26**	**Jeu 01/10/26**
25	Elaboration dossier PC (3s)	15 jrs	Lun 26/01/26	Ven 13/02/26
26	Validation (2s)	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26
27	Dépôt du PC	0 jr	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26
28	Instruction du dossier PC (5 mois)	110 jrs	Lun 02/03/26	Ven 31/07/26
29	Otention des attendus	0 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26
30	Délai de recours des tiers	44 jrs	Lun 03/08/26	Jeu 01/10/26
31	PC purgé	0 jr	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
32	**Phase PRO/DCE/ACT (restructuration urgence)**	**190 jrs**	**Lun 26/01/26**	**Ven 16/10/26**

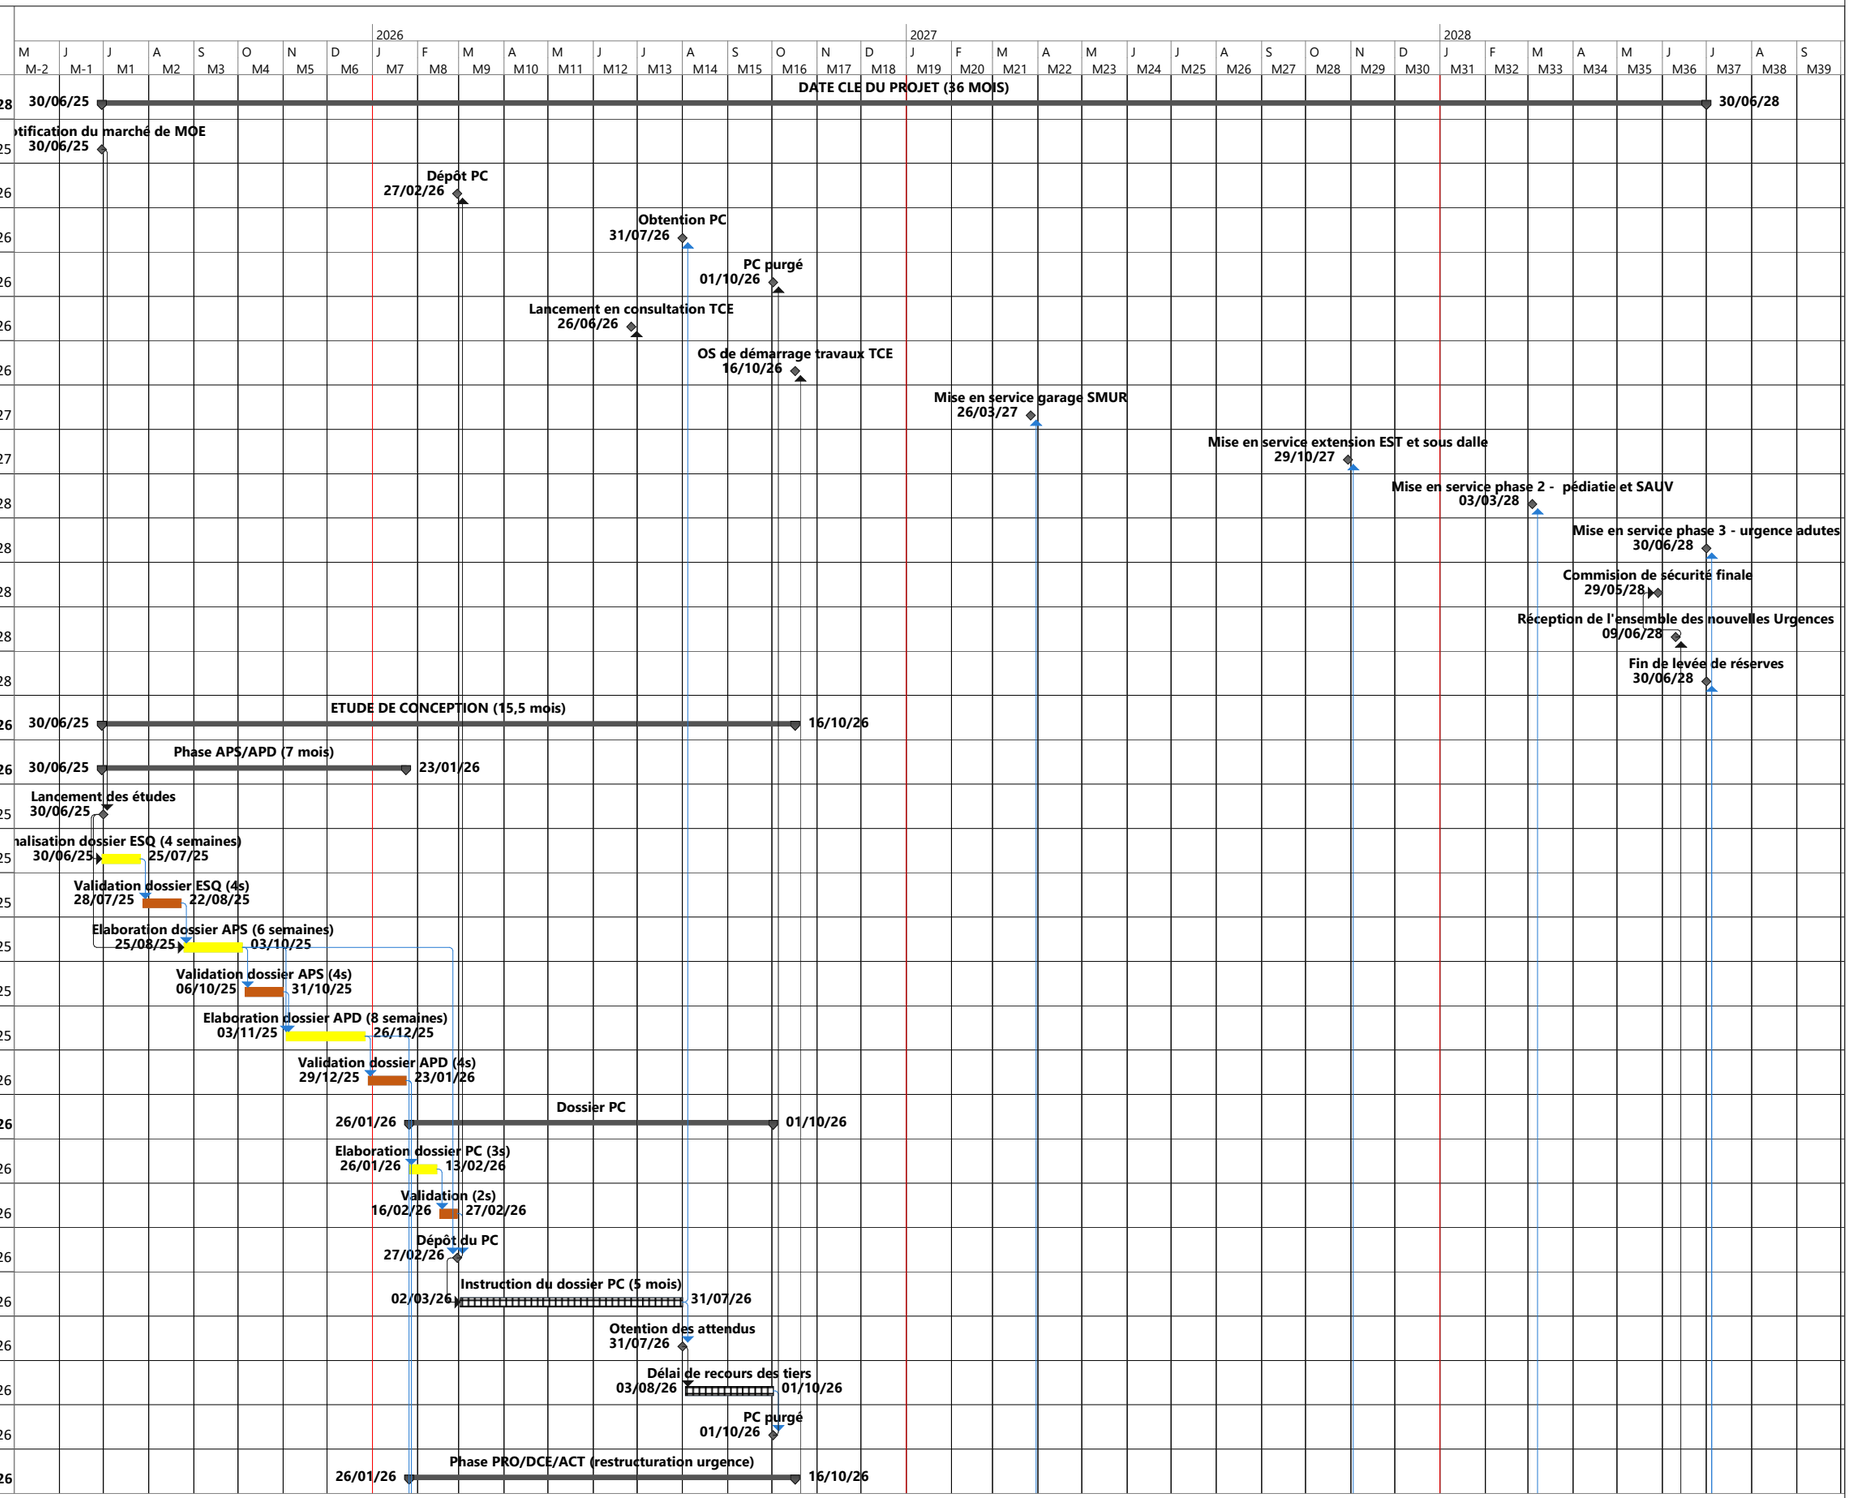

Phase concours avril 2025.

Travaux d'extension et restructuration des Urgences de l'hôpital de Saint Denis.
Calendrier général des études et des travaux.

Centre Hospitalier de Saint-Denis

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
33	Elaboration dossier PRO (12 semaines)	60 jrs	Lun 26/01/26	Ven 17/04/26
34	Validation dossier PRO	25 jrs	Lun 20/04/26	Ven 22/05/26
35	Elaboration dossier DCE (4 semaines)	10 jrs	Lun 25/05/26	Ven 05/06/26
36	Validation dossier DCE	15 jrs	Lun 08/06/26	Ven 26/06/26
37	Lancement consultation	0 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26
38	Consultation entreprises (8 semaines)	40 jrs	Lun 29/06/26	Ven 21/08/26
39	Réception des offres	0 jr	Ven 21/08/26	Ven 21/08/26
40	Analyse des offres	20 jrs	Lun 24/08/26	Ven 18/09/26
41	Validation rapport ACT	10 jrs	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
42	ACT marchés	0 jr	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
43	Elaboration dossiers marché	10 jrs	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
44	Notification des marchés	0 jr	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26
45	**EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 20,5 mois)**	**445 jrs**	**Ven 16/10/26**	**Ven 30/06/28**
46	OS de démarrage des tavaux TCE	0 jr	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26
47	Période de préparation	30 jrs	Lun 19/10/26	Ven 27/11/26
48	Intallation de chantier	20 jrs	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26
49	Etudes d'exécution et de synthèse	310 jrs	Lun 02/11/26	Ven 07/01/28
50	**PHASE 1a&1b : construction du nouveau garage SMUR + couloir accès (4 mois)**	**85 jrs**	**Lun 30/11/26**	**Ven 26/03/27**
51	Phase 1a : curage, démolition partielle, préparation emprise	25 jrs	Lun 30/11/26	Ven 01/01/27
52	**Phase 1b : construction nouvel accès**	**60 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Ven 26/03/27**
53	Réalisation gros-oeuvre garage SMUR	20 jrs	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27
54	Aménagement CET/CEA garage et couloir	30 jrs	Lun 25/01/27	Ven 05/03/27
55	Essais techniques et OPR	10 jrs	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27
56	Réception partielle nouveau garage	0 jr	Ven 19/03/27	Ven 19/03/27
57	Levées de réserves et déménagement	5 jrs	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27
58	**PHASE 1c&1d : extension EST et sous dalle (7 mois)**	**155 jrs**	**Lun 29/03/27**	**Ven 29/10/27**
59	Phase 1c : curage, démolition partielle, préparation emprise	20 jrs	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27
60	**Phase 1d : construction extension**	**135 jrs**	**Lun 26/04/27**	**Ven 29/10/27**
61	Fondation profondes extension Est	15 jrs	Lun 26/04/27	Ven 14/05/27
62	Longrines et dallage plancher RdC	15 jrs	Lun 10/05/27	Ven 28/05/27
63	Réalisation élévation et Ph en RdC	10 jrs	Lun 31/05/27	Ven 11/06/27
64	Réalisation élévation et Ph en R+1	10 jrs	Lun 14/06/27	Ven 25/06/27

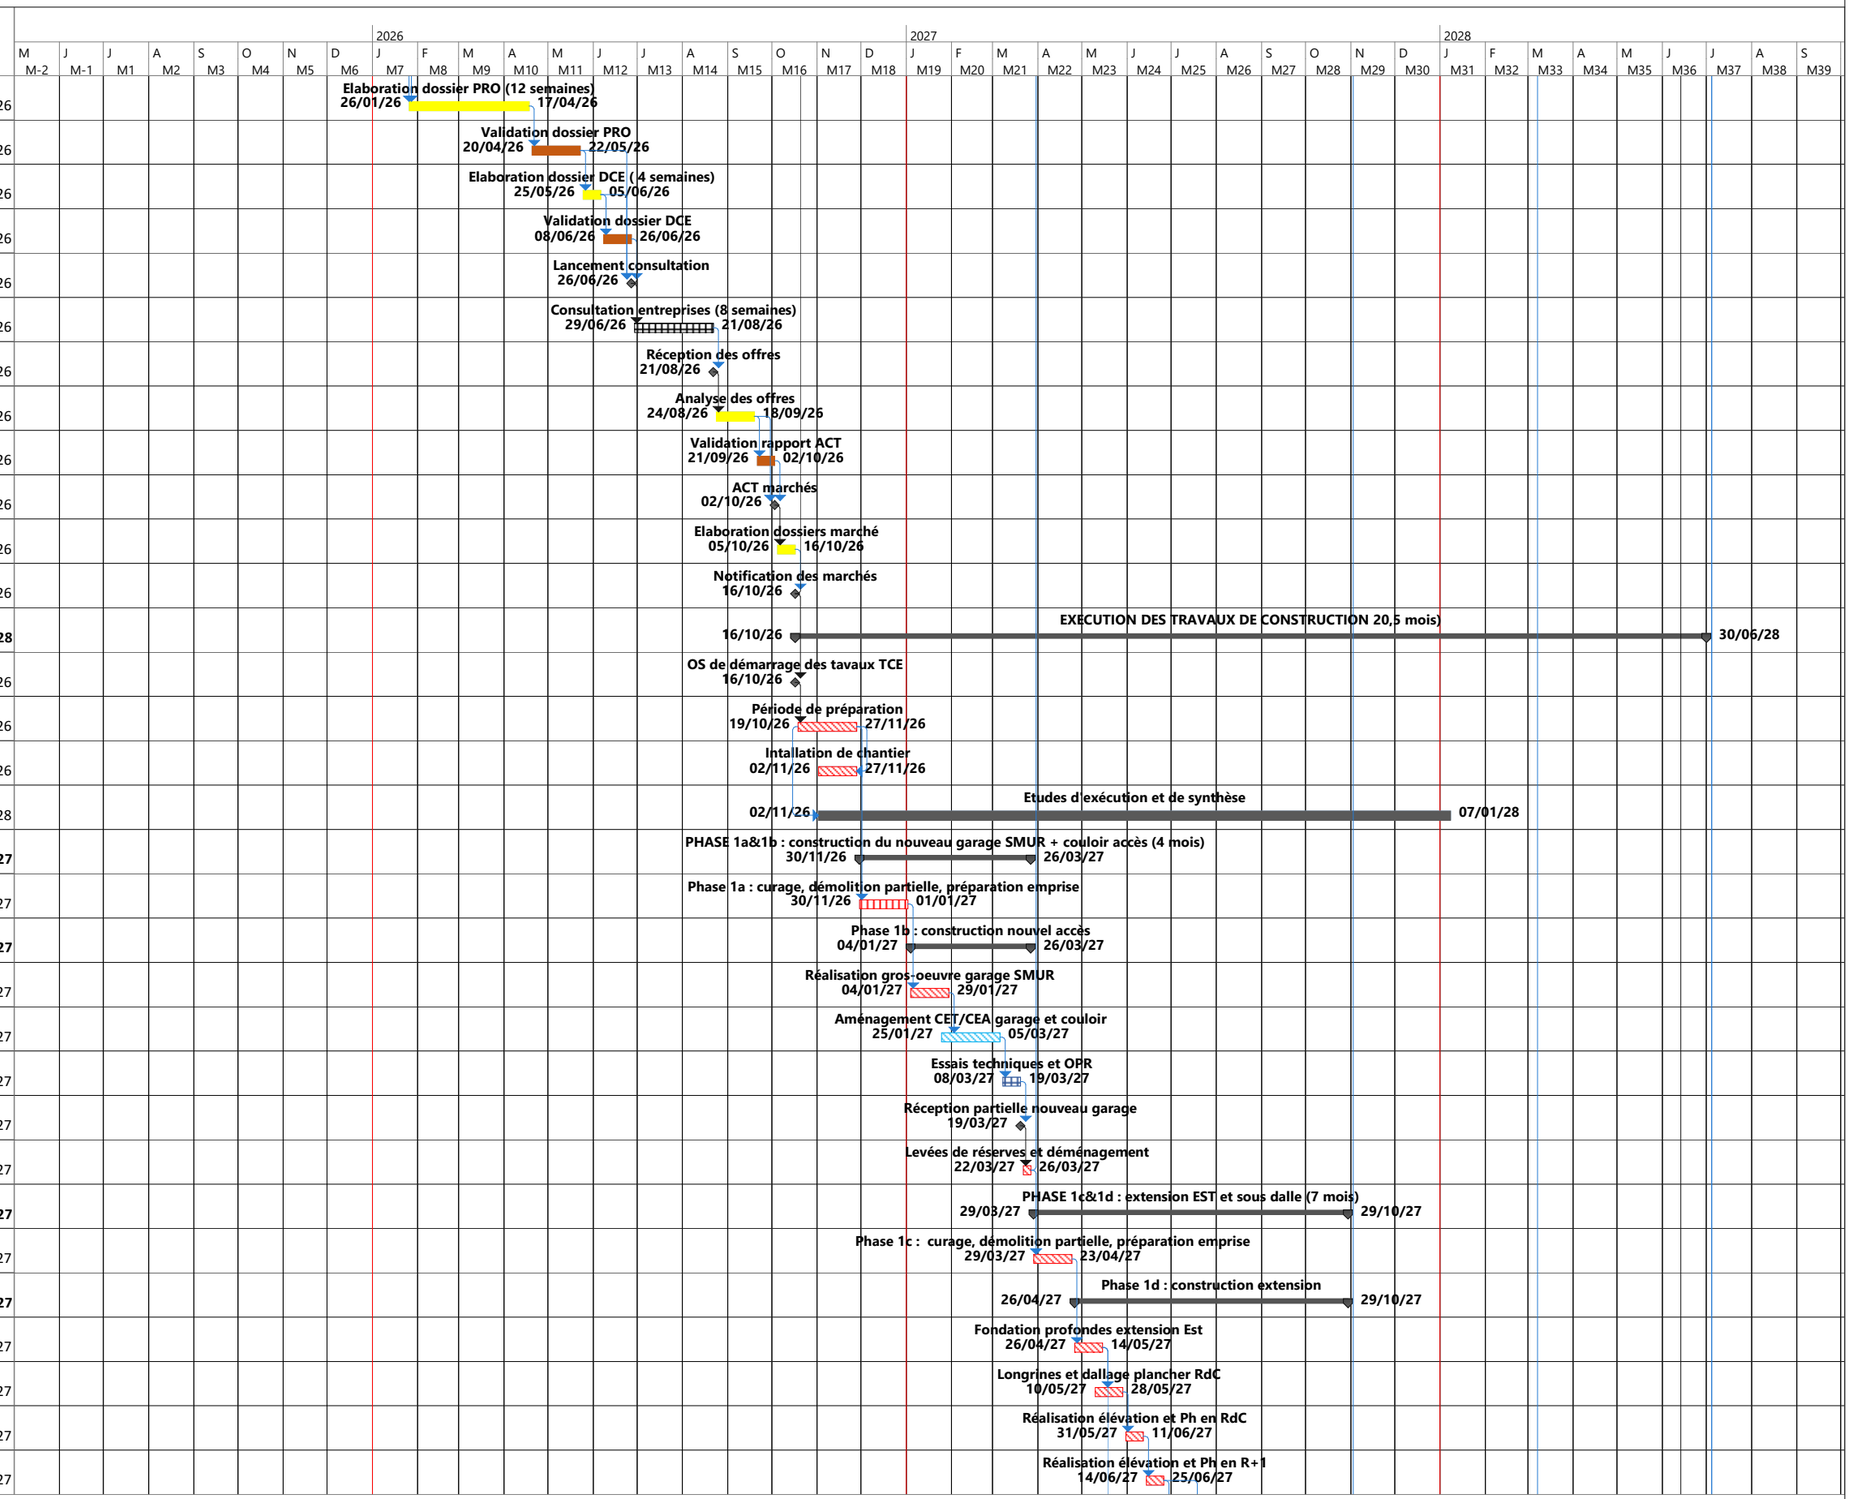

Phase concours avril 2025.

Travaux d'extension et restructuration des Urgences de l'hôpital de Saint Denis.
Calendrier général des études et des travaux.

Centre Hospitalier de Saint-Denis

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
65	Réalisation LT en terrasse	10 jrs	Lun 28/06/27	Ven 09/07/27
66	Gros-oeuvre et cloisonnement extension sous dalle	30 jrs	Lun 17/05/27	Ven 25/06/27
67	Clos et couvert	20 jrs	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27
68	Mise HE/HA extension	0 jr	Ven 16/07/27	Ven 16/07/27
69	Travaux CET	40 jrs	Lun 28/06/27	Ven 20/08/27
70	Travaux CEA	40 jrs	Lun 19/07/27	Ven 10/09/27
71	Equipement LT terasse	40 jrs	Lun 12/07/27	Ven 03/09/27
72	Montage ASC	30 jrs	Lun 19/07/27	Ven 27/08/27
73	VRD & abords	20 jrs	Lun 09/08/27	Ven 03/09/27
74	Essais techniques et OPR	20 jrs	Lun 13/09/27	Ven 08/10/27
75	Réception partielle extension	0 jr	Ven 08/10/27	Ven 08/10/27
76	Levées de réserves et déménagement	15 jrs	Lun 11/10/27	Ven 29/10/27
77	**Phase 2 pédiatrie et SAUV (4 mois)**	**90 jrs**	**Lun 01/11/27**	**Ven 03/03/28**
78	Phase 2a : curage, démolition partielle, préparation emprise	25 jrs	Lun 01/11/27	Ven 03/12/27
79	**Phase 2b : réaménagement de la partie Ouest des Urgences**	**75 jrs**	**Lun 22/11/27**	**Ven 03/03/28**
80	Travaux GOE et cloisonnement	30 jrs	Lun 22/11/27	Ven 31/12/27
81	Travaux CET	30 jrs	Lun 06/12/27	Ven 14/01/28
82	Travaux CEA	30 jrs	Lun 20/12/27	Ven 28/01/28
83	Finitions TCE et appaeillage	20 jrs	Lun 03/01/28	Ven 28/01/28
84	Essais techniques et OPR	15 jrs	Lun 24/01/28	Ven 11/02/28
85	Réception partielle extension	0 jr	Ven 11/02/28	Ven 11/02/28
86	Levées de réserves et déménagement	15 jrs	Lun 14/02/28	Ven 03/03/28
87	**Phase 3 urgences adultes (4 mois)**	**85 jrs**	**Lun 06/03/28**	**Ven 30/06/28**
88	Phase 3a : curage, démolition partielle, préparation emprise	20 jrs	Lun 06/03/28	Ven 31/03/28
89	**Phase 3b : réaménagement de la partie Est des Urgences**	**75 jrs**	**Lun 20/03/28**	**Ven 30/06/28**
90	Travaux GOE et cloisonnement	30 jrs	Lun 20/03/28	Ven 28/04/28
91	Travaux CET	30 jrs	Lun 03/04/28	Ven 12/05/28
92	Travaux CEA	30 jrs	Lun 17/04/28	Ven 26/05/28
93	Finitions TCE et appaeillage	20 jrs	Lun 01/05/28	Ven 26/05/28
94	Essais techniques et OPR	15 jrs	Lun 22/05/28	Ven 09/06/28
95	Réception partielle extension	0 jr	Ven 09/06/28	Ven 09/06/28
96	Levées de réserves et déménagement	15 jrs	Lun 12/06/28	Ven 30/06/28

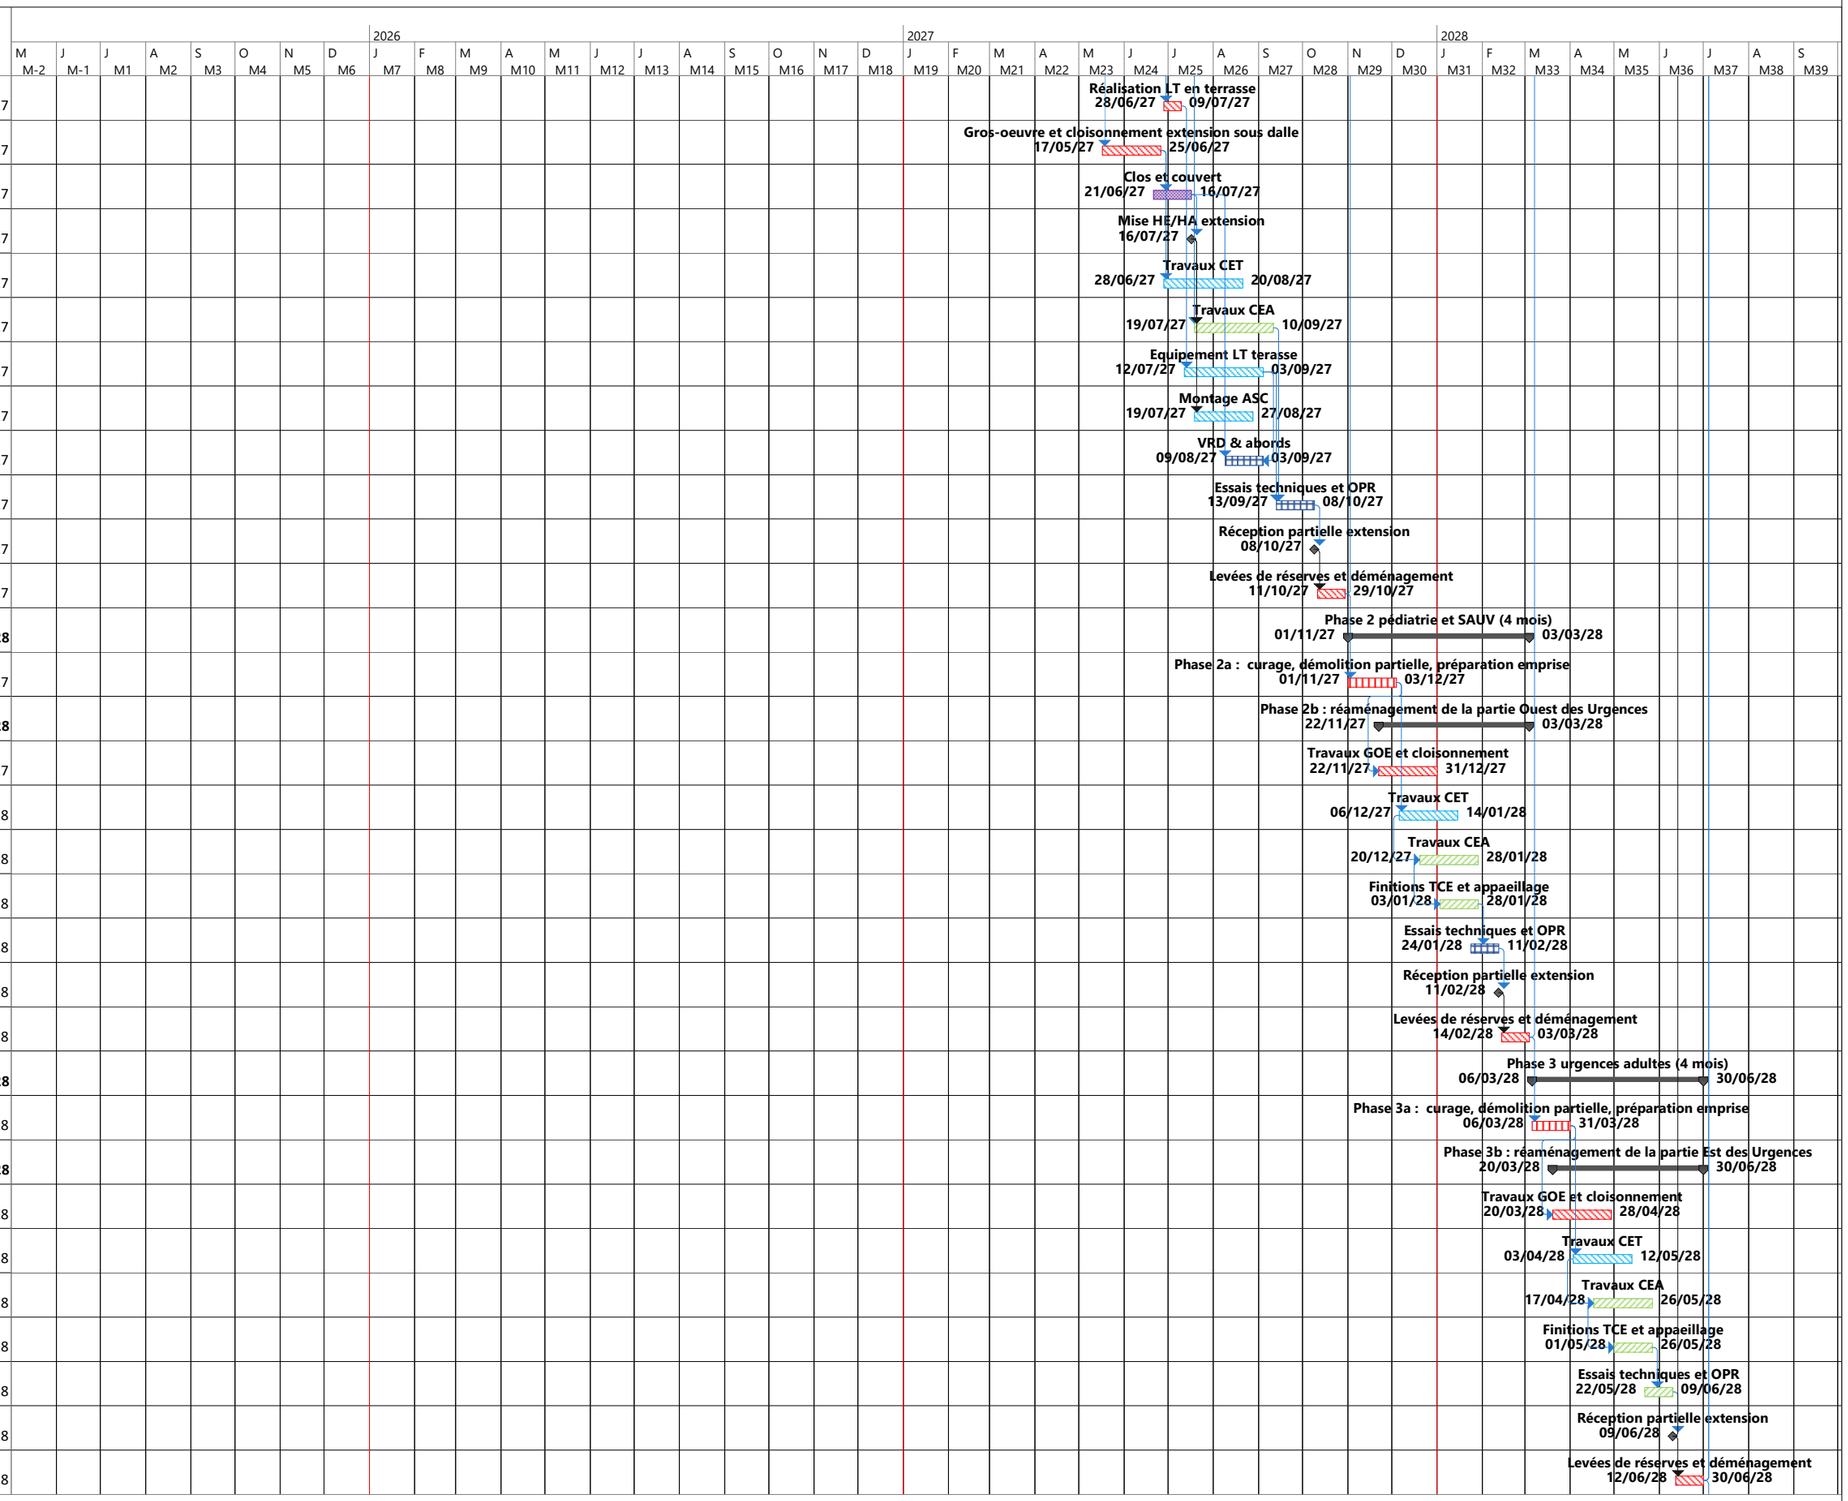

Phase concours avril 2025.

Travaux d'extension et restructuration des Urgences de l'hôpital de Saint Denis.
Calendrier général des études et des travaux.

Centre Hospitalier de Saint-Denis

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
97	Dépose des installations de chantier et remise en état des abords	15 jrs	Lun 03/07/28	Ven 21/07/28
