RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES
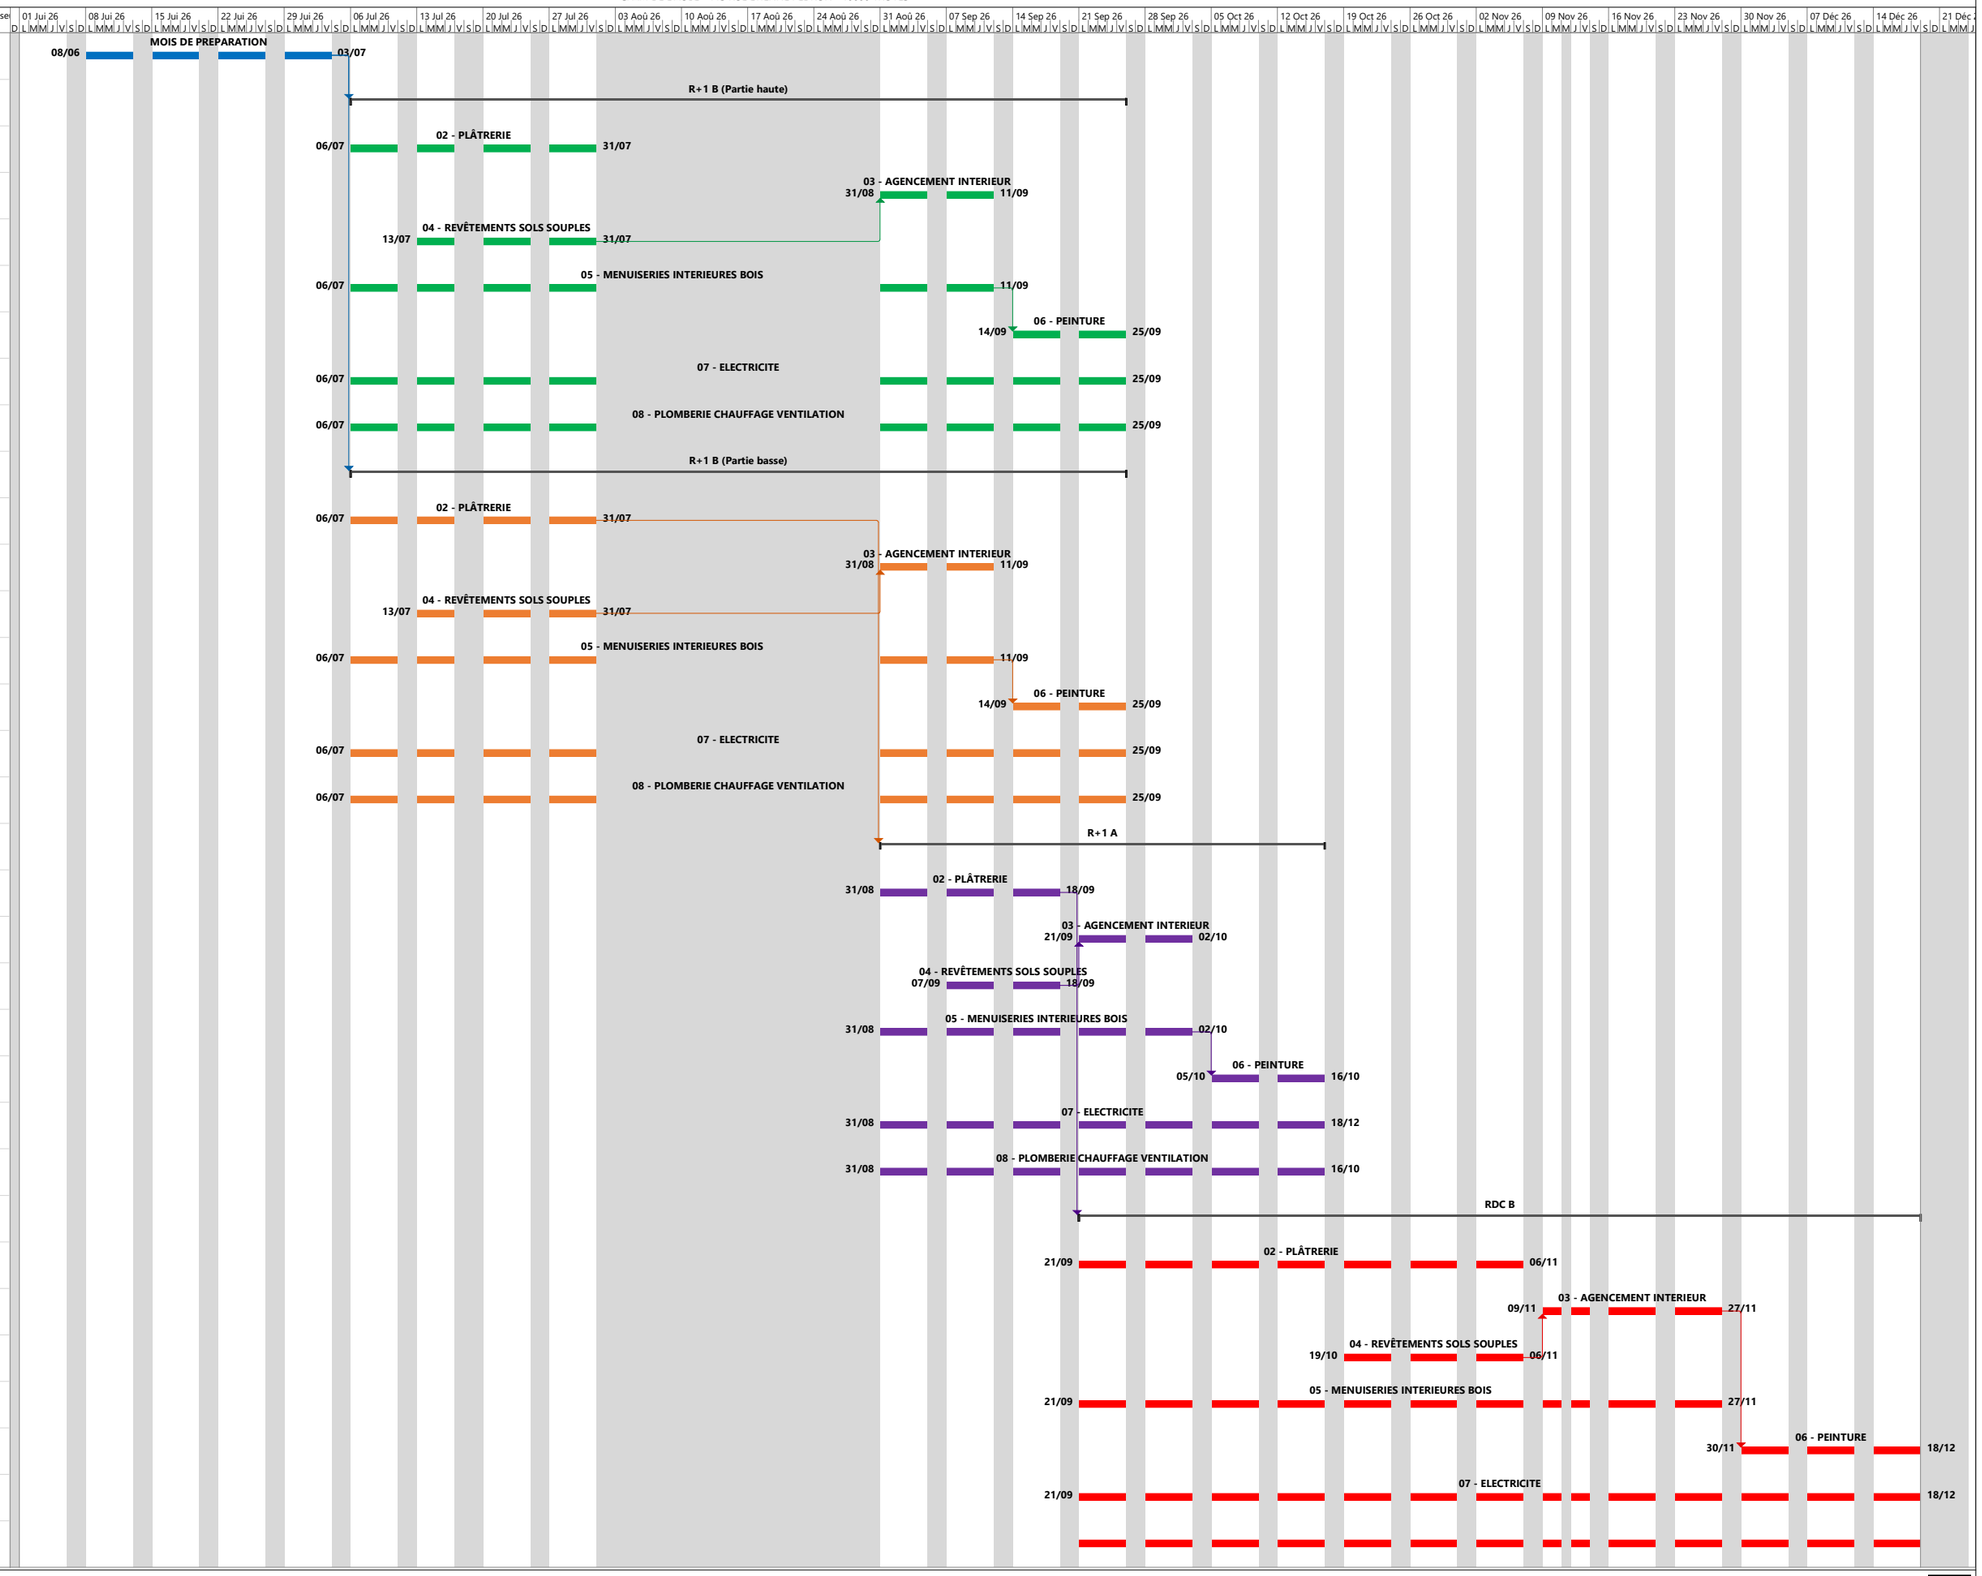
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	MOIS DE PREPARATION	20 jours	Lun 08/06/26	Ven 03/07/26	
2	**R+1 B (Partie haute)**	**39 jours**	**Lun 06/07/26**	**Ven 25/09/26**	1
3	02 - PLÂTRERIE	19 jours	Lun 06/07/26	Ven 31/07/26	
4	03 - AGENCEMENT INTERIEUR	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	5
5	04 - REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES	14 jours	Lun 13/07/26	Ven 31/07/26	
6	05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS	29 jours	Lun 06/07/26	Ven 11/09/26	
7	06 - PEINTURE	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26	6
8	07 - ELECTRICITE	39 jours	Lun 06/07/26	Ven 25/09/26	
9	08 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	39 jours	Lun 06/07/26	Ven 25/09/26	
10	**R+1 B (Partie basse)**	**39 jours**	**Lun 06/07/26**	**Ven 25/09/26**	1
11	02 - PLÂTRERIE	19 jours	Lun 06/07/26	Ven 31/07/26	
12	03 - AGENCEMENT INTERIEUR	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	13
13	04 - REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES	14 jours	Lun 13/07/26	Ven 31/07/26	
14	05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS	29 jours	Lun 06/07/26	Ven 11/09/26	
15	06 - PEINTURE	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26	14
16	07 - ELECTRICITE	39 jours	Lun 06/07/26	Ven 25/09/26	
17	08 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	39 jours	Lun 06/07/26	Ven 25/09/26	
18	**R+1 A**	**35 jours**	**Lun 31/08/26**	**Ven 16/10/26**	11
19	02 - PLÂTRERIE	15 jours	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26	
20	03 - AGENCEMENT INTERIEUR	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26	21
21	04 - REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES	10 jours	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26	
22	05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS	25 jours	Lun 31/08/26	Ven 02/10/26	
23	06 - PEINTURE	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26	22
24	07 - ELECTRICITE	35 jours	Lun 31/08/26	Ven 16/10/26	
25	08 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	35 jours	Lun 31/08/26	Ven 16/10/26	
26	**RDC B**	**64 jours**	**Lun 21/09/26**	**Ven 18/12/26**	19
27	02 - PLÂTRERIE	35 jours	Lun 21/09/26	Ven 06/11/26	
28	03 - AGENCEMENT INTERIEUR	14 jours	Lun 09/11/26	Ven 27/11/26	29
29	04 - REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES	15 jours	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26	
30	05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS	49 jours	Lun 21/09/26	Ven 27/11/26	
31	06 - PEINTURE	15 jours	Lun 30/11/26	Ven 18/12/26	28
32	07 - ELECTRICITE	64 jours	Lun 21/09/26	Ven 18/12/26	
33	08 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	64 jours	Lun 21/09/26	Ven 18/12/26
