La réalisation de la maintenance du cycle 2025 sur les stations d'avitaillement de la sécurité civile

Base hélicoptère d'Ajaccio

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	20/08/25
Maintenance annuelle du séparateur	24/09/25
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025 + replacement palette pompe + Filtration	27/02/25
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	16/05/25
Contrôle millipore 3ème trimestre - 2025	20/08/25
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025 + Replacement manomètre DeltaP	19/11/25

Travaux planifiés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	08/26
Maintenance annuelle du séparateur	09/26
Nettoyage de la cuve avec le contrôle du détecteur de fuite	
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	08/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	11/2026

Base Hélicoptère d'Annecy

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	06/11/25
Maintenance annuelle du séparateur + replacement du filtre	27/10/25
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025 Remplacement flexible + indicateur + pistolet ZVA 32	18/02/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025 Remplacement joint tournant enrouleur	06/05/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre - 2025	13/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	06/11/2025
Contrôle étanchéité et détecteur de fuite + remplacement filtre du séparateur	25/09/25
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	11/26
Maintenance annuelle du séparateur	09/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2024	02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2024	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2024	08/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2024	11/2026

Base hélicoptère de Bastia

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	19/08/2025
Maintenance annuelle du séparateur	26/09/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025 +Changement filtration	25/02/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025 +Changement filtration	21/05/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre - 2025	19/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025 Remplacement prise de remplissage Changement filtration	19/11/2025
Contrôle double enveloppe	28/10/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	05/2026
Maintenance annuelle du séparateur	09/2026
Remplacement manchons + flexible	05/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	09/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de Besançon

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	05/11/2025
Maintenance annuelle du séparateur	12/08/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025 Remplacement indicateur	19/02/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre — 2025	07/05/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025 Remplacement cartouche filtrante	06/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	05/11/2025
Travaux planifiés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	20/09/2026
Maintenance annuelle du séparateur	08/2025
Remplacement manchons + flexible	05/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre — 2026	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	08/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	11/2026

Base hélicoptère de Cannes

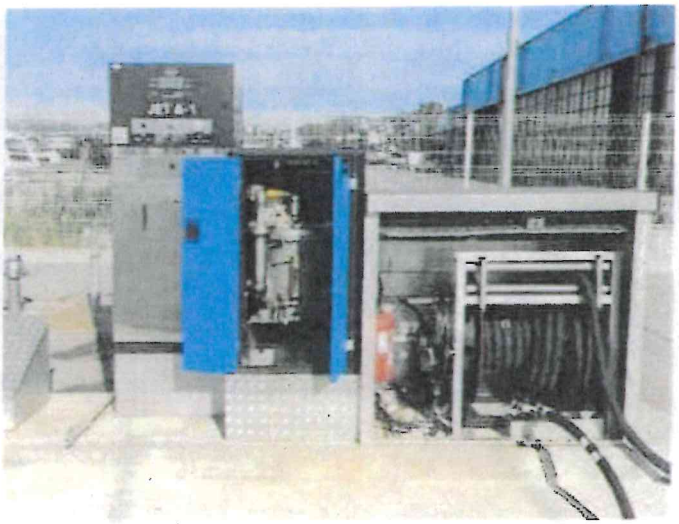

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	20/11/2025
Maintenance annuelle du séparateur	22/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025 Réglage courroie de la pompe	10/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre 2025	03/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	26/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025	20/11/2025
Réparation moteur enrouleur	11/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	25/10/2026
Maintenance annuelle du séparateur	01/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre — 2026	06/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	10/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de Clermont-Ferrand

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	05/06/2025
Maintenance annuelle du séparateur	09/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre - 2025	12/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	05/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	28/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	17/11/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	06/2026
Maintenance annuelle du séparateur	07/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	08/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	11/2026

Base hélicoptère de Breville

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	30/03/2023
Maintenance annuelle du séparateur	09/09/2025
Contrôle millipore 1er trimestre - 2025	14/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	24/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre - 2025	18/07/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	07/10/2025
Travaux planifiés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	04/2026
Maintenance annuelle du séparateur	09/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	05/01/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Gavarnie

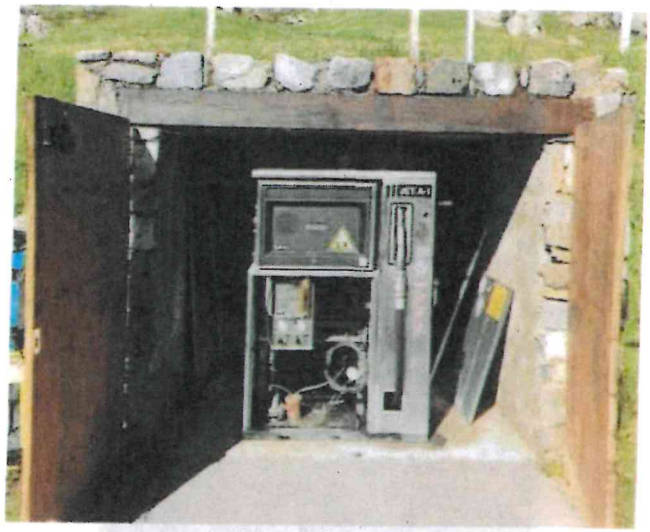

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	28/05/2025
Maintenance annuelle du séparateur	
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	28/05/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	29/09/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	05/2026
Maintenance annuelle du séparateur	
Nettoyage de la cuve avec le contrôle du détecteur de fuite	
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	05/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	09/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	

Base hélicoptère de Guadeloupe

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement Remplacement joins mesureur + flexible	16/05/2025
Maintenance annuelle du séparateur	28/11/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	09/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	07/05/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre - 2025	08/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	05/11/2025
Colmatage d'urgence – Remplacement cartouche	15/10/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	05/2026
Maintenance annuelle du séparateur	11/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	04/02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	08/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	11/2026

Base hélicoptère de Guyane

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	29/01/2025
Maintenance annuelle du séparateur Nettoyage de la cuve Contrôle détecteur de fuite	01/09/2025
Sécurisation 2nd trou d'homme	19/09/2025
Réparation panne Afficheur	02/04/2025
Contrôle millipore 1er trimestre - 2025	29/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	29/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre - 2025	25/07/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	24/10/2025
Resolution panne measurer et colmatage	12/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	29/01/2026
Maintenance annuelle du séparateur	09/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	29/01/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère du Havre

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	25/04/2025
Maintenance annuelle du séparateur	08/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	25/04/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	05/07/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	17/07/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	07/10/2025
Contrôle étanchéité + détecteur de fuite	25/09/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	24/04/2026
Maintenance annuelle du séparateur	04/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Lorient

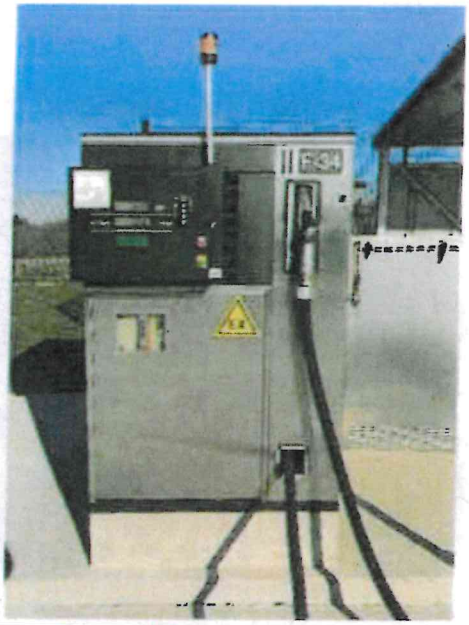

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	19/03/2025
Maintenance annuelle du séparateur	22/09/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	19/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	16/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	04/09/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025 Remplacement câble de masse pistolet	17/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	03/2026
Maintenance annuelle du séparateur	09/2026
Remplacement manchons élastique	A définir
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	06/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	09/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de la Rochelle

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	04/03/2025
Maintenance annuelle du séparateur	29/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	04/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	06/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	05/09/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	18/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	03/2026
Maintenance annuelle du séparateur	07/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	06/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	09/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de Lyon

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	27/08/2025
Maintenance annuelle du séparateur	11/02/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	11/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	04/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	27/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	18/11/2025
Contrôle étanchéité + détecteur de fuite	25/09/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	08/2026
Maintenance annuelle du séparateur	04/2026
Nettoyage de la cuve avec le contrôle du détecteur de fuite	
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Marignane

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	11/03/2025
Maintenance annuelle du séparateur	14/10/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	11/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	03/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	25/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	17/12/2025
Contrôle étanchéité + détecteur de fuite	03/10/2025
Diagnostic impossibilité de remplir la cuve Cause : le limiteur de remplissage été bloqué en position haute	11/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	12/2026
Maintenance annuelle du séparateur	10/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	06/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	09/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de Mérignac

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	16/01/2025
Maintenance annuelle du séparateur	16/09/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	16/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025 Réparation du support de plaque de sécurité Création d'un châssis soudé plus solide	28/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	24/07/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	23/10/2025
Réglage By-PASS	09/10/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	04/2026
Maintenance annuelle du séparateur	09/2026
Remplacement manchons élastique	A définir
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	19/01/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Montpellier

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	21/10/2025
Maintenance annuelle du séparateur	24/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	28/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025 Fourniture et mise en place de protection spiralée	28/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	24/07/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	21/10/2025
Fourniture et remplacement pistolet ZVA32	27/02/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	10/2026
Maintenance annuelle du séparateur	07/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	13/01/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Nîmes

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	22/07/2025
Contrôle du détecteur de fuite et contrôle d'étanchéité sur soute à carburant	23/10/2025
Maintenance annuelle du séparateur	10/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	28/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	29/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	24/07/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2025	23/10/2025
Fourniture et remplacement raccord rapide pistolet Mise en place d'une soupape de décompression	22/05/2025
Maintenance annuel station de rempotage	29/04/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	07/2026
Maintenance annuelle du séparateur	10/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	14/01/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Pau

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	23/07/2025
Maintenance annuelle du séparateur	16/05/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	24/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	23/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	24/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre bis – 2025 Remplacement cartouche pour colmatage	17/07/2025
Travaux raccordement flexible station	08/08/2025
Fourniture et remplacement capteur magnétique défaillant	14/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025 Remplacement cartouche pour colmatage	21/10/2025
Reprise étanchéité de joint tournant de l'enrouleur	27/02/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	10/2026
Maintenance annuelle du séparateur	05/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	08/01/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	04/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	07/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	10/2026

Base hélicoptère de Perpignan

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	10/01/2025
Maintenance annuelle du séparateur	11/09/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	10/01/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	30/04/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025 Remplacement cartouche ACOX 612 Fourniture et remplacement coquille de butée DN 25 Fourniture et remplacement Totalisateur	10/07/2025
Remplacement pistolet ZVA 25 + Joint tournant	05/02/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025 Remplacement cartouche ACOX 612	15/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	03/2026
Maintenance annuelle du séparateur	09/2026
Nettoyage de la cuve	25/02/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	06/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	09/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de Quimper

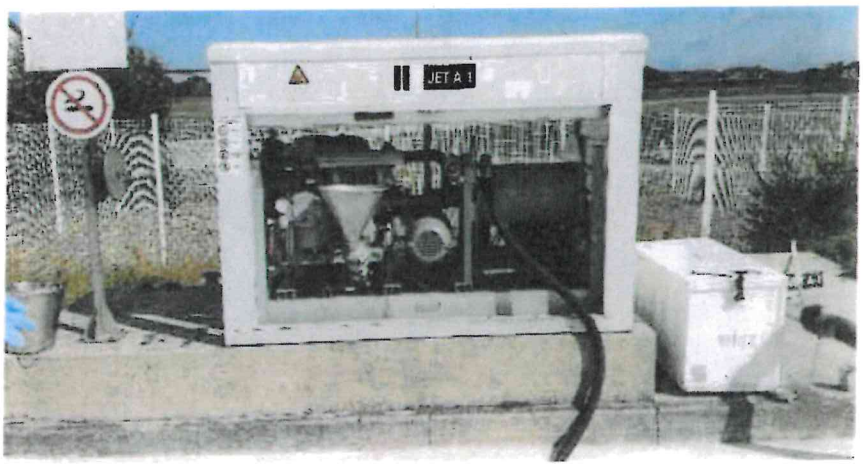

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	20/03/2025
Maintenance annuelle du séparateur	07/07/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025	20/03/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025 Remplacement bouchons pistolet ZVA 32	17/06/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	04/09/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025	17/12/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	03/2026
Maintenance annuelle du séparateur	07/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	03/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	06/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	09/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	12/2026

Base hélicoptère de Strasbourg

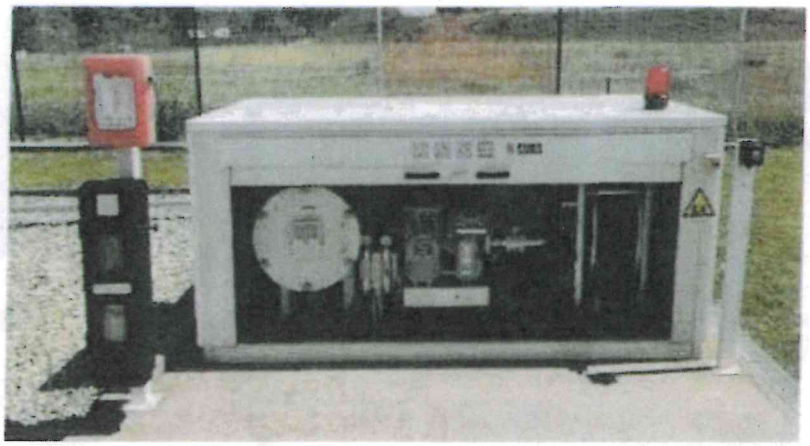

Travaux réalisés	Date
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	04/11/2025
Maintenance annuelle du séparateur	23/06/2025
Contrôle millipore 1er trimestre – 2025 Remplacement Indicateur + mesureur	20/02/2025
Contrôle millipore 2éme trimestre —2025	07/05/2025
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2025	12/08/2025
Contrôle millipore 4ème trimestre – 2025	04/11/2025
Travaux planifiés	**Date**
Maintenance annuelle de la station d'avitaillement	11/2026
Maintenance annuelle du séparateur	23/06/2026
Contrôle millipore 1er trimestre – 2026	05/02/2026
Contrôle millipore 2éme trimestre —2026	05/2026
Contrôle millipore 3ème trimestre – 2026	08/2026
Contrôle millipore 4ème trimestre - 2026	11/2026
