G229 INSERM – Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale à Montpellier

PLANNING DE TRAVAUX COMPRIS CONGES-JF- INTEMPERIES ET HORS ALEAS
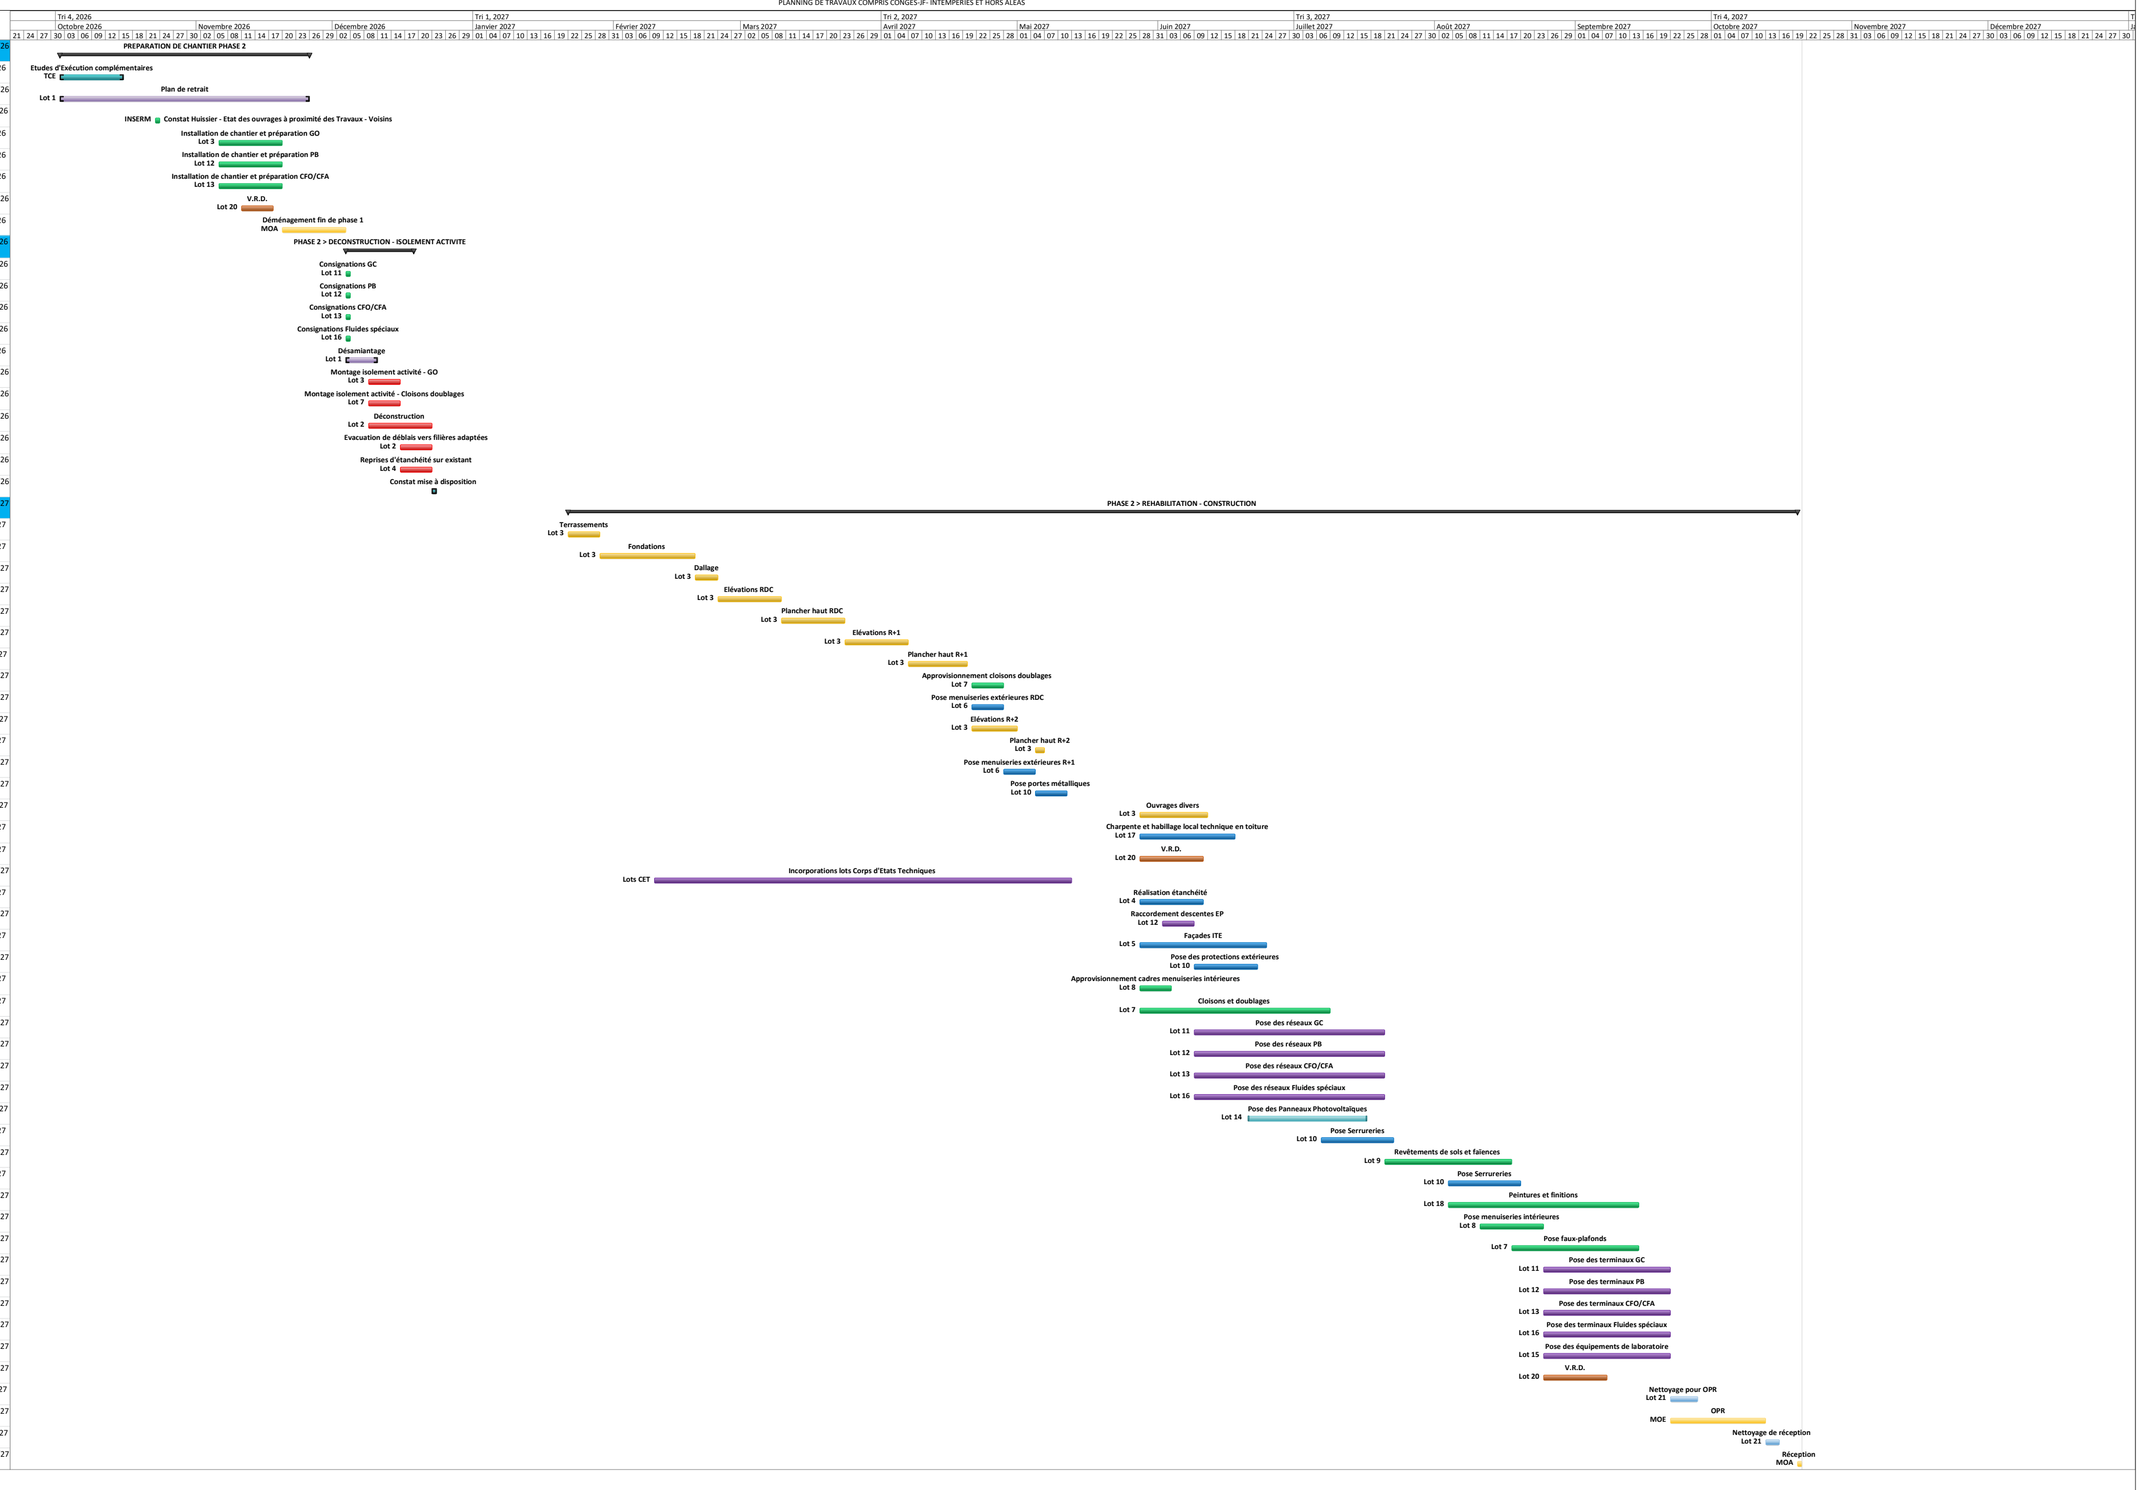
N°	Noms ressource	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		PREPARATION DE CHANTIER PHASE 2	39 jours	Ven 02/10/26	Mer 25/11/26
2	TCE	Etudes d'Exécution complémentaires	10 jours	Ven 02/10/26	Jeu 15/10/26
3	Lot 1	Plan de retrait	39 jours	Ven 02/10/26	Mer 25/11/26
4	INSERM	Constat Huissier - Etat des ouvrages à proximité des Travaux - Voisins	1 jour	Ven 23/10/26	Ven 23/10/26
5	Lot 3	Installation de chantier et préparation GO	10 jours	Ven 06/11/26	Jeu 19/11/26
6	Lot 12	Installation de chantier et préparation PB	10 jours	Ven 06/11/26	Jeu 19/11/26
7	Lot 13	Installation de chantier et préparation CFO/CFA	10 jours	Ven 06/11/26	Jeu 19/11/26
8	Lot 20	V.R.D.	5 jours	Mer 11/11/26	Mar 17/11/26
9	MOA	Déménagement fin de phase 1	10 jours	Ven 20/11/26	Jeu 03/12/26
10		PHASE 2 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT ACTIVITE	11 jours	Ven 04/12/26	Ven 18/12/26
11	Lot 11	Consignations GC	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
12	Lot 12	Consignations PB	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
13	Lot 13	Consignations CFO/CFA	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
14	Lot 16	Consignations Fluides spéciaux	1 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
15	Lot 1	Désamiantage	5 jours	Ven 04/12/26	Jeu 10/12/26
16	Lot 3	Montage isolement activité - GO	5 jours	Mer 09/12/26	Mar 15/12/26
17	Lot 7	Montage isolement activité - Cloisons doublages	5 jours	Mer 09/12/26	Mar 15/12/26
18	Lot 2	Déconstruction	10 jours	Mer 09/12/26	Mar 22/12/26
19	Lot 2	Evacuation de déblais vers filières adaptées	5 jours	Mer 16/12/26	Mar 22/12/26
20	Lot 4	Reprises d'étanchéité sur existant	5 jours	Mer 16/12/26	Mar 22/12/26
21		Constat mise à disposition	1 jour	Mer 23/12/26	Mer 23/12/26
22		PHASE 2 > REHABILITATION - CONSTRUCTION	193 jours	Ven 22/01/27	Mar 19/10/27
23	Lot 3	Terrassements	5 jours	Ven 22/01/27	Jeu 28/01/27
24	Lot 3	Fondations	15 jours	Ven 29/01/27	Jeu 18/02/27
25	Lot 3	Dallage	3 jours	Ven 19/02/27	Mar 23/02/27
26	Lot 3	Elévations RDC	10 jours	Mer 24/02/27	Mar 09/03/27
27	Lot 3	Plancher haut RDC	10 jours	Mer 10/03/27	Mar 23/03/27
28	Lot 3	Elévations R+1	10 jours	Mer 24/03/27	Mar 06/04/27
29	Lot 3	Plancher haut R+1	9 jours	Mer 07/04/27	Lun 19/04/27
30	Lot 7	Approvisionnement cloisons doublages	5 jours	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27
31	Lot 6	Pose menuiseries extérieures RDC	5 jours	Mer 21/04/27	Mar 27/04/27
32	Lot 3	Elévations R+2	8 jours	Mer 21/04/27	Ven 30/04/27
33	Lot 3	Plancher haut R+2	2 jours	Mer 05/05/27	Jeu 06/05/27
34	Lot 6	Pose menuiseries extérieures R+1	5 jours	Mer 28/04/27	Mar 04/05/27
35	Lot 10	Pose portes métalliques	5 jours	Mer 05/05/27	Mar 11/05/27
36	Lot 3	Ouvrages divers	11 jours	Ven 28/05/27	Ven 11/06/27
37	Lot 17	Charpente et habillage local technique en toiture	15 jours	Ven 28/05/27	Jeu 17/06/27
38	Lot 20	V.R.D.	10 jours	Ven 28/05/27	Jeu 10/06/27
39	Lots CET	Incorporations lots Corps d'Etats Techniques	66 jours	Mer 10/02/27	Mer 12/05/27
40	Lot 4	Réalisation étanchéité	10 jours	Ven 28/05/27	Jeu 10/06/27
41	Lot 12	Raccordement descentes EP	5 jours	Mer 02/06/27	Mar 08/06/27
42	Lot 5	Façades ITE	20 jours	Ven 28/05/27	Jeu 24/06/27
43	Lot 10	Pose des protections extérieures	10 jours	Mer 09/06/27	Mar 22/06/27
44	Lot 8	Approvisionnement cadres menuiseries intérieures	5 jours	Ven 28/05/27	Jeu 03/06/27
45	Lot 7	Cloisons et doublages	30 jours	Ven 28/05/27	Jeu 08/07/27
46	Lot 11	Pose des réseaux GC	30 jours	Mer 09/06/27	Mar 20/07/27
47	Lot 12	Pose des réseaux PB	30 jours	Mer 09/06/27	Mar 20/07/27
48	Lot 13	Pose des réseaux CFO/CFA	30 jours	Mer 09/06/27	Mar 20/07/27
49	Lot 16	Pose des réseaux Fluides spéciaux	30 jours	Mer 09/06/27	Mar 20/07/27
50	Lot 14	Pose des Panneaux Photovoltaïques	20 jours	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27
51	Lot 10	Pose Serrureries	12 jours	Mer 07/07/27	Jeu 22/07/27
52	Lot 9	Revêtements de sols et faïences	20 jours	Mer 21/07/27	Mar 17/08/27
53	Lot 10	Pose Serrureries	12 jours	Mer 04/08/27	Jeu 19/08/27
54	Lot 18	Peintures et finitions	30 jours	Mer 04/08/27	Mar 14/09/27
55	Lot 8	Pose menuiseries intérieures	10 jours	Mer 11/08/27	Mar 24/08/27
56	Lot 7	Pose faux-plafonds	20 jours	Mer 18/08/27	Mar 14/09/27
57	Lot 11	Pose des terminaux GC	20 jours	Mer 25/08/27	Mar 21/09/27
58	Lot 12	Pose des terminaux PB	20 jours	Mer 25/08/27	Mar 21/09/27
59	Lot 13	Pose des terminaux CFO/CFA	20 jours	Mer 25/08/27	Mar 21/09/27
60	Lot 16	Pose des terminaux Fluides spéciaux	20 jours	Mer 25/08/27	Mar 21/09/27
61	Lot 15	Pose des équipements de laboratoire	20 jours	Mer 25/08/27	Mar 21/09/27
62	Lot 20	V.R.D.	10 jours	Mer 25/08/27	Mar 07/09/27
63	Lot 21	Nettoyage pour OPR	4 jours	Mer 22/09/27	Lun 27/09/27
64	MOE	OPR	15 jours	Mer 22/09/27	Mar 12/10/27
65	Lot 21	Nettoyage de réception	3 jours	Mer 13/10/27	Ven 15/10/27
66	MOA	Réception	1 jour	Mer 20/10/27	Mer 20/10/27
