HÔPITAL DE COUTANCES



MAÎTRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
RUE DE LA GARE
50208 COUTANCES

MAÎTRISE D'OEUVRE

143, rue Yves Le Coz - 78000 VERSAILLES
1 ter, rue Antoine Barthélémy - 50700 VALOGNES
Tél. : 02.33.41.80.09 / contact.cps@energieetservice.fr
www.cps-be.com


OUVRAGE

RÉNOVATION POSTE HTA, REMPLACEMENT GROUPE ÉLECTROGÉNE ET MUTATION DU RÉGIME DE NEUTRE

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

N° d'affaire	Phase	Date	Lot concerné	N° Plan	Échelle	Indice
22-X	DCE	09/2026	ÉLECTRICITÉ HT/BT	PLA.01	*/*	A


N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Travaux**	**481 jrs**	**Lun 30/11/26**	**Lun 02/10/28**
2		Démarrage chantier	1 jr	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26
3		Préparation de chantier	8 sem.	Lun 30/11/26	Ven 22/01/27
4		EXE SYN	8 sem.	Lun 30/11/26	Ven 22/01/27
5		VISA	2 sem.	Lun 25/01/27	Ven 05/02/27
6		Commandes matériels	4 m	Lun 08/02/27	Ven 28/05/27
7		**DET**	**310 jrs**	**Lun 08/03/27**	**Ven 12/05/28**
8		Travaux Phase Préparatoire	3 m	Lun 08/03/27	Ven 28/05/27
9		Travaux Phase 1 - Nouveau poste de livraison	4 m	Lun 31/05/27	Ven 17/09/27
10		**Enedis : Raccordement nouveau poste**	4 sem.	Lun 06/09/27	Ven 01/10/27
11		Travaux Phase 2 - Arrêt poste de livraison existant	2 m	Lun 04/10/27	Ven 26/11/27
12		**Enedis : Séparation réseaux HTA ancien poste**	3 sem.	Lun 18/10/27	Ven 05/11/27
13		Travaux Phase 3 - Dépose HTA	0,5 m	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
14		Travaux Phase 4 - Mutation HTA	1,5 m	Lun 13/12/27	Ven 21/01/28
15		Travaux Phase 5 - Transfo élévateur	1,5 m	Lun 24/01/28	Ven 03/03/28
16		Travaux Phase 6 - Evacuation GE	2 sem.	Lun 06/03/28	Ven 17/03/28
17		Travaux Phase 7 - Nouveau GE	2 m	Lun 20/03/28	Ven 12/05/28
18		Poste 34	2 m	Lun 13/12/27	Ven 04/02/28
19		Poste 40	1,5 m	Lun 31/05/27	Ven 09/07/27
20		Travaux VRD	3 m	Lun 08/03/27	Ven 28/05/27

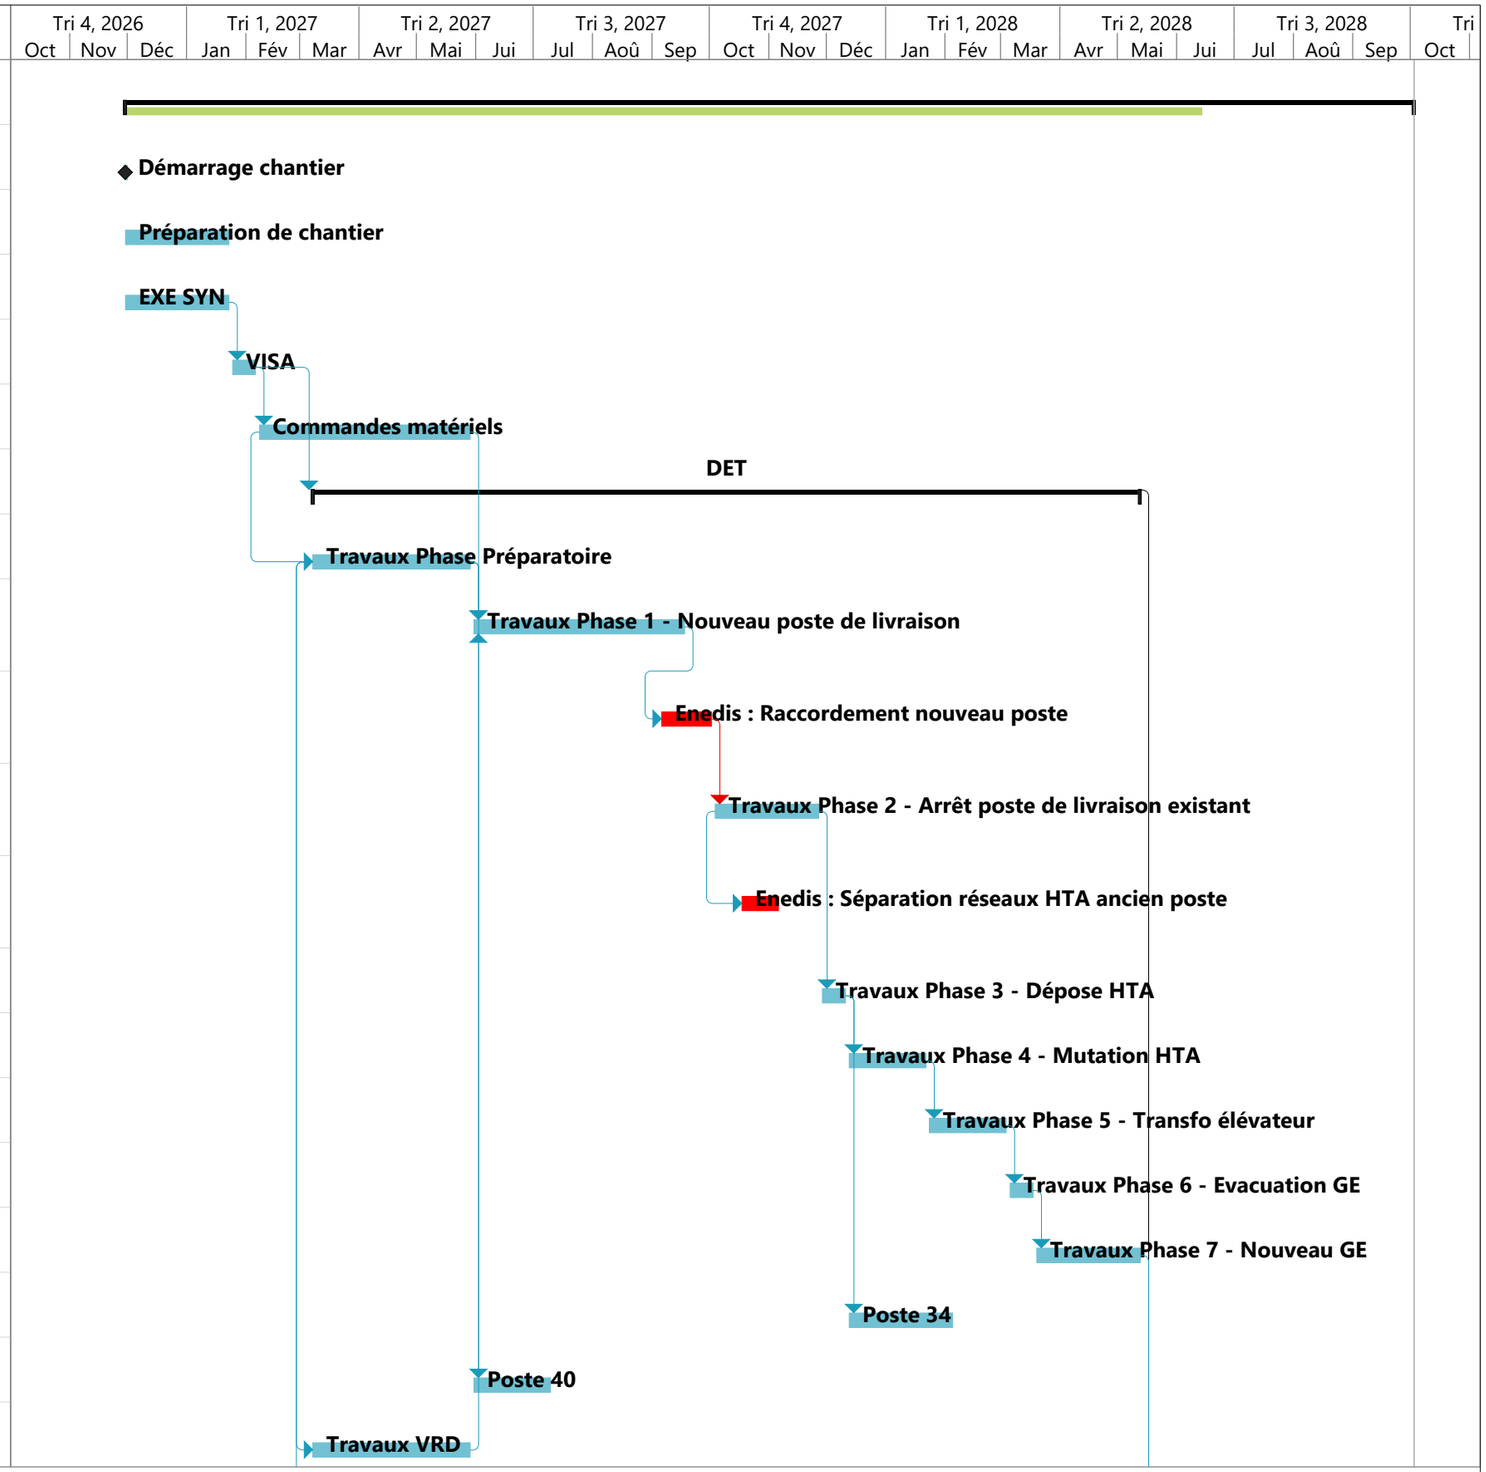

Projet : Plan de projet simple
Date : Lun 21/09/26

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
21		Travaux extérieurs et bâtiments	12 m	Lun 08/03/27	Ven 04/02/28
22		OPR	1 jr	Lun 15/05/28	Lun 15/05/28
23		AOR	1 m	Mar 16/05/28	Lun 12/06/28
24		Réception	1 jr	Mar 13/06/28	Mar 13/06/28
25		Début GPA	1 jr	Mar 13/06/28	Mar 13/06/28

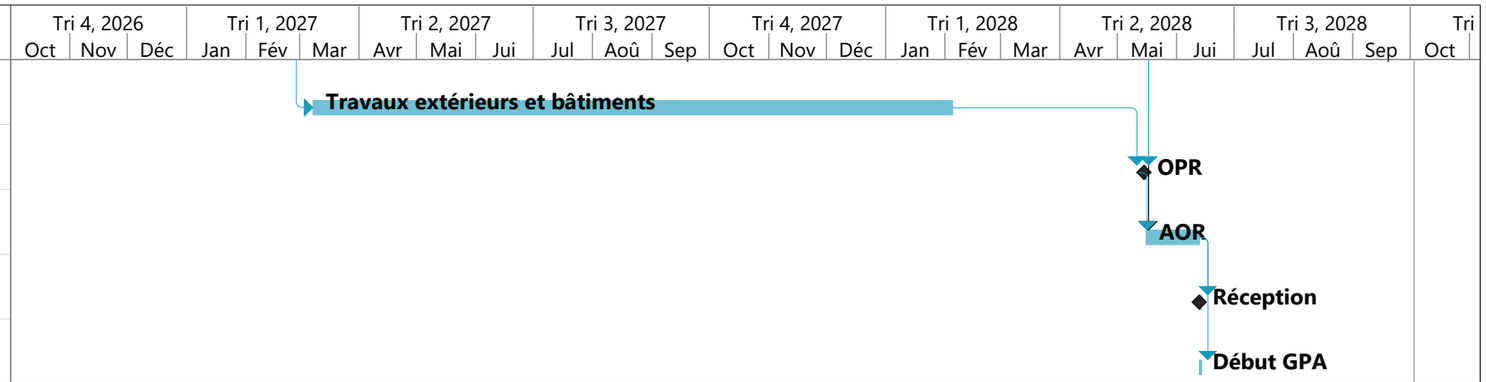

Projet : Plan de projet simple
Date : Lun 21/09/26

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	
