Life Ingénierie

EFS - MOE Besançon - LOT 04
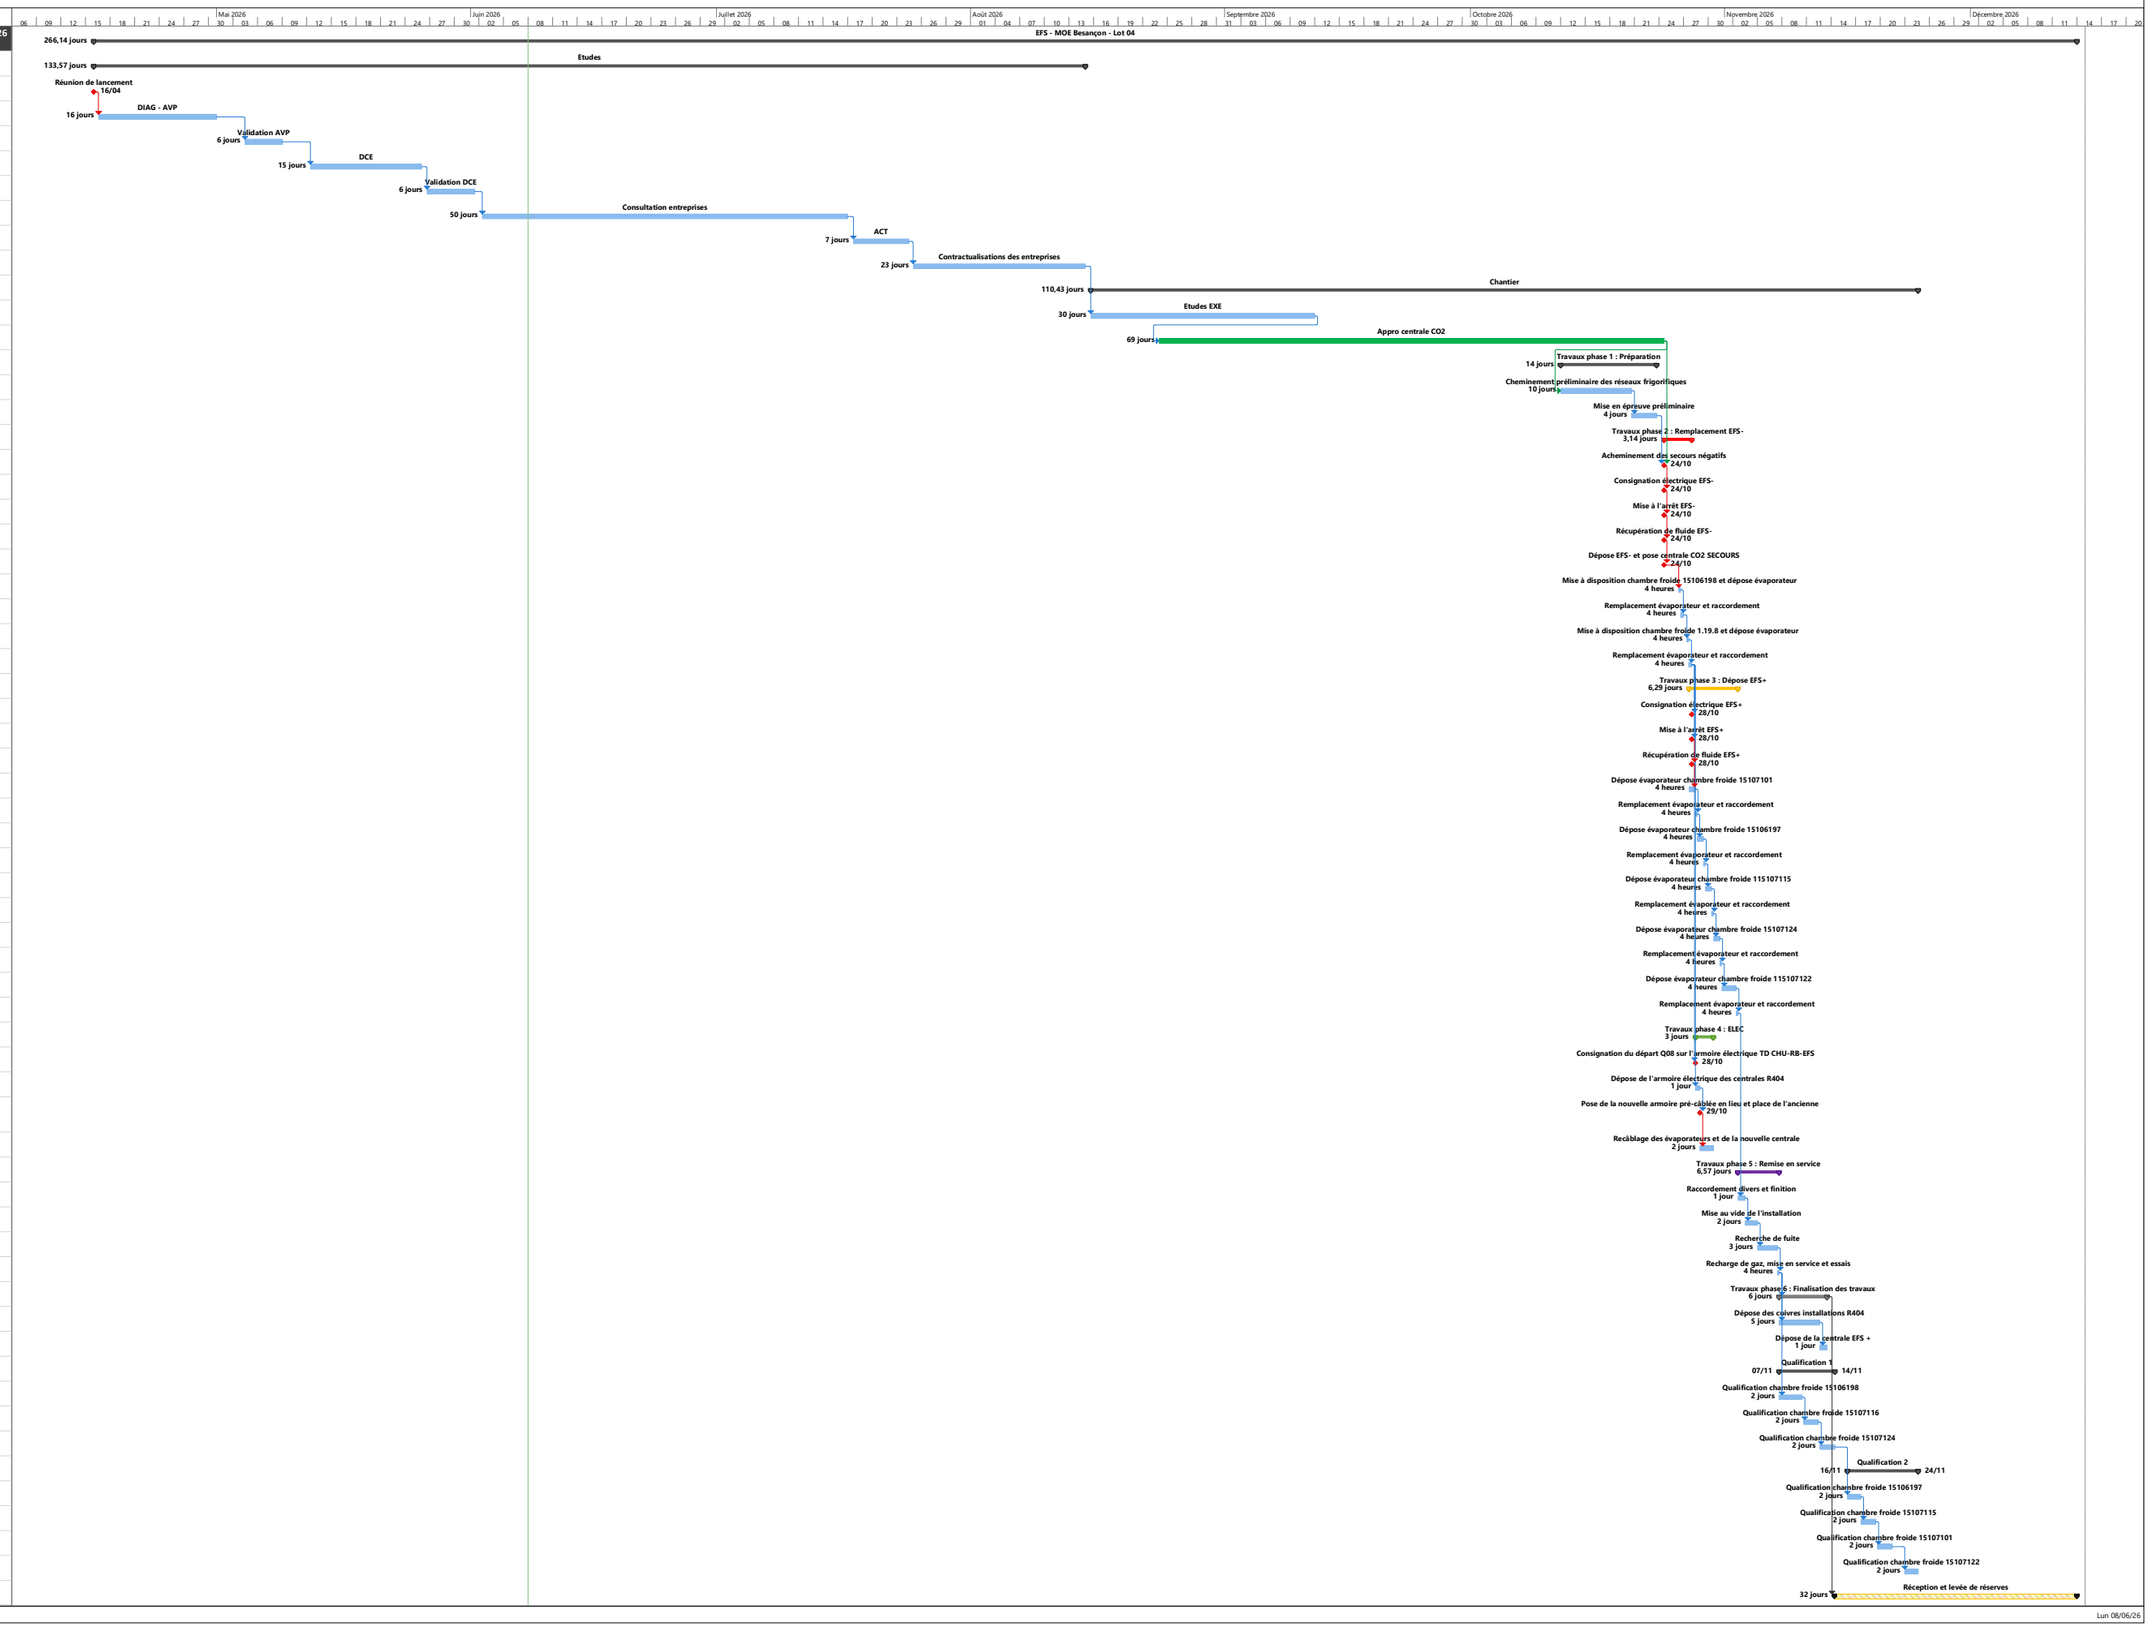
N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**EFS - MOE Besançon - Lot 04**	**Jeu 16/04/26**	**Lun 14/12/26**
2	**Etudes**	**Jeu 16/04/26**	**Ven 14/08/26**
3	Réunion de lancement	Jeu 16/04/26	Jeu 16/04/26
4	DIAG - AVP	Jeu 16/04/26	Jeu 30/04/26
5	Validation AVP	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
6	DCE	Mar 12/05/26	Lun 25/05/26
7	Validation DCE	Mar 26/05/26	Lun 01/06/26
8	Consultation entreprises	Mar 02/06/26	Ven 17/07/26
9	ACT	Ven 17/07/26	Ven 24/07/26
10	Contractualisations des entreprises	Sam 25/07/26	Ven 14/08/26
11	**Chantier**	**Sam 15/08/26**	**Mar 24/11/26**
12	Etudes EXE	Sam 15/08/26	Sam 12/09/26
13	Appro centrale CO2	Lun 24/08/26	Sam 24/10/26
14	**Travaux phase 1 : Préparation**	**Lun 12/10/26**	**Ven 23/10/26**
15	Cheminement préliminaire des réseaux frigorifiques	Lun 12/10/26	Mar 20/10/26
16	Mise en épreuve préliminaire	Mar 20/10/26	Ven 23/10/26
17	**Travaux phase 2 : Remplacement EFS-**	**Sam 24/10/26**	**Mer 28/10/26**
18	Acheminement des secours négatifs	Sam 24/10/26	Sam 24/10/26
19	Consignation électrique EFS-	Sam 24/10/26	Sam 24/10/26
20	Mise à l'arrêt EFS-	Sam 24/10/26	Sam 24/10/26
21	Récupération de fluide EFS-	Sam 24/10/26	Sam 24/10/26
22	Dépose EFS- et pose centrale CO2 SECOURS	Sam 24/10/26	Sam 24/10/26
23	Mise à disposition chambre froide 15106198 et dépose évaporateur	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
24	Remplacement évaporateur et raccordement	Lun 26/10/26	Mar 27/10/26
25	Mise à disposition chambre froide 1.19.8 et dépose évaporateur	Mar 27/10/26	Mar 27/10/26
26	Remplacement évaporateur et raccordement	Mar 27/10/26	Mer 28/10/26
27	**Travaux phase 3 : Dépose EFS+**	**Mar 27/10/26**	**Lun 02/11/26**
28	Consignation électrique EFS+	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
29	Mise à l'arrêt EFS+	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
30	Récupération de fluide EFS+	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
31	Dépose évaporateur chambre froide 15107101	Mar 27/10/26	Mer 28/10/26
32	Remplacement évaporateur et raccordement	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
33	Dépose évaporateur chambre froide 15106197	Mer 28/10/26	Jeu 29/10/26
34	Remplacement évaporateur et raccordement	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
35	Dépose évaporateur chambre froide 115107115	Jeu 29/10/26	Ven 30/10/26
36	Remplacement évaporateur et raccordement	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
37	Dépose évaporateur chambre froide 15107124	Ven 30/10/26	Sam 31/10/26
38	Remplacement évaporateur et raccordement	Sam 31/10/26	Sam 31/10/26
39	Dépose évaporateur chambre froide 115107122	Sam 31/10/26	Lun 02/11/26
40	Remplacement évaporateur et raccordement	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
41	**Travaux phase 4 : ELEC**	**Mer 28/10/26**	**Ven 30/10/26**
42	Consignation du départ Q08 sur l'armoire électrique TD	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
43	Dépose de l'armoire électrique des centrales R404	Mer 28/10/26	Jeu 29/10/26
44	Pose de la nouvelle armoire pré-câblée en lieu et place de l'ancienne	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
45	Recâblage des évaporateurs et de la nouvelle centrale	Jeu 29/10/26	Ven 30/10/26
46	**Travaux phase 5 : Remise en service**	**Lun 02/11/26**	**Sam 07/11/26**
47	Raccordement divers et finition	Lun 02/11/26	Mar 03/11/26
48	Mise au vide de l'installation	Mar 03/11/26	Mer 04/11/26
49	Recherche de fuite	Jeu 05/11/26	Sam 07/11/26
50	Recharge de gaz, mise en service et essais	Sam 07/11/26	Sam 07/11/26
51	**Travaux phase 6 : Finalisation des travaux**	**Sam 07/11/26**	**Ven 13/11/26**
52	Dépose des cuivres installations R404	Sam 07/11/26	Jeu 12/11/26
53	Dépose de la centrale EFS +	Jeu 12/11/26	Ven 13/11/26
54	**Qualification 1**	**Sam 07/11/26**	**Sam 14/11/26**
55	Qualification chambre froide 15106198	Sam 07/11/26	Mar 10/11/26
56	Qualification chambre froide 15107116	Mar 10/11/26	Jeu 12/11/26
57	Qualification chambre froide 15107124	Jeu 12/11/26	Sam 14/11/26
58	**Qualification 2**	**Lun 16/11/26**	**Mar 24/11/26**
59	Qualification chambre froide 15106197	Lun 16/11/26	Mar 17/11/26
60	Qualification chambre froide 15107115	Mar 17/11/26	Jeu 19/11/26
61	Qualification chambre froide 15107101	Jeu 19/11/26	Sam 21/11/26
62	Qualification chambre froide 15107122	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26
63	**Réception et levée de réserves**	**Sam 14/11/26**	**Lun 14/12/26**
