Restauration du clos et couvert de l'aile de l'Hémicycle

Maître d'Ouvrage
Fondation d'Aumale, Domaine de CHANTILLY
17, rue du Connétable
60500 CHANTILLY

Maître d'Œuvre
Covalence architectes
136 rue de Bagnolet – 75020 Paris
07 84 46 34 35
www.covalence-architectes.fr

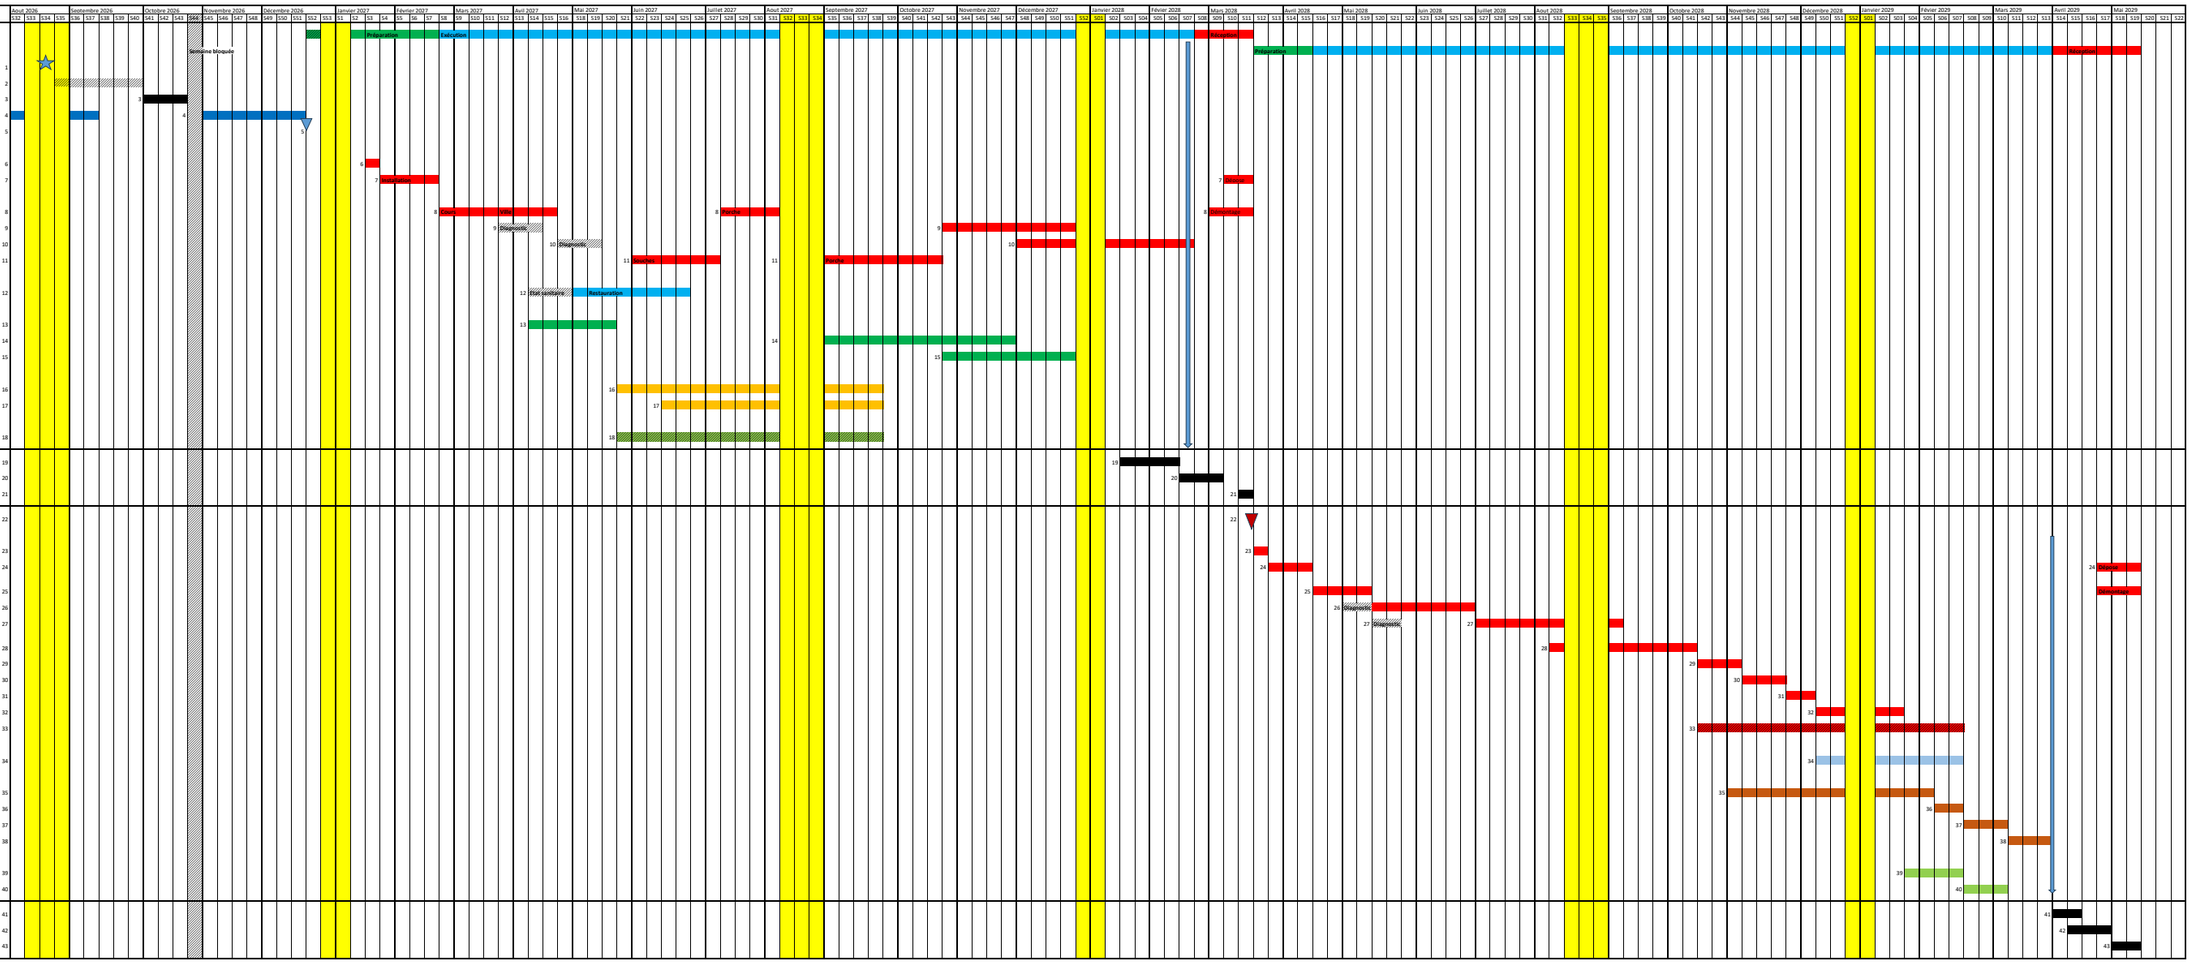


LD PILOTAGE

Planning prévisionnel d'exécution DCE

Date d'édition : 01/07/26

Désignation	Lot	N°
Délai contractuel : Tranche ferme : 12 mois clo 1 mois de préparation (hors intempéries et CP)		
Délai contractuel : Tranche optionnelle : 12 mois clo 1 mois de préparation (hors intempéries et CP)		
Emission du DCE	MOE/MOA	1
Consultation des entreprises	TCE	2
Analyse des offres - Négociations	MOE/MOA/TCE	3
Mise au point des marchés - notification	MOA / MOE	4
OS de démarrage tranche ferme	MOA / MOE	5
	LOT 1 : Installation / Maconnerie / PEC	
Constat huissier		6
Installation de chantier		7
Installation échafaudage coté cour et coté ville, coté porche cis parapluie et adaptations pour sculptures		8
Maconnerie pierre de taille coté cour		9
Maconnerie de pierre de taille coté ville		10
Souches de cheminées / porche		11
	LOT 2 : Sculptures	
Restauration des sculptures		12
	LOT 4 : Couverture	
Dépose de couverture		13
Couvertures en ardoise		14
Ouvrages en plomb		15
	LOT 5 : Charpente	
Réfection de charpente		16
Renforcement structurel salle Eouidia		17
	Lot 7 : Ferronnerie	
Ouvrages fer forgé en restauration		18
Opérations préalables à la réception		19
Levée des réserves		20
Réception		21
OS de démarrage tranche Optionnelle	MOA / MOE	22
	LOT 1 : Installation / Maconnerie / PEC	
Constat huissier		23
Installation de chantier		24
Installation échafaudage coté cour et coté ville / passage couvert		25
Maçonnerie pierre de taille coté cour		26
Maçonnerie de pierre de taille coté ville		27
Plafonds et enduits ollâtre / réfections passaee couvert		28
Restauration des perrons		29
Restauration des chasse-roues		30
Restauration des bancs		31
Restauration de la fontaine		32
Scellements / divers		33
	LOT 3 : Décors peints	
Dépose / reoose décors peints		34
	LOT 6 : Menuiseries Bois	
Révision des châssis de fenêtres		35
Restauration fenêtres passage couvert		36
Révision générale des fausses baies		37
Restauration des portes		38
	Lot 7 : Ferronnerie	
Grille d'entrée		39
Autres ouvrages en restauration et neufs		40
Opérations préalables à la réception		41
Levée des réserves		42
Réception		43


Août 2026
Septembre 2026
Octobre 2026
Novembre 2026
Décembre 2026
Janvier 2027
Février 2027
Mars 2027
Avril 2027
Mai 2027
Juin 2027
Juillet 2027
Août 2027
Septembre 2027
Octobre 2027
Novembre 2027
Décembre 2027
Janvier 2028
Février 2028
Mars 2028
Avril 2028
Mai 2028
Juin 2028
Juillet 2028
Août 2028
Septembre 2028
Octobre 2028
Novembre 2028
Décembre 2028
Janvier 2029
Février 2029
Mars 2029
Avril 2029
Mai 2029
Semaine bloquée
Préparation
Exécution
Préparation 2
Réception
Dépose
Démontage
Diagnostic
Diagnostic
Diagnostic
