
Planning de principe

10 juil. 2026

Nom	Date de début	Date de fin
Renfort terrasse (hors marché, dates à préciser)	02/11/2026	27/11/2026
Obtention PC et recours des tiers purgé	05/10/2026	05/10/2026
Phase de préparation	04/01/2027	12/02/2027
Démarrage chantier	15/02/2027	15/02/2027
Délai commande menuiseries	18/01/2027	12/03/2027
BATIMENT A	15/02/2027	21/05/2027
Façades et menuiseries bât A	15/02/2027	30/04/2027
Finitions intérieures bât A	22/03/2027	21/05/2027
	02/02/2027	02/02/2027
Préparation de l'entrée définitive	15/02/2027	12/03/2027
Mise en service de l'entrée définitive	15/03/2027	15/03/2027
Démolition édicules et murs rideaux	15/03/2027	09/04/2027
BATIMENT B	12/04/2027	23/07/2027
Démolition attique	12/04/2027	07/05/2027
Façades et menuiseries bât B (yc attique)	03/05/2027	09/07/2027
Finitions intérieures bât B	10/05/2027	23/07/2027
	02/02/2027	02/02/2027
Etanchéité terrasse	10/05/2027	04/06/2027
Façades locaux techniques	12/07/2027	06/08/2027
Flocage parking	15/03/2027	09/04/2027
OPR	09/08/2027	03/09/2027
Réception	06/09/2027	06/09/2027

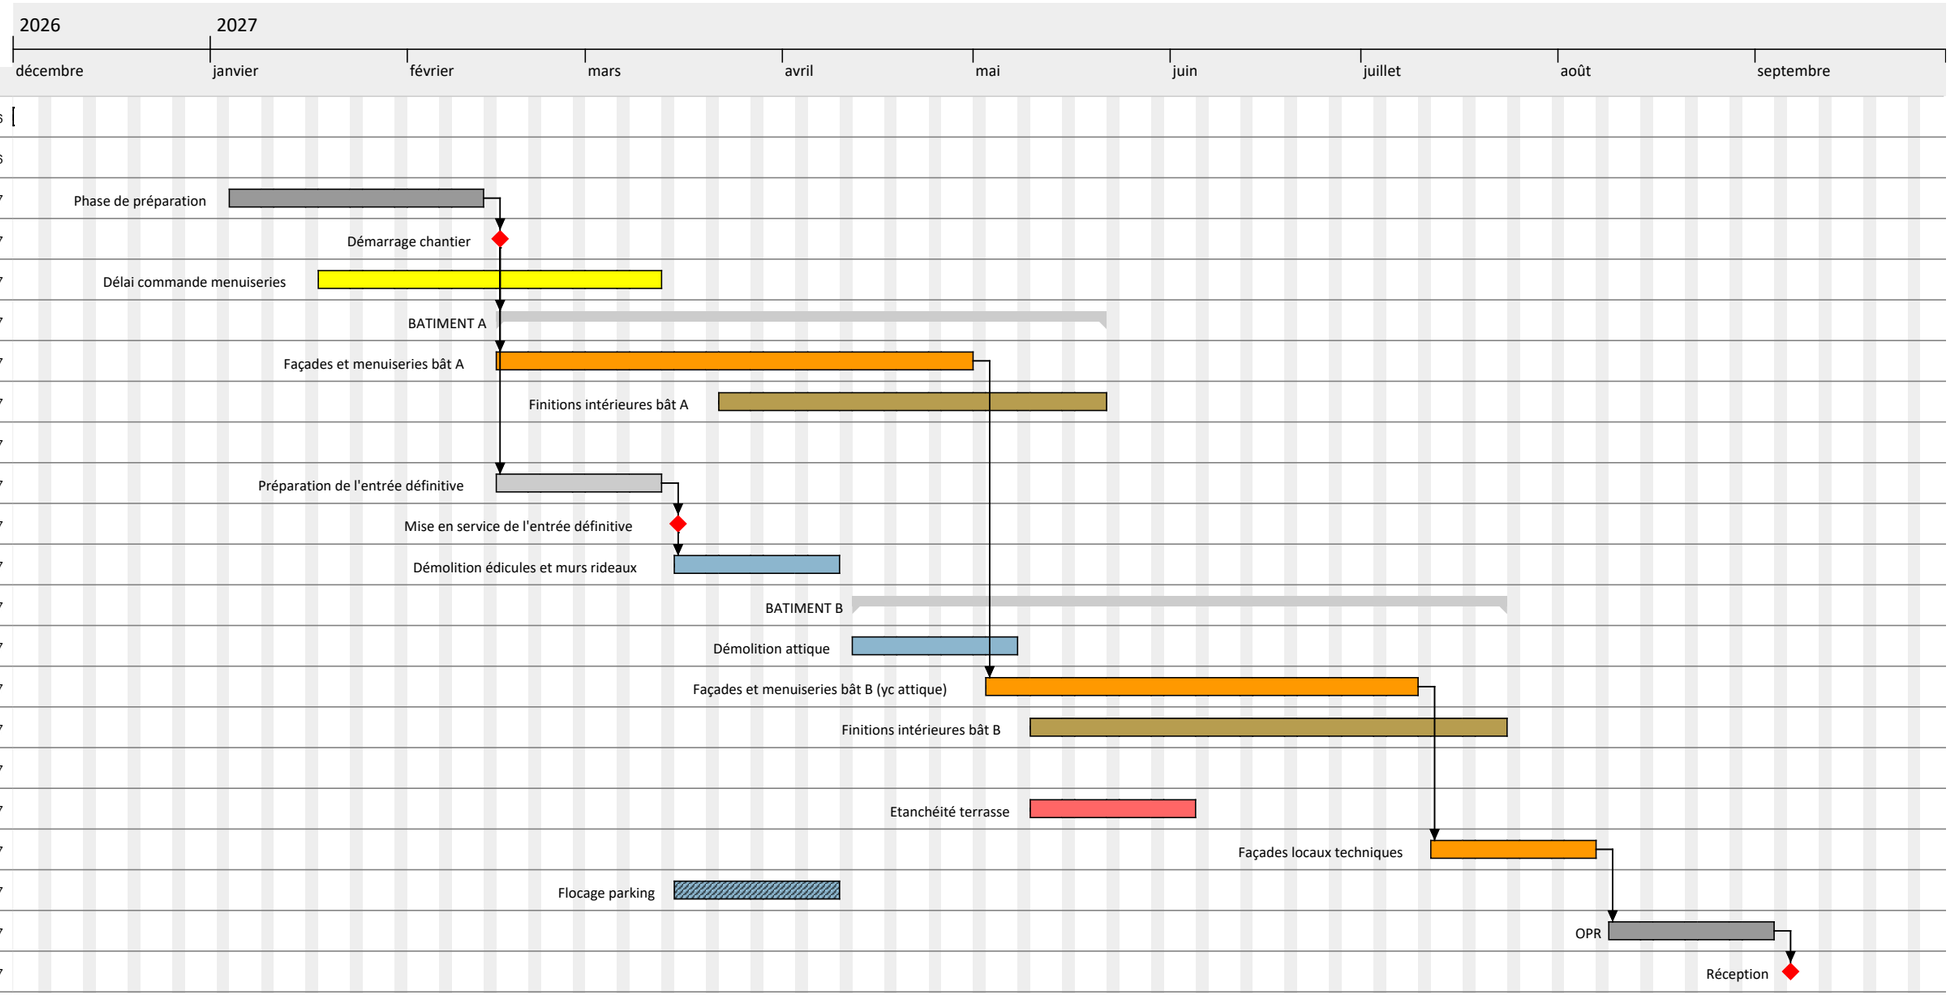

Planning prévisionnel établi à titre indicatif par la maîtrise d’œuvre.
Il constitue une base de principe non contractuelle et devra être adapté par les entreprises retenues.
