
Fiche d'observation d'étude
Dossier : 26412IP31

Chantier : Projet RCU AERO Rangueil – Toulouse		**Client :** COMUE Toulouse
Types travaux : Détection de réseaux		**Date :** semaines 24 et 25 (2026)
Conditions de terrain : Ensoleillé	**N°DT :** 2026060201486POA	**Equipement utilisé :** - Radars géophysique moyennes fréquences (LMX100) - système de Radiodétection (RD7200)

Situation :

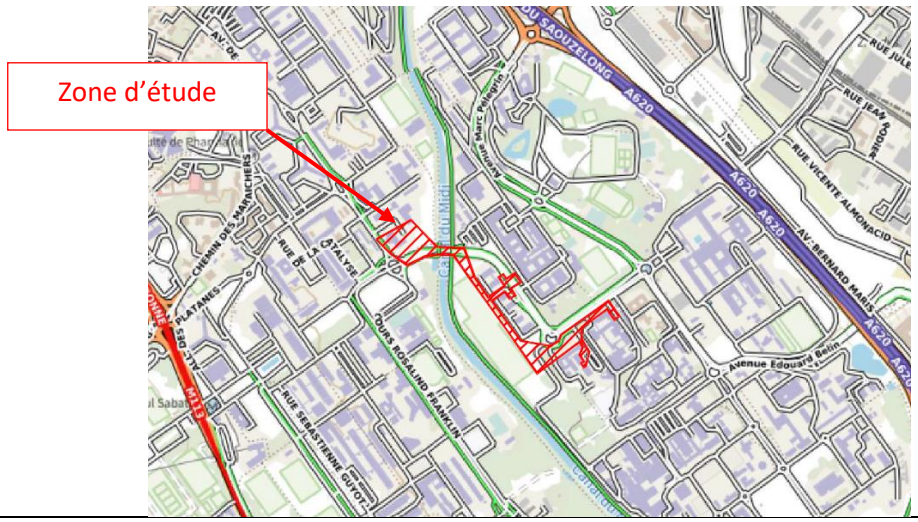

Classe des réseaux selon les DICT :

- ENEDIS : classe A, B et C
- GrDF : classe A,B et C
- Télécom : classe B et C
- FO : classe A et C
- EP/EU: classe A et C
- AEP : classe A et B
- Eclairage : classe B
- Circulation : classe A
- Chauffage : classe A


TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633

ZAC de la Masquère
64 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS


Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu

Points singuliers/Anomalies :

- Les réseaux représentés en pointillés sont des réseaux dont la position est incertaine. Les moyens mis en œuvres n'ont pas permis de repérer ces réseaux. Des sondages complémentaires sont nécessaires pour confirmer la position de ces réseaux.

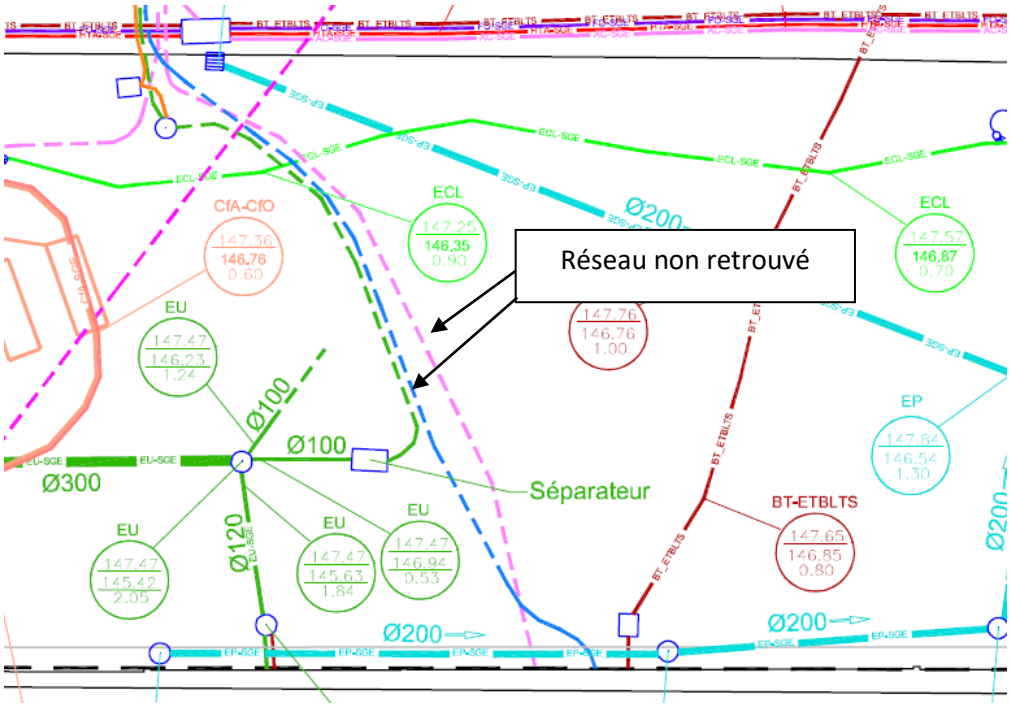

- Les réseaux représentés en orange sur le plan de détection sont des réseaux inconnus (RX) qui n'ont pas pu être identifiés à partir des DICT. La charte graphique fournie ne comportant pas de calque réseau inconnu, ces réseaux ont été laissés dans le calque « 00– TEC RX » de notre charte graphique.

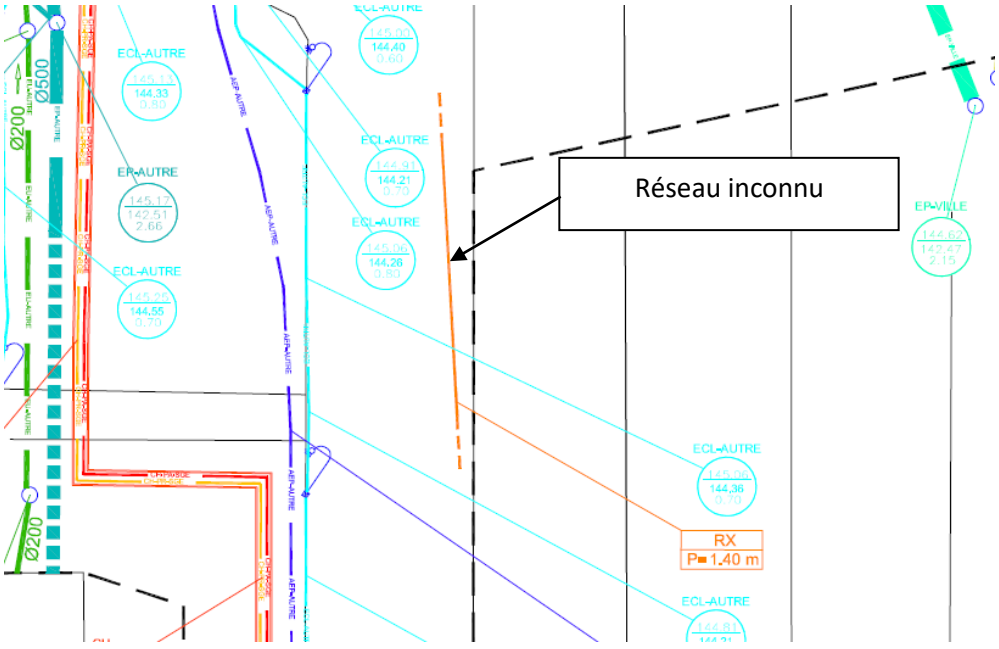


TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633


ZAC de la Masquère
64 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu

- Certains regards sont inaccessibles, bloqués ou enterrés et n'ont donc pas pu être ouverts. Ils devront être rendu accessibles, déterrés et débloqués pour que les départs puissent être relevés. Ces regards sont indiqués par une annotation correspondante.

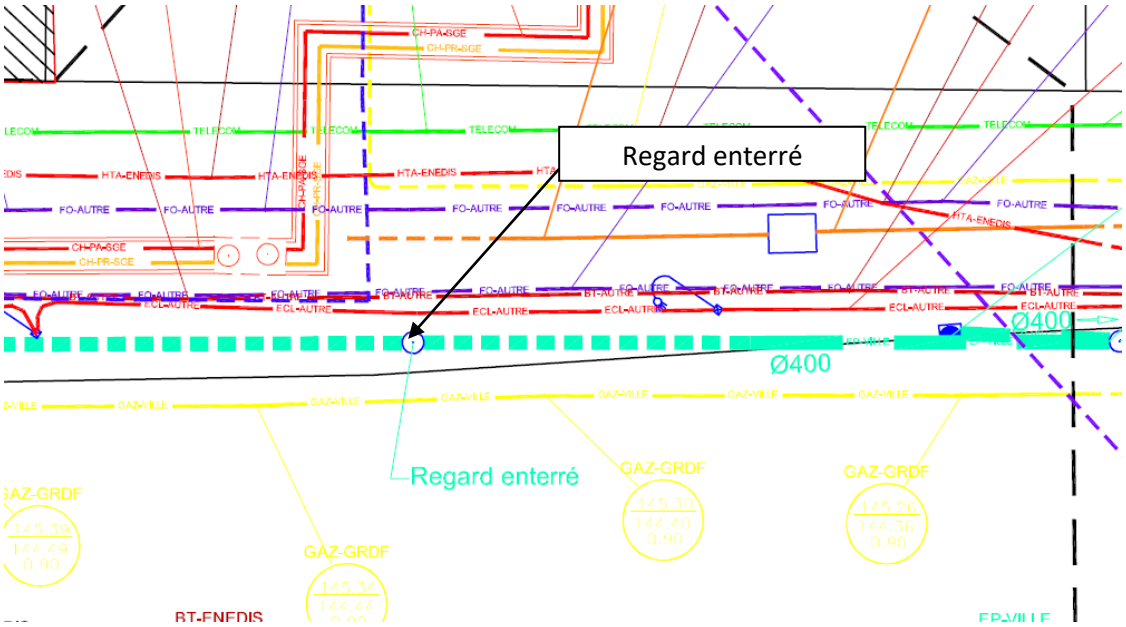


- Au niveau de la sous-station de l'ISAE, l'arrivée de gaz n'a pas pu être retrouvée. Il existe un doute par rapport à la DICT GrDF qui indique une arrivée droite dans le batiment. Une remontée aéro-souterraine existe au coin du bâtiment (au niveau du poste de livraison GAZ) mais est absente de la DICT et ne comporte pas de vanne, ni d'indication. Il n'a pas pu être déterminé s'il s'agit de l'arrivée principale ou d'un réseau secondaire interne à l'ISAE.

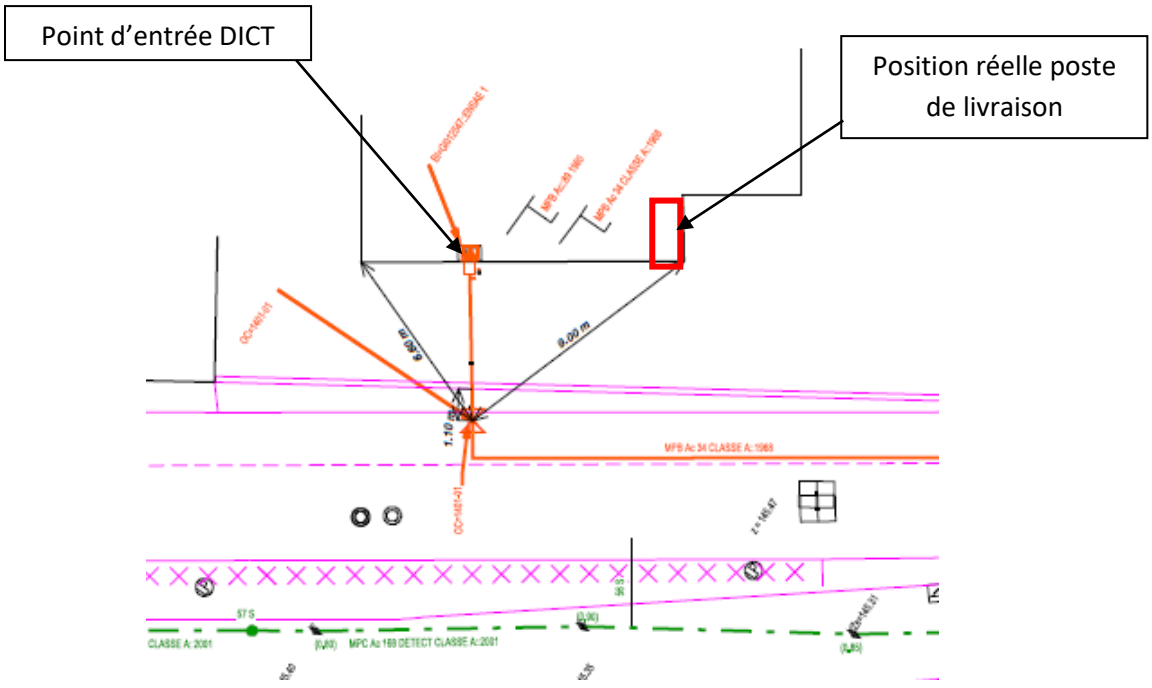


TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633

ZAC de la Masquère
64 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu

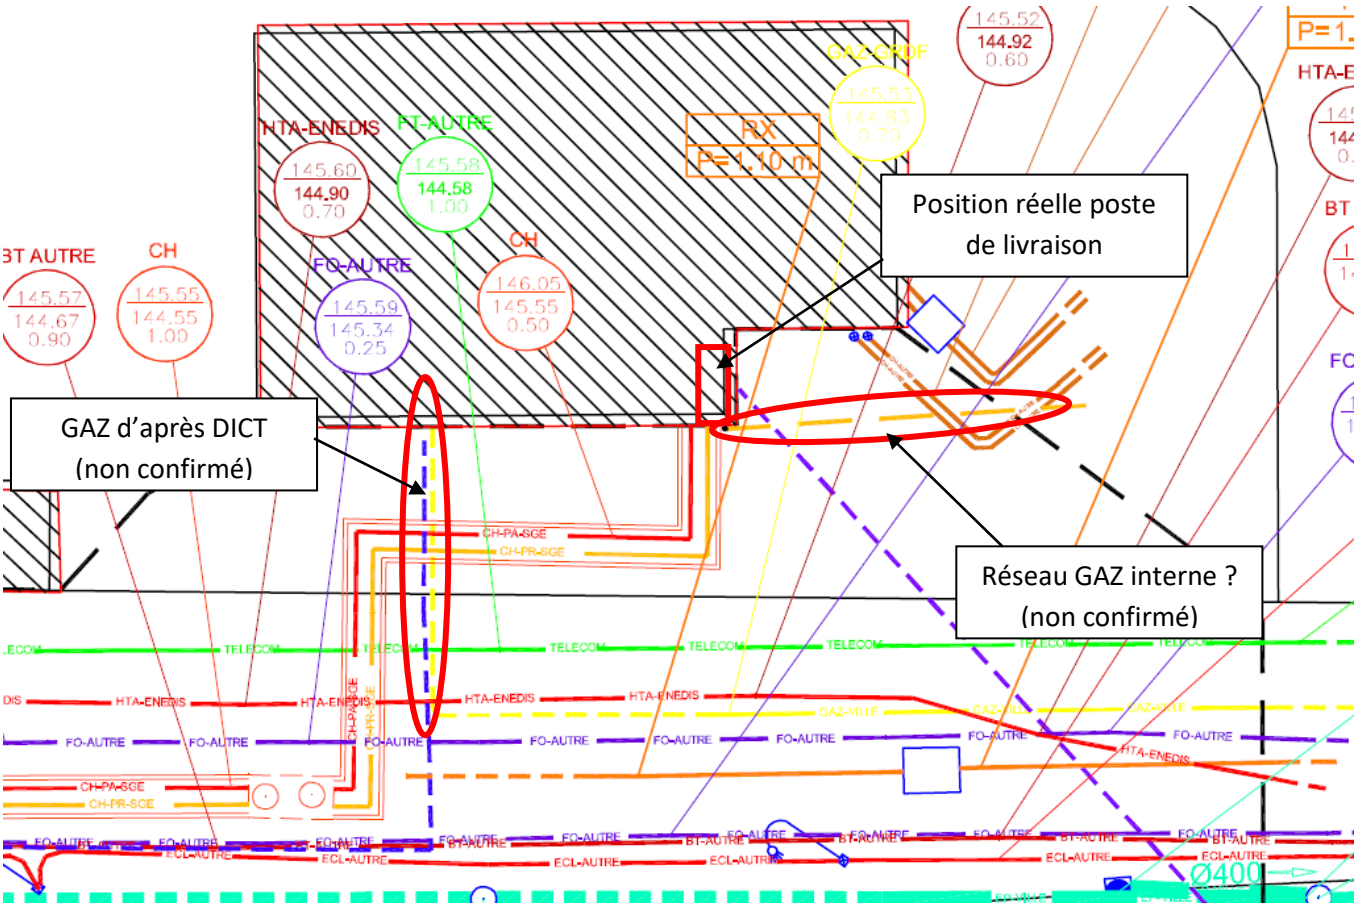

- **Au niveau du pont sur le canal, le réseau de gaz MPC est à très faible profondeur. La DICT indique une profondeur de 4 cm tout le long du pont.**

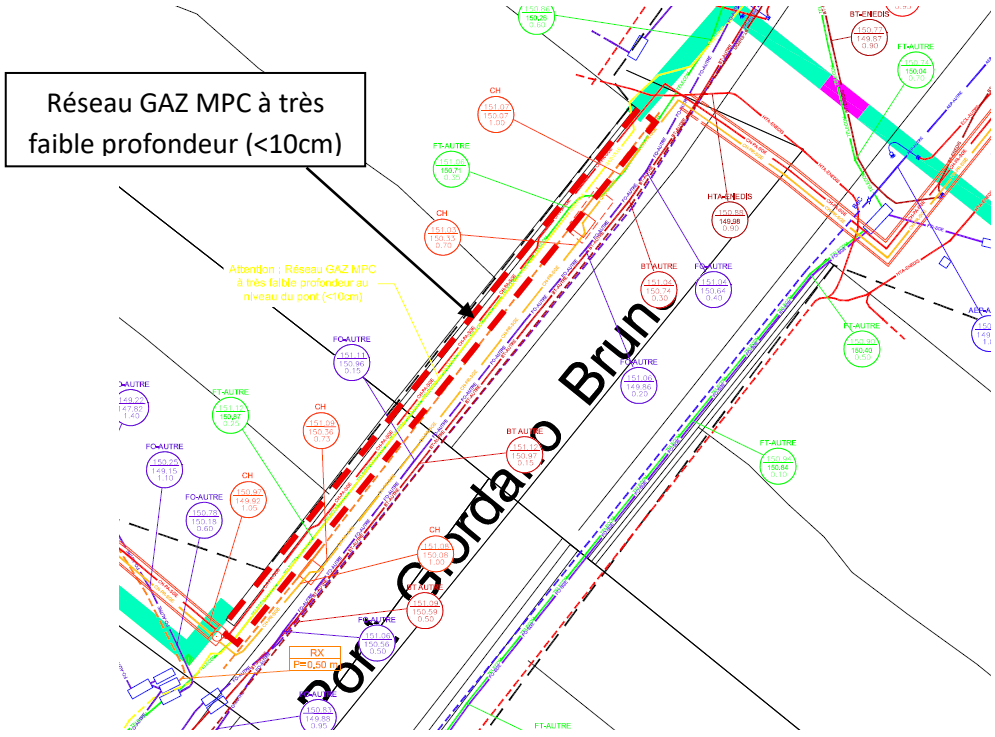


TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633

ZAC de la Masquère
64 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu

- Pour les réseaux de chaleurs, l'indication ALLER/RETOUR imposée par la charte qui nous a été fournie est issue des DICT SGE et n'est pas vérifiée.

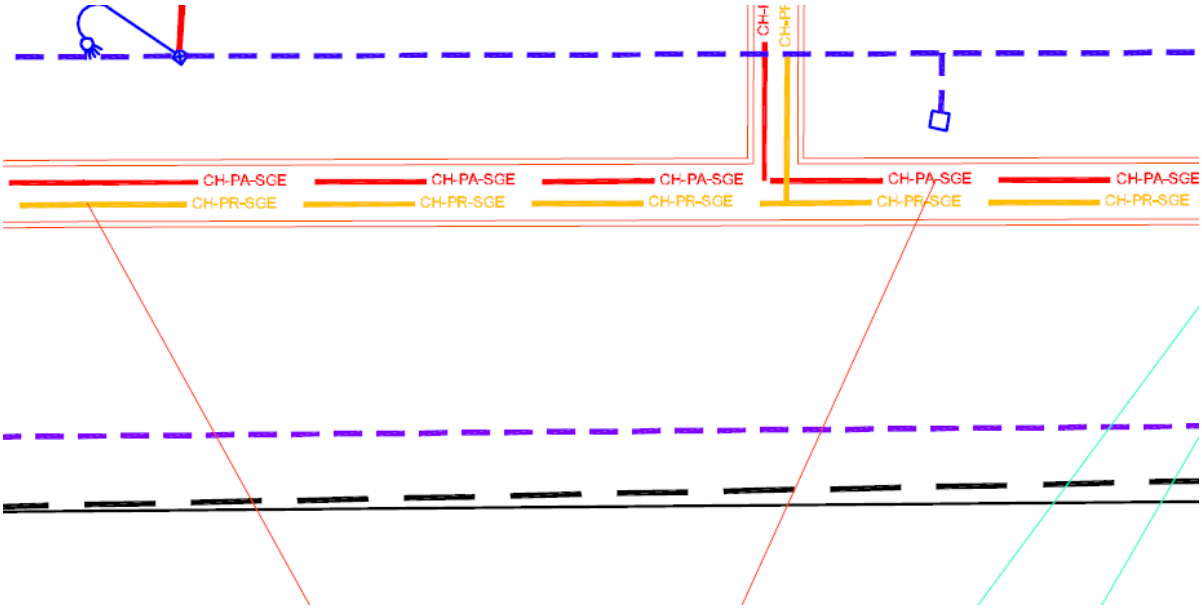

- **Certains réseaux sur les DICT sont identifiés comme étant abandonnés et n'ont pas pu être détectés lors de notre intervention. Il sera nécessaire de se rapprocher auprès des concessionnaires des différents réseaux concernés afin de les localiser (GRDF, ENEDIS).**

TECNISOL SARL au capital de 10 000 euros
Siret 487 819 633 00032
N° TVA Intracommunautaire : FR 026 487 819 633

ZAC de la Masquère
64 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS

Tel : (33) 05 62 19 04 39
Télécopie : 05 62 18 46 57
Mail : tecnisol@tecnisol.eu
