MESURE DU TAUX DE PLOMB DANS LES REVETEMENTS AVANT TRAVAUX ET OU DEMOLITION

DOSSIER P442901 du 29/10/2018

COMMANDITAIRE

EPF Ile de France
4-14 rue Ferrus

75014 PARIS

BATIMENT CONCERNE

Site "DUNLOPILLO"
Allée des Marronniers
78200 MANTES LA JOLIE

PORTEE DE LA MISSION

Mesure du plomb dans les revêtements avant travaux. En l'absence de cadre réglementaire, ce diagnostic doit permettre d'identifier les éléments unitaires portant un revêtement plombifère et indiquer leur taux de plomb afin de permettre un traitement adéquat lors de la démolition ou des travaux. S'agissant d'un diagnostic avant travaux ou avant démolition, l'évaluation de l'état de conservation n'est pas pertinente. L'opération de démolition devant être globale, l'homogénéîté des éléments constitutifs des constructions est prise en compte, l'ittération des mesures doit être de règle.

CONCLUSION

Des revêtements plombifères ont été identifiés

Les mesures sont considérées comme révélant la présence de plomb lorsqu'elles sont supérieures à 1 mg/cm²

REALISATION

Sophie RENVERSEZ Architecture (S.A.R.L.)
Siret : 752 465 302 R.C.S. Lille assurance : M.A.F. n° 155128/B

TECHNOLOGIE Appareil à fluorescence X HEURESIS PB200i n°1397
(source radioactive cd 57 d'activité 185 MBq chargée le 01/02/2018 n° Q2-536)

AUTORISATION ASN : T590706 valide jusqu'au 31/05/2022

DATE DE REALISATION : **21-sept.-18** personnel intervenant : G. LACROIX

sarl d'architecture au capital de 261 000€
Siret : 752 465 302 Lille R.C.S.
SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Tableau de l'Ordre des Architectes : n° S15431
34 rue Druelle 59000 LILLE

Sophie Renversez Architecture
s.a.r.l. d'architecture au capital de 261 000 € siret : 752 465 302 R.C.S. Lille Code APE 7111 Z
34, RUE DRUELLE 59000 LILLE TÉL. 03.20.88.44.01 FAX 03.20.85.25.60
Inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes : n°S15431

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
BAT. 1-5										
Zone BAT. 1										
1	RDC	ATELIER 1		PORTE	/COUR		peinture	métal		0,33
2				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**12,3**
3				FENETRE			peinture	métal		0,06
4				PORTE	/ATELIER 2		peinture	métal		0,36
5			H	MUR			peinture	ciment		0,32
6			G	MUR			peinture	ciment		0,33
7			B	MUR			peinture	ciment		0,01
8			D	MUR			peinture	ciment		0,00
9				**POTEAUX RONDS**			**peinture**	**métal**		**11,33**
10				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**2,54**
11				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,29**
12		ATELIER 2	H	MUR			peinture	ciment		0,06
13			G	MUR			peinture	ciment		0,05
14			B	MUR			peinture	ciment		0,28
15			D	MUR			peinture	ciment		0,39
16				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**1,54**
17				**POTEAUX RONDS**			**peinture**	**métal**		**22,73**
18				PORTE	/COUR		peinture	métal		0,37
19				FENETRE			peinture	métal		0,09
20				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**2,73**
21				PORTE			peinture	métal		0,11
22				FENETRE			peinture	bois		0,24
23				ASCENCEUR			peinture	métal		0,00
24		ATELIER 3	H	MUR			peinture	plâtre		0,01
25			G	MUR			peinture	plâtre		0,12
26			B	MUR			peinture	plâtre		0,01
27			D	MUR			peinture	plâtre		0,11
28				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**1,38**
29				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**6,94**
30		CAVE UBT		CUVE			peinture	métal		0,23
31				**RAMPE**			**peinture**	**métal**		**7,01**
32				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**3,21**
33				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**6,38**
34				TUYAU			peinture	métal		0,26
35		SANITAIRE		**PORTE**			**peinture**	**métal**		**7,72**
36				**PORTE**	**/DEGAGEMENT**		**peinture**	**métal**		**9,02**
37			H	MUR			peinture	plâtre		0,27
38			G	MUR			peinture	plâtre		0,33
39			B	MUR			peinture	plâtre		0,04
40			D	MUR			peinture	plâtre		0,37
41		CIRCULATION	H	MUR			peinture	ciment		0,06
42			G	MUR			peinture	ciment		0,19
43			B	MUR			peinture	ciment		0,05
44			D	MUR			peinture	ciment		0,25
45				PORTE			peinture	métal		0,13
46				PORTE			peinture	métal		0,02
47				PORTE			peinture	métal		0,18
48				CONVOYEUR			peinture	métal		0,18
49				POTEAUX			peinture	métal		0,35
50		STOCK 5		**PORTE**	**/POSTE TECHNIQUE**		**peinture**	**métal**		**1,26**
51		STOCK 6		**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**8,63**
52				PORTE	/COUR		peinture	métal		0,09
53		COUR		**ESCALIER**		**extérieur**	**peinture**	**métal**		**14,26**
54	1	STOCK 1		PORTE	/COUR		peinture	métal		0,31
55				**PORTE**	**/STOCK 3**		**peinture**	**métal**		**2,77**
56				FENETRE			peinture	métal		0,26
57			H	MUR			peinture	plâtre		0,25
58			G	MUR			peinture	plâtre		0,36
59			B	MUR			peinture	plâtre		0,23
60			D	MUR			peinture	plâtre		0,10
61				**PORTE**	**/STOCK 2**		**peinture**	**métal**		**2,86**
62				**POUTRE**			**peinture**	**métal**		**8,12**
63		STOCK 2		PLAFOND			peinture	bois		0,33
64			H	MUR			peinture	plâtre		0,30
65			G	MUR			peinture	plâtre		0,27
66			B	MUR			peinture	plâtre		0,01

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
67			D	MUR			peinture	plâtre		0,07
68				**POUTRE**			**peinture**	**métal**		**9,13**
69		STOCK 3		FENETRE			peinture	métal		0,14
70				ASCENCEUR			peinture	métal		0,25
71				PORTE			peinture	bois		0,15
72				**TRAPPE**			**peinture**	**métal**		**3,66**
73				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**2,52**
74				PORTE			peinture	métal		0,32
75				PORTE			peinture	métal		0,11
76				PLINTHE			peinture	bois		0,30
77				SOL			peinture	ciment		0,30
78				POUTRE			peinture	métal		0,25
79		STOCK 4		**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,81**
80			H	MUR			peinture	ciment		0,32
81			G	MUR			peinture	ciment		0,37
82			B	MUR			peinture	ciment		0,15
83			D	MUR			peinture	ciment		0,01
84				PORTE			peinture	métal		0,16
85				PORTE			peinture	métal		0,39
86				PORTE			peinture	métal		0,09
87		STOCK 5		**POTEAUX COLOMBAGE**			**peinture**	**métal**		**5,16**
88				MUR			peinture	ciment		0,05
89				MUR			peinture	ciment		0,36
90				MUR			peinture	ciment		0,40
91				MUR			peinture	ciment		0,35
92				MUR			peinture	ciment		0,39
93				MUR			peinture	ciment		0,16
94				MUR			peinture	ciment		0,39
95				MUR			peinture	ciment		0,38
96				**PORTE**	**/BUREAU**		**peinture**	**métal**		**12,07**
97				**FENETRE**	**/BUREAU**		**peinture**	**métal**		**8,37**
98				**GRILLE**			**peinture**	**métal**		**6,92**
99				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**4,35**
100		SANITAIRE		PORTE			peinture	bois		0,36
101				PORTE			peinture	bois		0,02
102				PORTE			peinture	bois		0,07
103				PORTE			peinture	bois		0,14
104				PORTE			peinture	bois		0,28
105				MUR			peinture	plâtre		0,00
106				MUR			peinture	plâtre		0,08
107				MUR			peinture	plâtre		0,07
108				MUR			peinture	plâtre		0,14
109				MUR			peinture	plâtre		0,11
110				MUR			peinture	plâtre		0,18
111				MUR			peinture	plâtre		0,11
112				MUR			peinture	plâtre		0,23
113				MUR			peinture	plâtre		0,30
114				MUR			peinture	plâtre		0,36
115				MUR			peinture	plâtre		0,13
116				MUR			peinture	plâtre		0,12
117				MUR			peinture	plâtre		0,06
118				MUR			peinture	plâtre		0,40
119				MUR			peinture	plâtre		0,29
120		VESTIAIRE		PORTE			peinture	bois		0,17
121				PORTE			peinture	bois		0,02
122				MUR			peinture	ciment		0,15
123				MUR			peinture	ciment		0,06
124				MUR			peinture	ciment		0,31
125				MUR			peinture	ciment		0,30
126				MUR			peinture	ciment		0,23
127				MUR			peinture	ciment		0,09
128				PLINTHE			peinture	bois		0,14
129				FENETRE			peinture	bois		0,18
130				PORTE			peinture	métal		0,29
131			H	MUR			peinture	plâtre		0,28
132			G	MUR			peinture	plâtre		0,39
133			B	MUR			peinture	plâtre		0,09
134			D	MUR			peinture	plâtre		0,40

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
135		VESTIAIRE 2		PORTE			peinture	bois		0,13
136				PORTE			peinture	métal		0,06
137			H	MUR			peinture	plâtre		0,38
138			G	MUR			peinture	plâtre		0,24
139			B	MUR			peinture	plâtre		0,39
140			D	MUR			peinture	plâtre		0,34
141		HALL		**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**3,1**
142			H	MUR			peinture	ciment		0,15
143			G	MUR			peinture	ciment		0,08
144			B	MUR			peinture	ciment		0,03
145			D	MUR			peinture	ciment		0,02
146		MEZZANINE		GARDE CORPS			peinture	métal		0,24
Zone BAT. 5										0,00
147	RDC	SALLE 1	H	MUR			peinture	plâtre		0,05
148			G	MUR			peinture	plâtre		0,38
149			B	MUR			peinture	plâtre		0,29
150			D	MUR			peinture	plâtre		0,39
151				PORTE			peinture	bois		0,01
152		SALLE 2	H	MUR			peinture	plâtre		0,16
153			G	MUR			peinture	plâtre		0,26
154			B	MUR			peinture	plâtre		0,38
155			D	MUR			peinture	plâtre		0,10
156		SALLE 3	H	MUR			peinture	plâtre		0,37
157			G	MUR			peinture	plâtre		0,04
158			B	MUR			peinture	plâtre		0,25
159			D	MUR			peinture	plâtre		0,02
160				FENETRE			peinture	bois		0,33
161				VOLET			peinture	bois		0,02
162		SALLE 4	H	MUR			peinture	plâtre		0,08
163			G	MUR			peinture	plâtre		0,27
164			B	MUR			peinture	plâtre		0,12
165			D	MUR			peinture	plâtre		0,18
166				FENETRE			peinture	bois		0,20
167				VOLET			peinture	bois		0,03
168		DEGAGEMENT		**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**8,1**
169			H	MUR			peinture	plâtre		0,26
170			G	MUR			peinture	plâtre		0,34
171			B	MUR			peinture	plâtre		0,36
172			D	MUR			peinture	plâtre		0,03
173		CUISINE	H	MUR			peinture	plâtre		0,23
174			G	MUR			peinture	plâtre		0,15
175			B	MUR			peinture	plâtre		0,10
176			D	MUR			peinture	plâtre		0,19
177				FENETRE			peinture	métal		0,37
178				VERRIERE			peinture	métal		0,30
179		ENTREE	H	MUR			peinture	plâtre		0,00
180			G	MUR			peinture	plâtre		0,26
181			B	MUR			peinture	plâtre		0,24
182			D	MUR			peinture	plâtre		0,09
183				**PORTE**			**peinture**	**bois**		**9,6**
184		BUREAU 1	H	MUR			peinture	plâtre		0,03
185			G	MUR			peinture	plâtre		0,25
186			B	MUR			peinture	plâtre		0,01
187			D	MUR			peinture	plâtre		0,16
188				**PORTE**			**peinture**	**bois**		**8,4**
189				FENETRE			peinture	bois		0,40
190		BUREAU 2	H	MUR			peinture	plâtre		0,31
191			G	MUR			peinture	plâtre		0,13
192			B	MUR			peinture	plâtre		0,25
193			D	MUR			peinture	plâtre		0,29
194				**PORTE**			**peinture**	**bois**		**10,4**
195				**FENETRE**			**peinture**	**bois**		**9,4**
196				**VOLET**			**peinture**	**bois**		**4,6**
197	1	SANITAIRE	**H**	**MUR**			**peinture**	**plâtre**		**1**
198			**G**	**MUR**			**peinture**	**plâtre**		**1,6**
199			**B**	**MUR**			**peinture**	**plâtre**		**1,2**
200			**D**	**MUR**			**peinture**	**plâtre**		**1,9**
201				PORTE			peinture	bois		0,32

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
202				**FENETRE**			**peinture**	**bois**		**1,4**
BAT. 2-3-9										
203	SOUS-SOL	CAVE		**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**15,02**
204				**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**3,05**
205	RDC	VESTIAIRE 1		FENETRE			peinture	métal		0,20
206			H	MUR			toile de verre	plâtre		0,40
207			G	MUR			toile de verre	plâtre		0,16
208			B	MUR			toile de verre	plâtre		0,08
209			D	MUR			toile de verre	plâtre		0,14
210				PORTE			peinture	bois		0,35
211				PLAFOND			peinture	plâtre		0,29
212		SALLE DE PAUSE	H	MUR			peinture	plâtre		0,19
213			G	MUR			peinture	plâtre		0,20
214			B	MUR			peinture	plâtre		0,13
215			D	MUR			peinture	plâtre		0,28
216				PLAFOND			peinture	plâtre		0,15
217		DOUCHE		PORTE			peinture	bois		0,34
218		HALL		PORTE			peinture	métal		0,10
219				MUR			peinture	ciment		0,01
220				MUR			peinture	ciment		0,33
221				MUR			peinture	ciment		0,29
222		LOCAL FEU		PORTE		extérieur	peinture	métal		0,31
223				PORTE			peinture	métal		0,09
224				FENETRE			peinture	métal		0,02
225				FENETRE			peinture	métal		0,06
226			H	MUR			peinture	ciment		0,37
227			G	MUR			peinture	ciment		0,06
228			B	MUR			peinture	ciment		0,13
229			D	MUR			peinture	ciment		0,18
230		STOCK		**BARRIERE**			**peinture**	**métal**		**1,15**
231				**PROTEGE TUYAU**			**peinture**	**métal**		**2,04**
232				PORTE	/ATELIER 1		peinture	métal		0,23
233			H	MUR			peinture	ciment		0,02
234			G	MUR			peinture	ciment		0,23
235			B	MUR			peinture	ciment		0,09
236			D	MUR			peinture	ciment		0,28
237				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**13,69**
238				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**16,28**
239		ATELIER 1		**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**6,17**
240				PORTE	/LATEX		peinture	métal		0,24
241			H	MUR			peinture	ciment		0,27
242			G	MUR			peinture	ciment		0,30
243			B	MUR			peinture	ciment		0,31
244			D	MUR			peinture	ciment		0,18
245				**GRILLE**			**peinture**	**métal**		**7,56**
246				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**5,1**
247				SOL		trace jaune	peinture	résine		0,03
248				**BARRIERE**			**peinture**	**métal**		**1,32**
249				FENETRE			peinture	métal		0,27
250				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**5,92**
251		ATELIER 2		**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**13,06**
252				**BATI**	**/CAGE D'ESCALIER**		**peinture**	**métal**		**2,5**
253				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**1,26**
254				**PORTE**	**/COUR**		**peinture**	**métal**		**6,82**
255				**PORTE**	**/SOUS-SOL**		**peinture**	**métal**		**4,14**
256				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**3,18**
257		BUREAUX		MUR			peinture	métal		0,17
258				MUR			peinture	métal		0,09
259				MUR			peinture	métal		0,16
260				PORTE			peinture	métal		0,10
261				MUR			peinture	métal		0,15
262				MUR			peinture	métal		0,17
263				MUR			peinture	métal		0,13
264		ESCALIER		**RAMPE**	**/1er ETAGE**		**peinture**	**métal**		**12,03**
265		LATEX		**POTEAUX JAUNES**			**peinture**	**métal**		**8,16**
266				MUR			peinture	brique		0,40
267				MUR			peinture	brique		0,12
268				MUR			peinture	brique		0,17

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
269				MUR			peinture	brique		0,37
270				MUR			peinture	brique		0,29
271				MUR			peinture	brique		0,01
272			H	MUR			peinture	ciment		0,15
273			G	MUR			peinture	ciment		0,16
274			B	MUR			peinture	ciment		0,25
275			D	MUR			peinture	ciment		0,39
276				**ECHELLE**		**jaune**	**peinture**	**métal**		**4,14**
277				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**5,18**
278				POTEAUX			peinture	métal		0,28
279				POTEAUX			peinture	métal		0,26
280				POTEAUX			peinture	métal		0,02
281				POTEAUX			peinture	métal		0,31
282				**POTEAUX**		**ronds**	**peinture**	**métal**		**8,76**
283				CUVE			peinture	métal		0,07
284				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**4,72**
285		LOCAL 3		**RAMBARDE**			**peinture**	**métal**		**3,22**
286	1	ATELIER 3		**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**8,86**
287				**PORTE**	**/LATEX**		**peinture**	**métal**		**16,14**
288		SALLE MELANGE		**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**8,71**
289				MUR			peinture	plâtre		0,19
290				MUR			peinture	plâtre		0,09
291				MUR			peinture	plâtre		0,14
292				MUR			peinture	plâtre		0,29
293				MUR			peinture	plâtre		0,10
294				MUR			peinture	plâtre		0,28
295				TUYAU			peinture	métal		0,12
296				**FERME**			**peinture**	**métal**		**13,22**
297		LABORATOIRE	H	MUR			peinture	plâtre		0,20
298			G	MUR			peinture	plâtre		0,14
299			B	MUR			peinture	plâtre		0,30
300			D	MUR			peinture	plâtre		0,11
301		VESTIAIRE	H	MUR			peinture	plâtre		0,05
302			G	MUR			peinture	plâtre		0,24
303			B	MUR			peinture	plâtre		0,26
304			D	MUR			peinture	plâtre		0,27
305		STOCK	H	MUR			peinture	plâtre		0,08
306			G	MUR			peinture	plâtre		0,01
307			B	MUR			peinture	plâtre		0,15
308			D	MUR			peinture	plâtre		0,15
309				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**12,01**
310				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**4,18**
311				SOL			peinture	ciment		0,04
312				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**3,26**
313		PASSERELLE		**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**4,73**
314	2	ARCHIVE		**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**16,74**
315				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**6,03**
316			H	MUR			peinture	plâtre		0,29
317			G	MUR			peinture	plâtre		0,29
318			B	MUR			peinture	plâtre		0,18
319			D	MUR			peinture	plâtre		0,07
320				PORTE			peinture	bois		0,17
321				PORTE			peinture	bois		0,31
322				FENETRE			peinture	bois		0,35
323	3	TERRASSE		**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,02**
BAT. 4a										0,19
324	RDC	STOCK	H	MUR			peinture	ciment		0,04
325			G	MUR			peinture	ciment		0,17
326			B	MUR			peinture	ciment		0,33
327			D	MUR			peinture	ciment		0,33
328				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**2,18**
329				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**6,65**
330				SOL		jaune	peinture	béton		0,16
331				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**9,02**
BAT. 7										
332	RDC	LABORATOIRE 1		**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**8,68**
333			H	MUR			peinture	plâtre		0,28
334			G	MUR			peinture	plâtre		0,21

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
335			B	MUR			peinture	plâtre		0,09
336			D	MUR			peinture	plâtre		0,11
337				PORTE			peinture	métal		0,00
338				PORTE			peinture	bois		0,22
339				POTEAUX			peinture	métal		0,00
340				ESCALIER			peinture	métal		0,31
341				GARDE CORPS			peinture	métal		0,16
342		BUREAUX		PORTE			peinture	bois		0,14
343				PORTE			peinture	bois		0,11
344				PORTE			peinture	bois		0,12
345				PORTE			peinture	bois		0,28
346				PORTE			peinture	bois		0,33
347				PORTE			peinture	bois		0,12
348				PORTE			peinture	bois		0,08
349				PORTE			peinture	bois		0,03
350				PORTE			peinture	bois		0,24
351				PORTE			peinture	bois		0,39
352				PORTE			peinture	bois		0,28
353				PORTE			peinture	bois		0,30
354				PORTE			peinture	bois		0,10
355				PORTE			peinture	bois		0,21
356				PORTE			peinture	bois		0,14
357				RADIATEUR			peinture	métal		0,34
358				RAMBARDE			peinture	métal		0,36
BAT. 8										
359	RDC	COUTURE		**ESCALIER**		**rambarde**	**peinture**	**métal**		**2,28**
360			H	MUR			peinture	plâtre		0,35
361			G	MUR			peinture	plâtre		0,09
362			B	MUR			peinture	plâtre		0,18
363			D	MUR			peinture	plâtre		0,04
364				**FENETRE**			**peinture**	**bois**		**3,36**
365				SOL			peinture	ciment		0,28
366				SOL			peinture	ciment		0,33
367				**SOL**		**trace jaune**	**peinture**	**ciment**		**4,22**
368				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**15,23**
369		MATELAS		MUR			peinture	ciment		0,07
370				MUR			peinture	ciment		0,22
371				MUR			peinture	ciment		0,26
372				MUR			peinture	ciment		0,32
373				MUR			peinture	ciment		0,36
374				MUR			peinture	ciment		0,05
375				MUR			peinture	ciment		0,15
376				MUR			peinture	ciment		0,28
377				**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**6,83**
378				**SOL**		**trace jaune**	**peinture**	**ciment**		**1,48**
379				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**3,96**
380				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,33**
381				**PORTE**	**/LATEX**		**peinture**	**métal**		**6,28**
382		SOMMIER		PORTE	/FUMOIR		peinture	métal		0,07
383				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,54**
384				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**4,28**
385			H	MUR			peinture	ciment		0,38
386			G	MUR			peinture	ciment		0,10
387			B	MUR			peinture	ciment		0,29
388			D	MUR			peinture	ciment		0,15
389		SALLE DE PAUSE	H	MUR			peinture	plâtre		0,03
390			G	MUR			peinture	plâtre		0,36
391			B	MUR			peinture	plâtre		0,02
392			D	MUR			peinture	plâtre		0,21
393				PORTE	/COUTURE		peinture	bois		0,34
394	1	VESTIAIRE		**GRILLE**			**peinture**	**métal**		**3,86**
395			H	MUR			peinture	plâtre		0,38
396			G	MUR			peinture	plâtre		0,03
397			B	MUR			peinture	plâtre		0,17
398			D	MUR			peinture	plâtre		0,30
399		DEGAGEMENT		PORTE			peinture	bois		0,23
400				PORTE			peinture	bois		0,06
401				PORTE			peinture	bois		0,26

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
402				PORTE			peinture	bois		0,17
403				FENETRE			peinture	métal		0,11
404				FENETRE			peinture	métal		0,38
405				FENETRE			peinture	métal		0,38
406				FENETRE			peinture	métal		0,14
407				FENETRE			peinture	métal		0,29
408				FENETRE			peinture	métal		0,09
409				**FERME**			**peinture**	**métal**		**21,89**
BAT. 10-11										
410	MEZZANINE	MEZZANINE		**RAMBARDE**			**peinture**	**métal**		**3,6**
411	RDC	BUREAU 3	H	MUR			peinture	plâtre		0,28
412			G	MUR			peinture	plâtre		0,33
413			B	MUR			peinture	plâtre		0,15
414			D	MUR			peinture	plâtre		0,22
415				FENETRE			peinture	métal		0,29
416				PORTE			peinture	bois		0,04
417		BUREAU 4	H	MUR			peinture	plâtre		0,35
418			G	MUR			peinture	plâtre		0,31
419			B	MUR			peinture	plâtre		0,02
420			D	MUR			peinture	plâtre		0,32
421				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**3,4**
422				PORTE			peinture	bois		0,25
423		VESTIAIRE	H	MUR			peinture	béton		0,12
424			G	MUR			peinture	béton		0,22
425			B	MUR			peinture	béton		0,13
426			D	MUR			peinture	béton		0,07
427				PORTE			peinture	métal		0,04
428		DOUCHE	H	MUR			peinture	béton		0,30
429			G	MUR			peinture	béton		0,32
430			B	MUR			peinture	béton		0,04
431			D	MUR			peinture	béton		0,09
432				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**6,2**
433		ATELIER 1	H	MUR			peinture	béton		0,37
434			G	MUR			peinture	béton		0,13
435			B	MUR			peinture	béton		0,01
436			D	MUR			peinture	béton		0,13
437				PORTE			peinture	métal		0,29
438				SOL			peinture	béton		0,11
439		ATELIER 2	H	MUR			peinture	béton		0,05
440			G	MUR			peinture	béton		0,02
441			B	MUR			peinture	béton		0,18
442			D	MUR			peinture	béton		0,01
443				PORTE			peinture	métal		0,04
444				**COLONNE**			**peinture**	**métal**		**3,4**
445		STRUCTURE		**POTEAUX**			**peinture**	**métal**		**6,6**
446		STOCK	H	MUR			peinture	béton		0,11
447			G	MUR			peinture	béton		0,17
448			B	MUR			peinture	béton		0,05
449			D	MUR			peinture	béton		0,18
450				PORTE			peinture	métal		0,34
451				**GRILLE**			**peinture**	**métal**		**2,4**
452				**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**1,9**
BAT. 13										
453	RDC	BATIMENT 13		**PORTE FENETRE**			**peinture**	**métal**		**11,44**
454				PORTE			peinture	métal		0,16
455				FENETRE			peinture	métal		0,27
456				PORTE			peinture	bois		0,23
457				PORTE			peinture	bois		0,03
458				PORTE			peinture	bois		0,39
459				MUR			peinture	plâtre		0,16
460				MUR			peinture	plâtre		0,39
461				MUR			peinture	plâtre		0,03
462				MUR			peinture	plâtre		0,30
463				MUR			peinture	plâtre		0,23
464				MUR			peinture	plâtre		0,21
465				MUR			peinture	plâtre		0,13
466				MUR			peinture	plâtre		0,09
467				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**4,23**

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
BAT. 14										
468	RDC	FACADE		FENETRE			peinture	métal		13,4
469		STOCK 1		PORTE			peinture	métal		14,6
470				SOL			peinture	béton		0,07
471		STOCK 2		PORTE			peinture	métal		0,03
472			H	MUR			peinture	plâtre		0,02
473			G	MUR			peinture	plâtre		0,19
474			B	MUR			peinture	plâtre		0,19
475			D	MUR			peinture	plâtre		0,01
476				BARRIERE			peinture	métal		3,2
477		STOCK 3	H	MUR			peinture	plâtre		0,03
478			G	MUR			peinture	plâtre		0,02
479			B	MUR			peinture	plâtre		0,36
480			D	MUR			peinture	plâtre		0,16
481				PORTE			peinture	métal		12,1
482				BARRIERE			peinture	métal		7,9
483		STOCK 4		PORTE			peinture	métal		11,4
484		STOCK 5	H	MUR			peinture	béton		0,29
485			G	MUR			peinture	béton		0,06
486			B	MUR			peinture	béton		0,31
487			D	MUR			peinture	béton		0,30
488				PORTE			peinture	bois		0,08
489				PORTE			peinture	métal		14,6
490				SOL			peinture	béton		0,10
491		SANITAIRE		PORTE			peinture	bois		19,6
BAT. 16										
492	RDC	HANGAR		PORTE			peinture	métal		7,12
493				SOL			peinture	béton		0,26
494				ETAGERE			peinture	métal		0,23
BAT. 19										
495	RDC	VESTIAIRE	H	MUR			peinture	plâtre		0,30
496			G	MUR			peinture	plâtre		0,12
497			B	MUR			peinture	plâtre		0,05
498			D	MUR			peinture	plâtre		0,26
499				PORTE			peinture	bois		0,04
500		SANITAIRE	H	MUR			peinture	plâtre		0,03
501			G	MUR			peinture	plâtre		0,35
502			B	MUR			peinture	plâtre		0,21
503			D	MUR			peinture	plâtre		0,18
504				PORTE			peinture	bois		0,37
505		BUREAU	H	MUR			peinture	plâtre		0,36
506			G	MUR			peinture	plâtre		0,13
507			B	MUR			peinture	plâtre		0,30
508			D	MUR			peinture	plâtre		0,25
509				PORTE			peinture	bois		0,26
510		STOCK	H	MUR			peinture	plâtre		0,30
511			G	MUR			peinture	plâtre		0,26
512			B	MUR			peinture	plâtre		0,06
513			D	MUR			peinture	plâtre		0,23
514				PORTE			peinture	bois		0,27
515				SOL			peinture	béton		0,16
516				ESCALIER			peinture	métal		0,20
BAT. 21										
517	RDC	RESERVE		PORTE			peinture	métal		0,26
518				PORTE			peinture	métal		0,16
519				PORTE			peinture	métal		0,10
520	1	CHAUFFERIE		POTEAUX		jaunes	peinture	métal		6,23
521				POTEAUX			peinture	métal		12,48
522				CONDUITE			peinture	métal		2,28
523				PORTE			peinture	bois		0,28
524				PORTE			peinture	bois		0,09
525				PORTE		petite	peinture	métal		18,46
526				CHAUDIERE			peinture	métal		7,22
527				PORTE		grande	peinture	métal		21,09
528			H	MUR			peinture	plâtre		0,34
529			G	MUR			peinture	plâtre		0,24
530			B	MUR			peinture	plâtre		0,33
531			D	MUR			peinture	plâtre		0,10

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
532				**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**3,39**
533				**FENETRE**			**peinture**	**métal**		**4,06**
534				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,08**
535		DEMINERALISATION		POTEAUX			peinture	métal		0,19
536				POTEAUX			peinture	métal		0,13
537				POTEAUX			peinture	métal		0,04
538				FENETRE			peinture	métal		0,00
539			H	MUR			peinture	plâtre		0,23
540			G	MUR			peinture	plâtre		0,11
541			B	MUR			peinture	plâtre		0,39
542			D	MUR			peinture	plâtre		0,01
543				**CUVE**			**peinture**	**métal**		**4,71**
544				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**2,98**
BAT. 27b										
545	RDC	LOCAL	H	MUR			peinture	béton		0,14
546			G	MUR			peinture	béton		0,24
547			B	MUR			peinture	béton		0,00
548			D	MUR			peinture	béton		0,40
549				PORTE			peinture	métal		0,04
550				FENETRE			peinture	métal		0,25
BAT. 30										
551	RDC	SALLE	H	MUR			peinture	plâtre		0,15
552			G	MUR			peinture	plâtre		0,35
553			B	MUR			peinture	plâtre		0,39
554			D	MUR			peinture	plâtre		0,08
555				POTEAUX			peinture	plâtre		0,09
556				PORTE			peinture	bois		0,14
557		ACCUEIL		PORTE			peinture	bois		0,08
558				PORTE			peinture	bois		0,08
559			H	MUR			toile de verre	plâtre		0,23
560			G	MUR			toile de verre	plâtre		0,40
561			B	MUR			toile de verre	plâtre		0,09
562			D	MUR			toile de verre	plâtre		0,17
BAT. 56										
563	RDC	DIRECTION		PORTE			peinture	bois		0,27
564				PORTE			peinture	bois		0,02
565				PORTE			peinture	bois		0,04
566				PORTE			peinture	bois		0,28
567				PORTE			peinture	bois		0,02
568				PORTE			peinture	bois		0,40
569				PORTE			peinture	bois		0,28
570				PORTE			peinture	bois		0,03
571				PORTE			peinture	bois		0,03
572				PORTE			peinture	bois		0,29
573				PORTE			peinture	bois		0,19
574				PORTE			peinture	bois		0,09
575				PORTE			peinture	bois		0,36
576				MUR			toile de verre	plâtre		0,04
577				MUR			toile de verre	plâtre		0,12
578				MUR			toile de verre	plâtre		0,34
579				MUR			toile de verre	plâtre		0,36
580				MUR			toile de verre	plâtre		0,19
581				MUR			toile de verre	plâtre		0,23
582				MUR			toile de verre	plâtre		0,05
583				MUR			toile de verre	plâtre		0,06
584				MUR			toile de verre	plâtre		0,35
585				MUR			toile de verre	plâtre		0,22
586				MUR			toile de verre	plâtre		0,21
587				MUR			toile de verre	plâtre		0,23
588				MUR			toile de verre	plâtre		0,00
589				MUR			toile de verre	plâtre		0,21
590				MUR			toile de verre	plâtre		0,12
591				MUR			toile de verre	plâtre		0,03
592				MUR			toile de verre	plâtre		0,06
593				MUR			toile de verre	plâtre		0,38
594				MUR			toile de verre	plâtre		0,40
595				MUR			toile de verre	plâtre		0,07
596				MUR			toile de verre	plâtre		0,02
597				MUR			toile de verre	plâtre		0,27
598				MUR			toile de verre	plâtre		0,37

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
599				MUR			toile de verre	plâtre		0,10
600				MUR			toile de verre	plâtre		0,00
601				FENETRE			peinture	bois		0,30
602				FENETRE			peinture	bois		0,31
603				FENETRE			peinture	bois		0,11
604				FENETRE			peinture	bois		0,06
605				FENETRE			peinture	bois		0,15
606				FENETRE			peinture	bois		0,29
607				FENETRE			peinture	bois		0,21
608				FENETRE			peinture	bois		0,39
609				FENETRE			peinture	bois		0,02
610				FENETRE			peinture	bois		0,38
611				FENETRE			peinture	bois		0,32
612				FENETRE			peinture	bois		0,29
613				FENETRE			peinture	bois		0,36
614				FENETRE			peinture	bois		0,20
615				FENETRE			peinture	bois		0,39
616				FENETRE			peinture	bois		0,02
BAT. 61										
617	RDC	ENTREE	H	MUR			peinture	plâtre		0,01
618			G	MUR			peinture	plâtre		0,29
619			B	MUR			peinture	plâtre		0,25
620			D	MUR			peinture	plâtre		0,14
621				**PORTE**	**/COUR**		**peinture**	**métal**		**3,19**
622				PLAFOND			peinture	plâtre		0,05
623				PORTE	/STOCKAGE		peinture	bois		0,05
624		STOCKAGE		**PORTE**	**/MACHINERIE ASC**		**peinture**	**métal**		**5,28**
625				MUR			peinture	plâtre		0,03
626				MUR			peinture	plâtre		0,06
627				MUR			peinture	plâtre		0,21
628				MUR			peinture	plâtre		0,09
629				MUR			peinture	plâtre		0,19
630				MUR			peinture	plâtre		0,08
631				SOL		trace jaune	peinture	ciment		0,17
632				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**4,63**
633				PORTE	/BUREAU		peinture	bois		0,25
634		VESTIAIRE		MUR			peinture	plâtre		0,14
635				MUR			peinture	plâtre		0,38
636				MUR			peinture	plâtre		0,03
637				MUR			peinture	plâtre		0,24
638				MUR			peinture	plâtre		0,37
639				MUR			peinture	plâtre		0,15
640				MUR			peinture	plâtre		0,20
641				MUR			peinture	plâtre		0,02
642		SANITAIRE		MUR			peinture	plâtre		0,34
643				MUR			peinture	plâtre		0,36
644				MUR			peinture	plâtre		0,16
645				MUR			peinture	plâtre		0,37
646				MUR			peinture	plâtre		0,29
647				MUR			peinture	plâtre		0,04
648				MUR			peinture	plâtre		0,03
649				MUR			peinture	plâtre		0,05
650		ESCALIER 2	H	MUR			peinture	plâtre		0,20
651			G	MUR			peinture	plâtre		0,33
652			B	MUR			peinture	plâtre		0,21
653			D	MUR			peinture	plâtre		0,33
654				**POTEAUX JAUNES**			**peinture**	**ciment**		**8,75**
655	1	STOCKAGE		MUR			peinture	ciment		0,40
656				MUR			peinture	ciment		0,19
657				MUR			peinture	ciment		0,37
658				MUR			peinture	ciment		0,18
659				MUR			peinture	ciment		0,03
660				MUR			peinture	ciment		0,00
661				MUR			peinture	ciment		0,24
662				MUR			peinture	ciment		0,39
663				MONTE CHARGE			peinture	métal		0,39
664				PORTE			peinture	bois		0,02
665				PORTE			peinture	bois		0,11
666				PORTE			peinture	bois		0,26
667				**ESCALIER**			**peinture**	**métal**		**4,23**

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
668				**POTEAUX**			**peinture**	**ciment**		**3,96**
669				**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**2,98**
670				SOL			peinture	ciment		0,10
671				SOL			peinture	ciment		0,36
672				**PORTE**			**peinture**	**métal**		**4,13**
673				**SOL**		**jaune**	**peinture**	**ciment**		**3,12**
674		BUREAU	H	MUR			peinture	plâtre		0,23
675			G	MUR			peinture	plâtre		0,04
676			B	MUR			peinture	plâtre		0,26
677			D	MUR			peinture	plâtre		0,35
678		SANITAIRE	H	MUR			peinture	plâtre		0,11
679			G	MUR			peinture	plâtre		0,23
680			B	MUR			peinture	plâtre		0,01
681			D	MUR			peinture	plâtre		0,27
682	2	VESTIAIRE		MUR			peinture	plâtre		0,11
683				MUR			peinture	plâtre		0,02
684				MUR			peinture	plâtre		0,29
685				MUR			peinture	plâtre		0,07
686				MUR			peinture	plâtre		0,36
687				MUR			peinture	plâtre		0,01
688				MUR			peinture	plâtre		0,03
689				MUR			peinture	plâtre		0,39
690				MUR			peinture	plâtre		0,30
691				MUR			peinture	plâtre		0,35
692				POTEAUX			peinture	métal		0,11
693				PORTE			peinture	bois		0,19
694				PORTE			peinture	bois		0,11
695				PORTE			peinture	bois		0,08
696				PORTE			peinture	bois		0,01
697				PORTE			peinture	bois		0,01
698				PORTE			peinture	bois		0,03
BAT. 69										
699	RDC	MAGASIN		SOL			peinture	béton		0,25
700				PORTE			peinture	métal		0,06
701				FENETRE			peinture	métal		0,06
702				POTEAUX			peinture	métal		0,06
703		LOCAL CHARGE		POTEAUX			peinture	métal		0,21
704				**PIED DE POTEAU**			**peinture**	**métal**		**1,09**
705				**BARRIERE**			**peinture**	**métal**		**1,86**
706				MUR			peinture	béton		0,30
BAT. 70										
707	RDC	ADMINISTRATION		PORTE			peinture	bois		0,33
708				PORTE			peinture	bois		0,22
709				PORTE			peinture	bois		0,36
710				PORTE			peinture	bois		0,06
711				PORTE			peinture	bois		0,09
712				PORTE			peinture	bois		0,35
713				PORTE			peinture	bois		0,25
714				PORTE			peinture	bois		0,13
715				PORTE			peinture	bois		0,33
716				PORTE			peinture	bois		0,21
717				PORTE			peinture	bois		0,22
718				PORTE			peinture	bois		0,10
719				PORTE			peinture	bois		0,07
720				PORTE			peinture	bois		0,19
721				PORTE			peinture	bois		0,10
722				PORTE			peinture	bois		0,15
723				PORTE			peinture	bois		0,13
724				PORTE			peinture	bois		0,12
725				PORTE			peinture	bois		0,31
726				PORTE			peinture	bois		0,09
727				PORTE			peinture	bois		0,25
728				PORTE			peinture	bois		0,07
729				MUR			papier peint	bois		0,08
730				MUR			papier peint	bois		0,13
731				MUR			papier peint	bois		0,19
732				MUR			papier peint	bois		0,14
733				MUR			papier peint	bois		0,18
734				MUR			papier peint	bois		0,04
735				MUR			papier peint	bois		0,26
736				MUR			papier peint	bois		0,26

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
737				MUR			papier peint	bois		0,25
738				MUR			papier peint	bois		0,06
739				MUR			papier peint	bois		0,22
740				MUR			papier peint	bois		0,17
741				MUR			papier peint	bois		0,25
742				MUR			papier peint	bois		0,33
743				MUR			papier peint	bois		0,00
744				MUR			papier peint	bois		0,23
745				MUR			papier peint	bois		0,22
746				MUR			papier peint	bois		0,21
747				MUR			papier peint	bois		0,12
748				MUR			papier peint	bois		0,35
749				MUR			papier peint	bois		0,08
750				MUR			papier peint	bois		0,03
751				MUR			papier peint	bois		0,38
752				MUR			papier peint	bois		0,04
753				MUR			papier peint	bois		0,20
754				MUR			papier peint	bois		0,13
755				MUR			papier peint	bois		0,33
756				MUR			papier peint	bois		0,08
757				MUR			papier peint	bois		0,22
758				MUR			papier peint	bois		0,21
759				PLINTHE			peinture	bois		0,18
760				PLINTHE			peinture	bois		0,21
761				PLINTHE			peinture	bois		0,10
762				PLINTHE			peinture	bois		0,36
763				PLINTHE			peinture	bois		0,13
764				PLINTHE			peinture	bois		0,26
765				PLINTHE			peinture	bois		0,25
766				PLINTHE			peinture	bois		0,12
767				BATI			peinture	bois		0,34
768				BATI			peinture	bois		0,15
769				BATI			peinture	bois		0,08
770				BATI			peinture	bois		0,01
771				BATI			peinture	bois		0,13
772				BATI			peinture	bois		0,13
773				BATI			peinture	bois		0,03
774				BATI			peinture	bois		0,19
775				BATI			peinture	bois		0,23
776				BATI			peinture	bois		0,29
777				BATI			peinture	bois		0,10
778				BATI			peinture	bois		0,01
779				BATI			peinture	bois		0,03
780				BATI			peinture	bois		0,39
781				BATI			peinture	bois		0,12
782				BATI			peinture	bois		0,16
783				BATI			peinture	bois		0,28
784				FENETRE			vernis	bois		0,19
785				FENETRE			vernis	bois		0,25
786				FENETRE			vernis	bois		0,35
787				FENETRE			vernis	bois		0,33
788				FENETRE			vernis	bois		0,28
789				FENETRE			vernis	bois		0,08
790				FENETRE			vernis	bois		0,19
791				FENETRE			vernis	bois		0,17
792				FENETRE			vernis	bois		0,06
793				FENETRE			vernis	bois		0,17
794				FENETRE			vernis	bois		0,16
795				FENETRE			vernis	bois		0,23
796				FENETRE			vernis	bois		0,11
797				FENETRE			vernis	bois		0,07
798				FENETRE			vernis	bois		0,25
799				FENETRE			vernis	bois		0,06
800				FENETRE			peinture	bois		0,30
801				FENETRE			peinture	bois		0,24
802				FENETRE			peinture	bois		0,34
803				FENETRE			peinture	bois		0,19
BAT. 72										
804	RDC	HANGAR		**BARRIERE**			**peinture**	**métal**		**8,6**
805				POTEAUX			peinture	métal		0,09

DIAGTIM

N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
806				ETAGERE			peinture	métal		0,40
807				PORTE			peinture	métal		0,08
BAT. 73										
808	RDC	ADMINISTRATIF		PORTE			peinture	bois		0,13
809				PORTE			peinture	bois		0,37
810				PORTE			peinture	bois		0,33
811				PORTE			peinture	bois		0,14
812				PORTE			peinture	bois		0,32
813				PORTE			peinture	bois		0,35
814				PORTE			peinture	bois		0,33
815				PORTE			peinture	bois		0,36
816				PORTE			peinture	bois		0,30
817				PORTE			peinture	bois		0,16
818				PORTE			peinture	bois		0,40
819				PORTE			peinture	bois		0,05
820				PORTE			peinture	bois		0,22
821				MUR			papier peint	bois		0,37
822				MUR			papier peint	bois		0,10
823				MUR			papier peint	bois		0,20
824				MUR			papier peint	bois		0,24
825				MUR			papier peint	bois		0,36
826				MUR			papier peint	bois		0,18
827				MUR			papier peint	bois		0,37
828				MUR			papier peint	bois		0,00
829				MUR			papier peint	bois		0,29
830				MUR			papier peint	bois		0,30
831				MUR			papier peint	bois		0,23
832				MUR			papier peint	bois		0,05
833				MUR			papier peint	bois		0,26
834				MUR			papier peint	bois		0,08
835				MUR			papier peint	bois		0,05
836				MUR			papier peint	bois		0,26
837				MUR			papier peint	bois		0,19
838				MUR			papier peint	bois		0,33
839				MUR			papier peint	bois		0,39
840				MUR			papier peint	bois		0,09
BAT. 74										
841	RDC	LOCAL		PORTE			peinture	métal		0,08
842				POTEAUX			peinture	métal		0,11
BAT. 75										
843	RDC	INFIRMERIE		PORTE			peinture	bois		0,39
844				PORTE			peinture	bois		0,30
845				PORTE			peinture	bois		0,00
846				PORTE			peinture	bois		0,15
847				PORTE			peinture	bois		0,21
848				PORTE			peinture	bois		0,17
849				MUR			papier peint	bois		0,32
850				MUR			papier peint	bois		0,22
851				MUR			papier peint	bois		0,22
852				MUR			papier peint	bois		0,39
853				MUR			papier peint	bois		0,22
854				MUR			papier peint	bois		0,25
855				MUR			papier peint	bois		0,12
856				MUR			papier peint	bois		0,34
857				MUR			papier peint	bois		0,21
858				MUR			papier peint	bois		0,17
859				MUR			papier peint	bois		0,31
860				MUR			papier peint	bois		0,27
861				MUR			papier peint	bois		0,32
862				MUR			papier peint	bois		0,19
863				MUR			papier peint	bois		0,37
864				MUR			papier peint	bois		0,31
865				MUR			papier peint	bois		0,39
866				MUR			papier peint	bois		0,21
867				FENETRE			vernis	bois		0,03
868		SALLE	H	MUR			papier peint	bois		0,15
869			G	MUR			papier peint	bois		0,18
870			B	MUR			papier peint	bois		0,31
871			D	MUR			papier peint	bois		0,04
BAT. 76										
872	RDC	HANGAR		SOL			peinture	béton		0,20


N°	ETAGE	LOCAL	COTE	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	ETAT	RESULTATS PbC
873				BARRIERE			peinture	métal		0,24
BAT. 77										
874	RDC	LOCAL	H	MUR			peinture	ciment		0,36
875			G	MUR			peinture	ciment		0,30
876			B	MUR			peinture	ciment		0,23
877			D	MUR			peinture	ciment		0,36
878				PORTE			peinture	métal		0,05
879				**POTEAUX**		**jaunes**	**peinture**	**métal**		**3,49**
880				POTEAUX		gris	peinture	métal		0,05
881				POTEAUX		gris	peinture	métal		0,02
882				POTEAUX		gris	peinture	métal		0,18
883				POTEAUX		gris	peinture	métal		0,01
884				**ECHELLE**			**peinture**	**métal**		**3,89**
885				PORTE			peinture	métal		0,18
886				POTEAUX			peinture	métal		0,15
887				POTEAUX			peinture	métal		0,18
888				POTEAUX			peinture	métal		0,32
889		EXTERIEUR		**GARDE CORPS**			**peinture**	**métal**		**3,64**
890				**POTEAUX**		**bleus**	**peinture**	**métal**		**1,39**
891				ECHELLE		rouge	peinture	métal		0,11
CENTRALE TELEPHONIQUE										
892	RDC	CENTRALE TELEPHONIQUE		**PORTE**			**peinture**	**métal**		**3,45**
893				FENETRE			peinture	métal		0,26
894			H	MUR			peinture	plâtre		0,37
895			G	MUR			peinture	plâtre		0,21
896			B	MUR			peinture	plâtre		0,37
897			D	MUR			peinture	plâtre		0,30
898				PLAFOND			peinture	plâtre		0,22
EXTERIEUR										
899	EXTERIEUR	EXTERIEUR		GARDE CORPS			peinture	métal		0,32
900				GARDE CORPS			peinture	métal		0,26
901				GARDE CORPS			peinture	métal		0,17
902				GARDE CORPS			peinture	métal		0,28
903				GARDE CORPS			peinture	métal		0,19
904				GARDE CORPS			peinture	métal		0,27

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 1-5 (Zone BAT. 1)

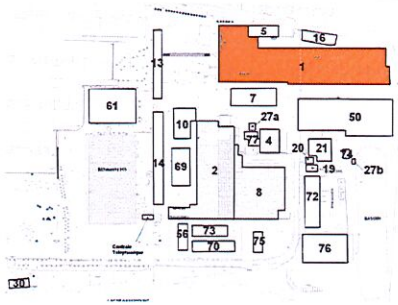



E.P.F. ILE DE FRANCE.

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

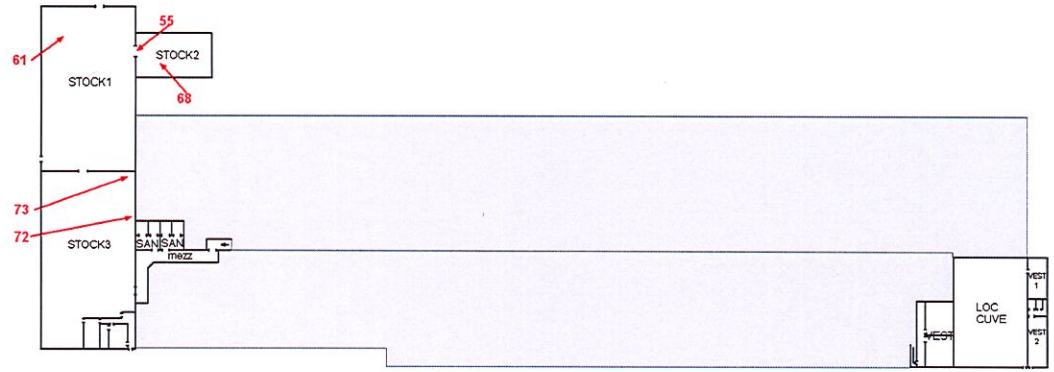



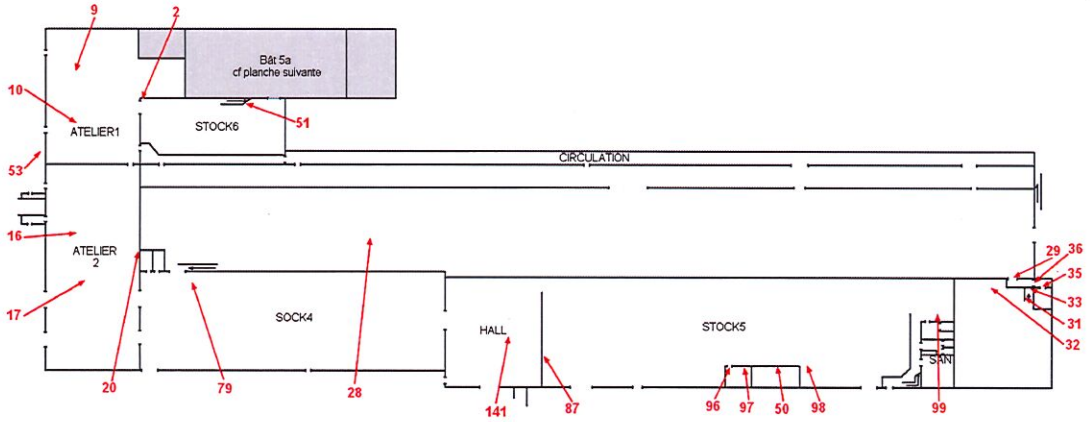


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 1-5 (Zone BAT. 5)

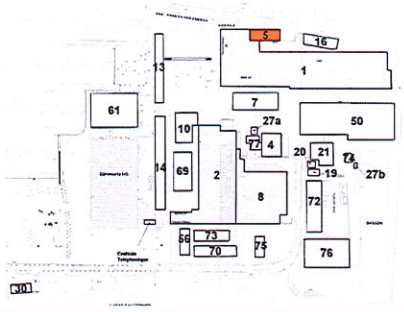


E.P.F. ILE DE FRANCE


Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

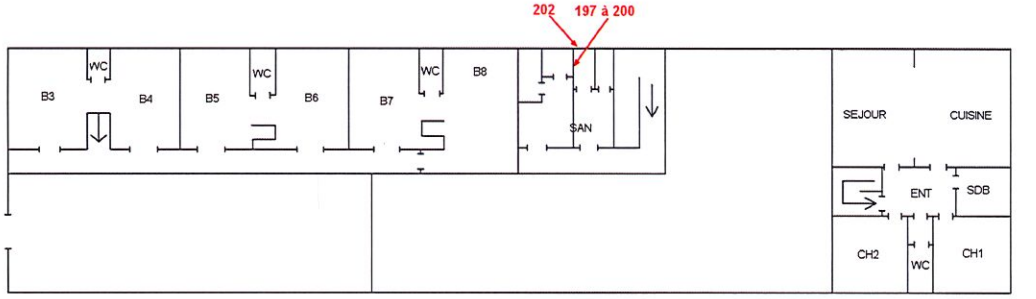

1er ET.

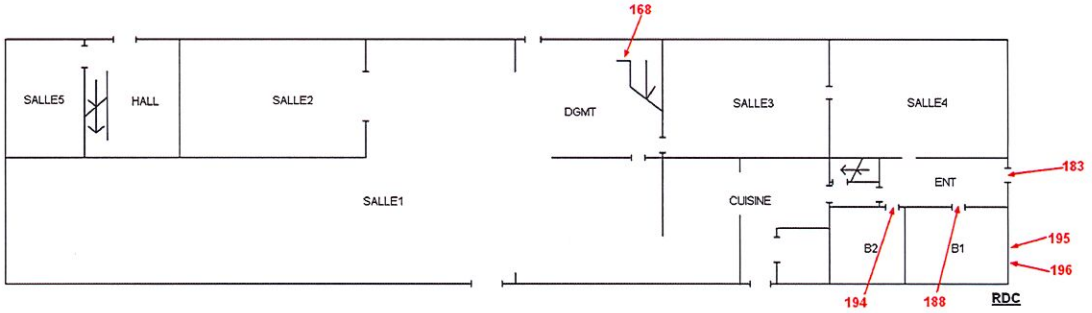

RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 2-3-9

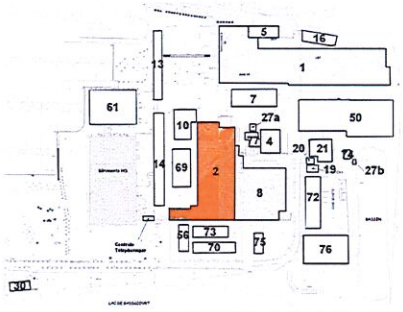

E.P.F. ILE DE FRANCE.

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

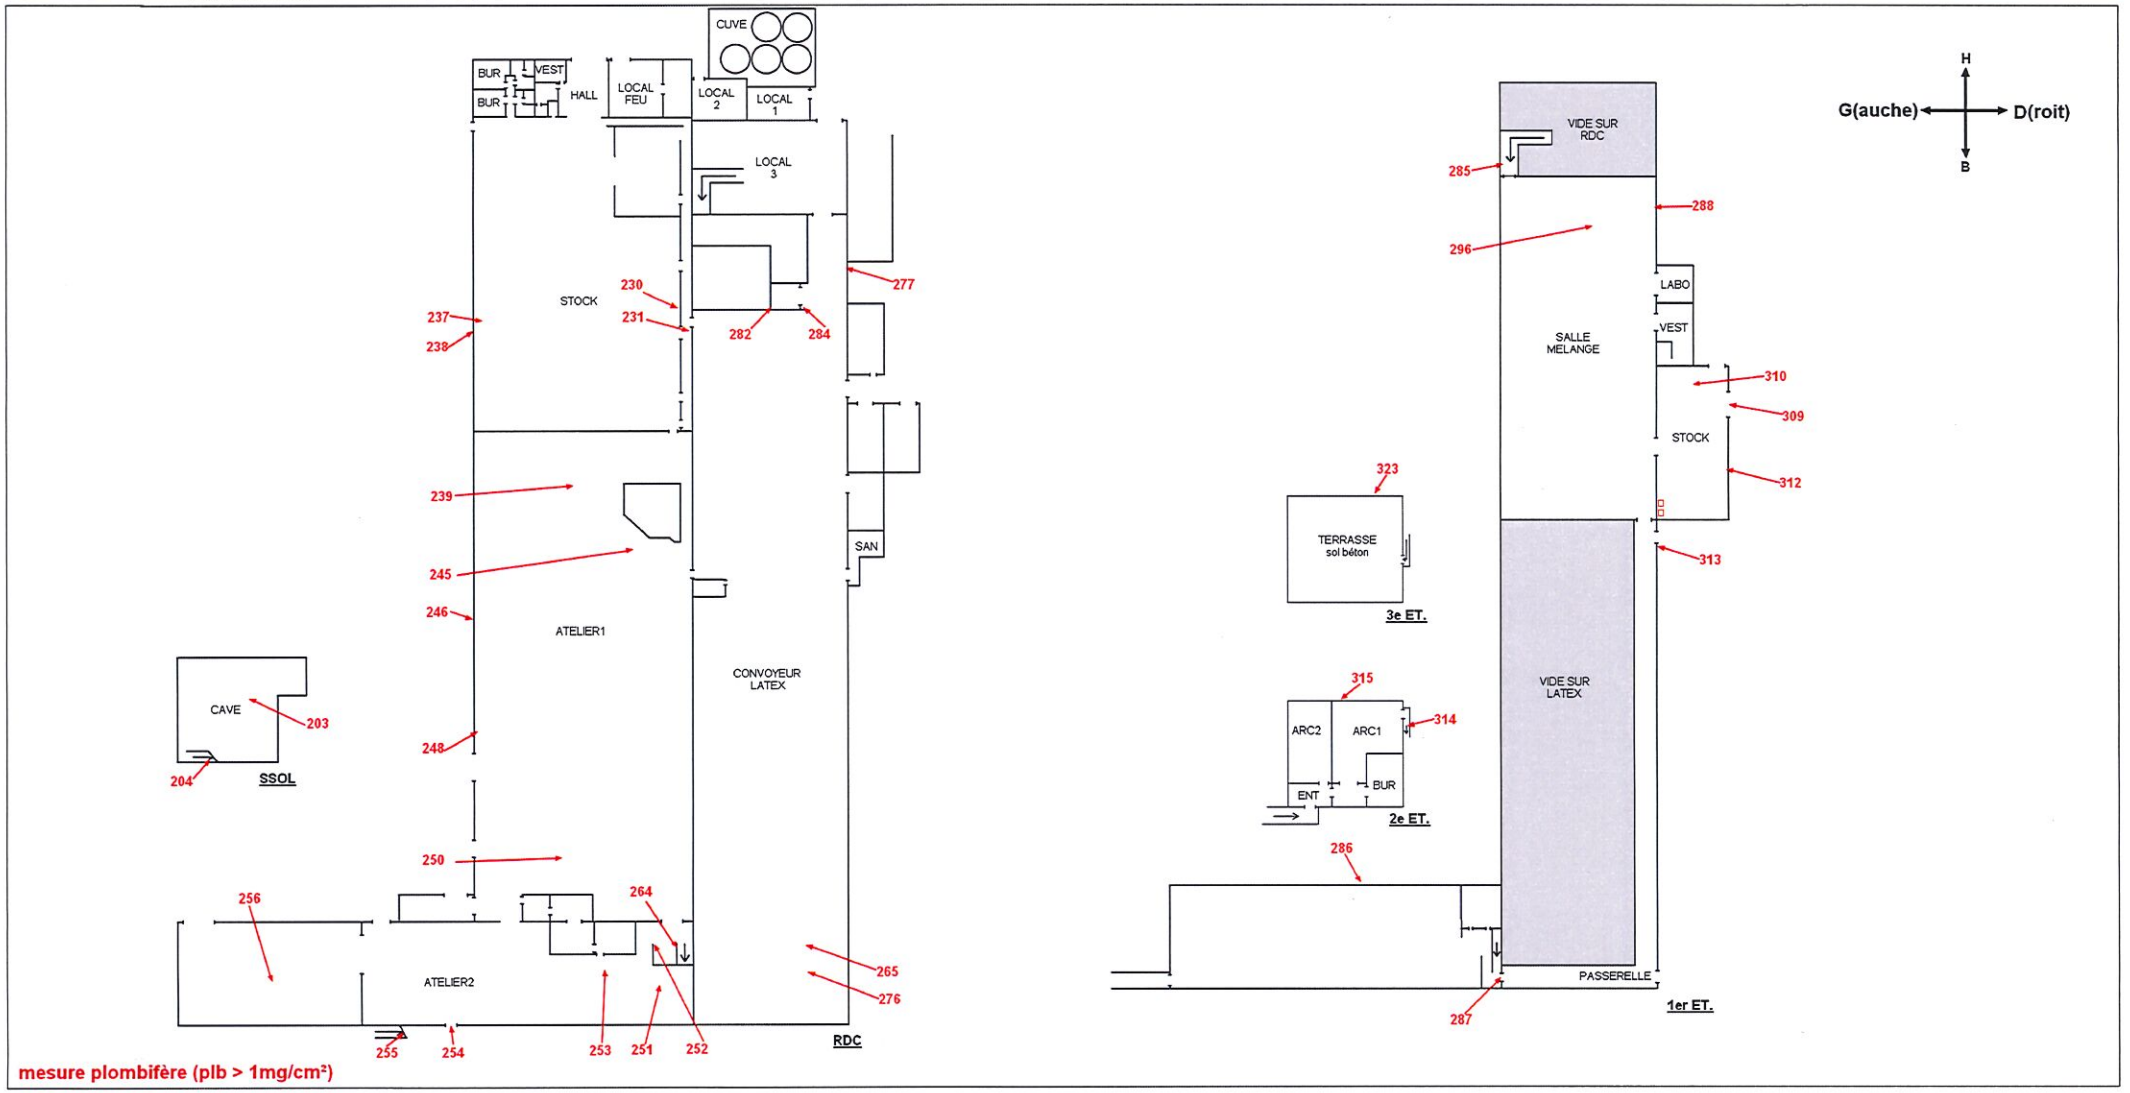

mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 4a




E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

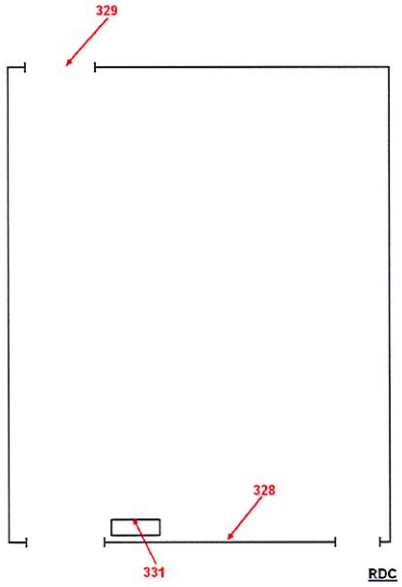


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 7

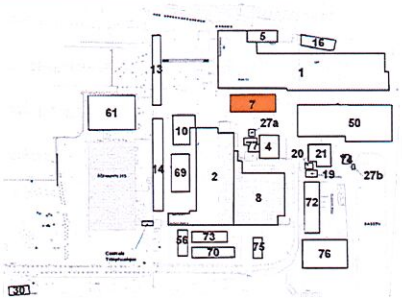


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

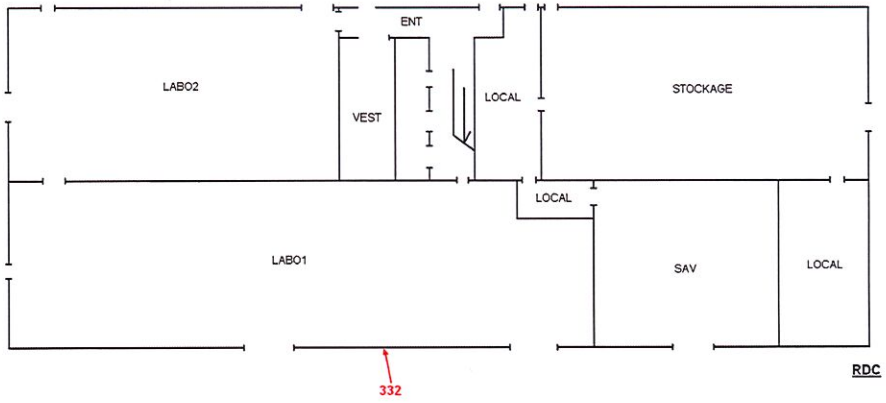


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 8

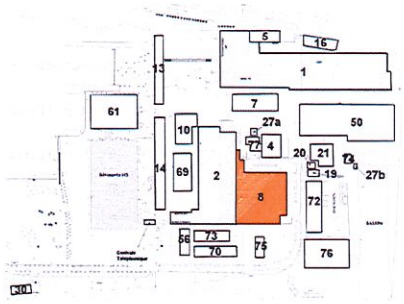



E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères


DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

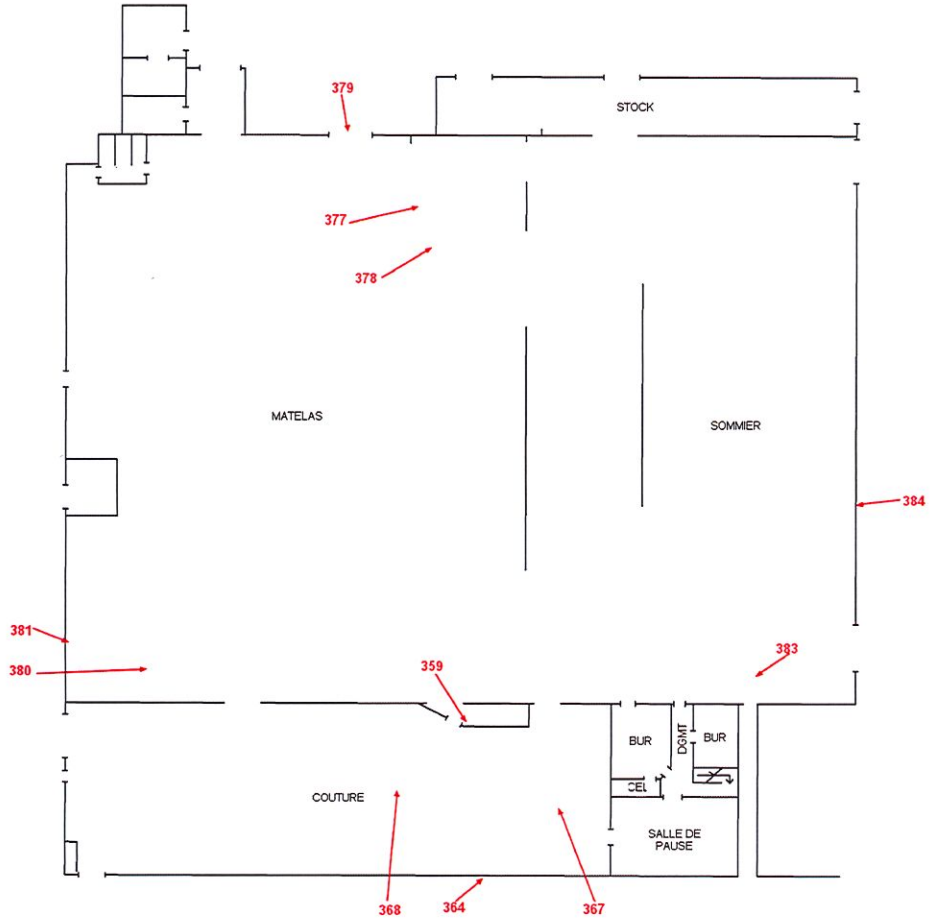






2e ET.



1er ET.



SSOL


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 10-11

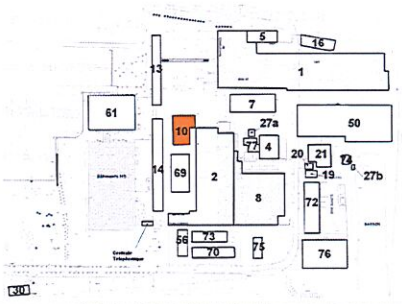

E.P.F. ILE DE FRANCE


Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01



MEZZ

H
G(auche) D(roit)
B

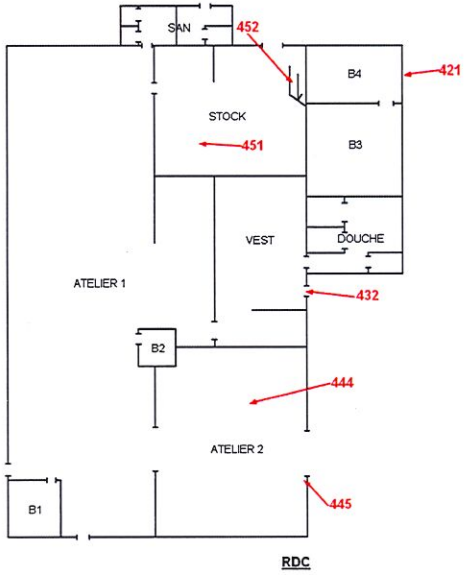

RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 13

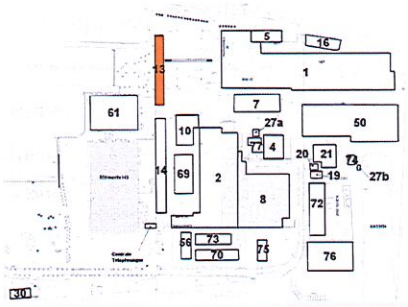


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01






mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 14

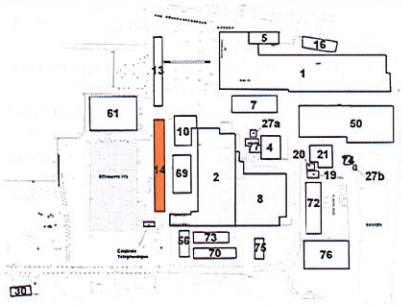


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01






mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 16

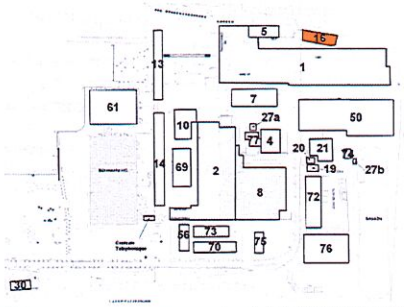


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

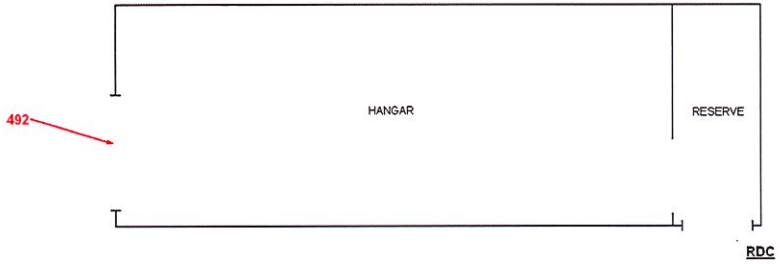


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 19

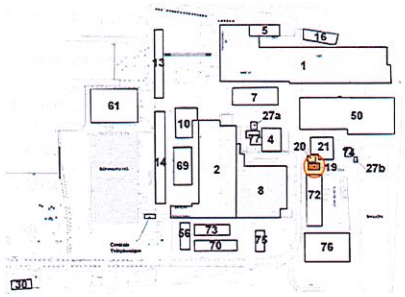


E.P.F. ILE DE FRANCE


Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B



TOIT.



RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT.20

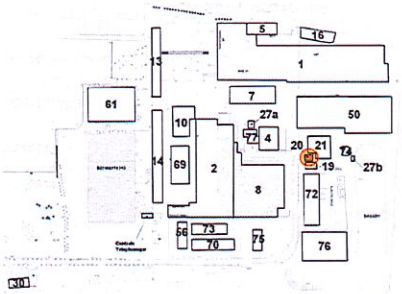


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B



RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 21

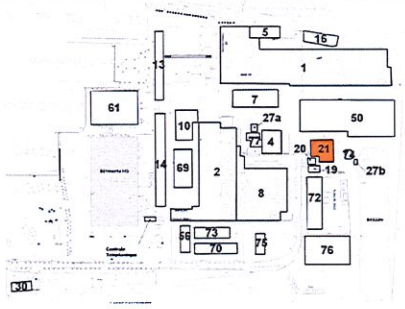



E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

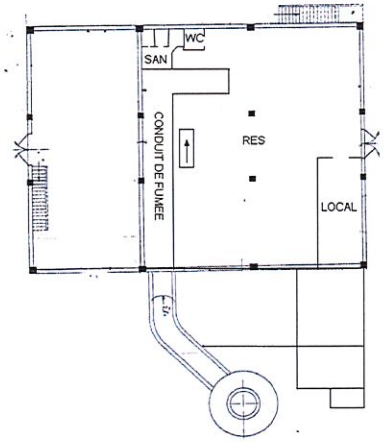

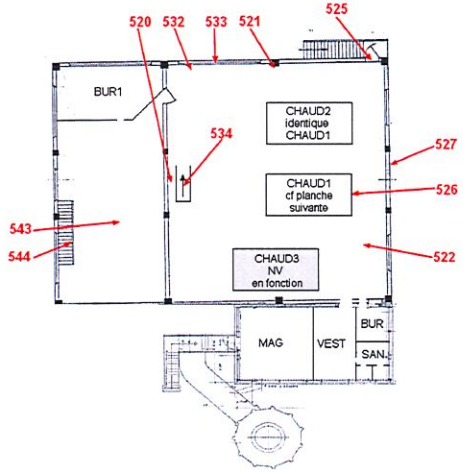


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 27a

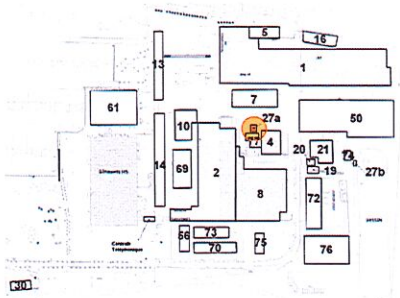


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B




mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 27b

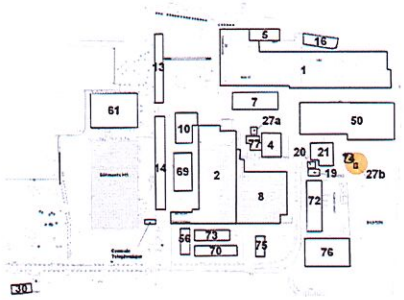


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

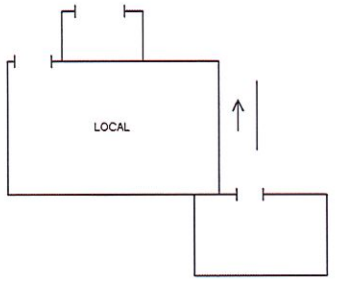

RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 30

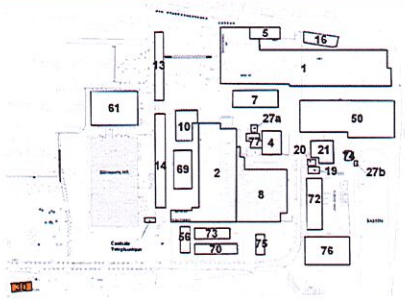


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

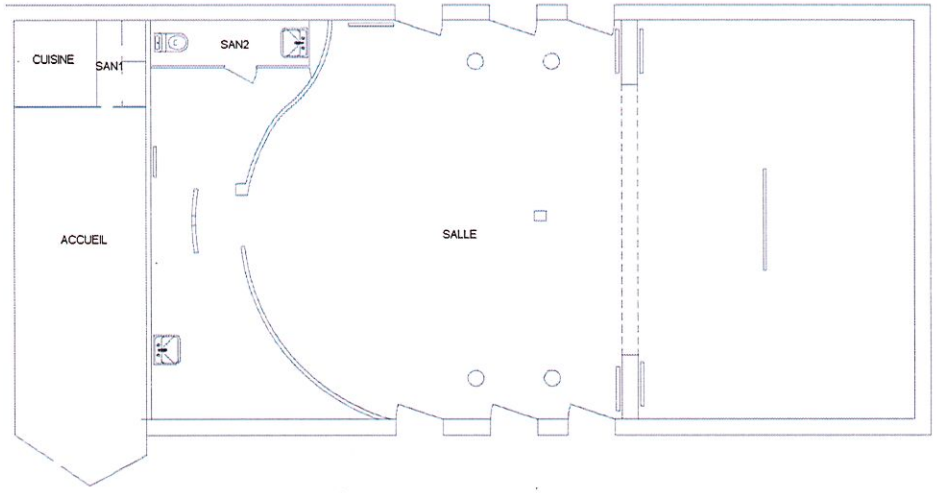


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 50

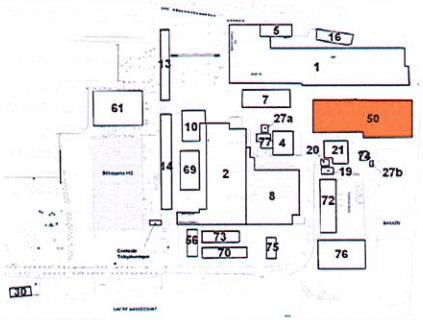


E.P.F. ILE DE FRANCE


Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B



1er ET.

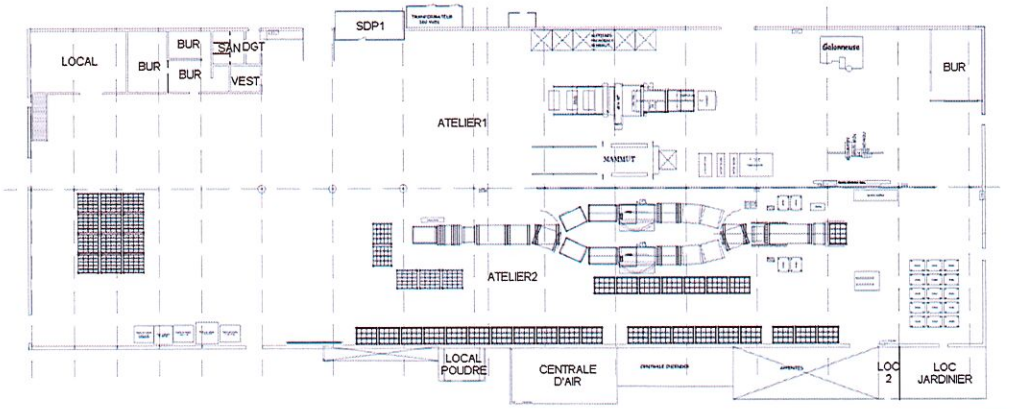

RDC

mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 56

E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

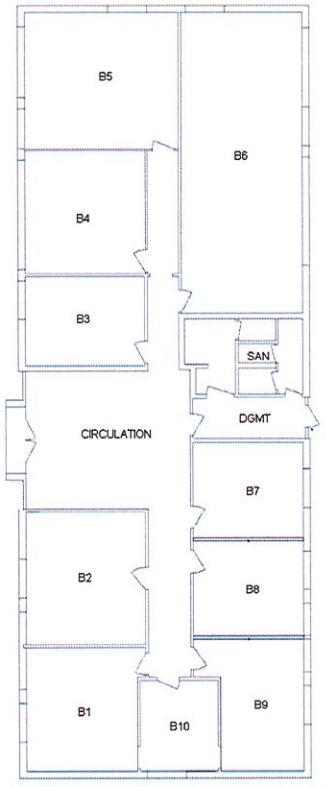

RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE


Site DUNLOPILLO
BAT. 61

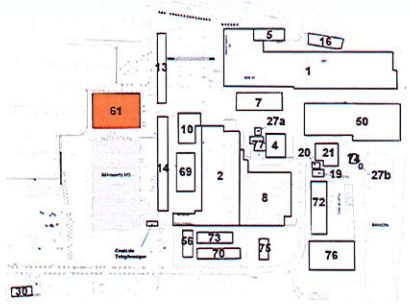



E.P.F. ILE DE FRANCE.


Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

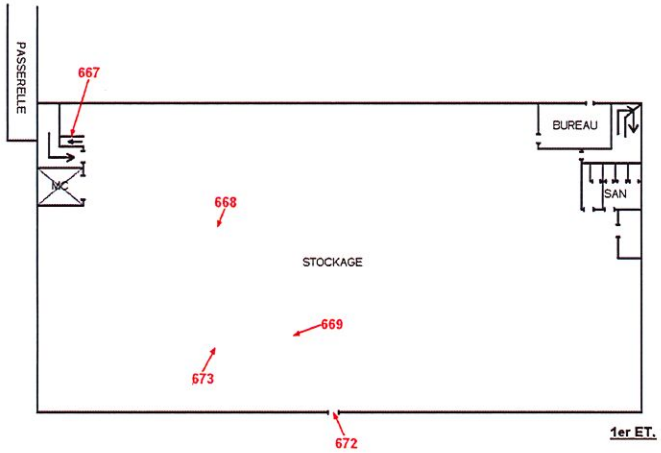





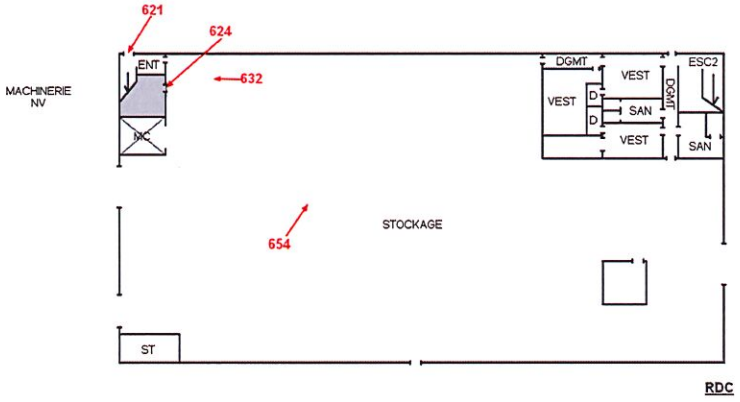


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 69

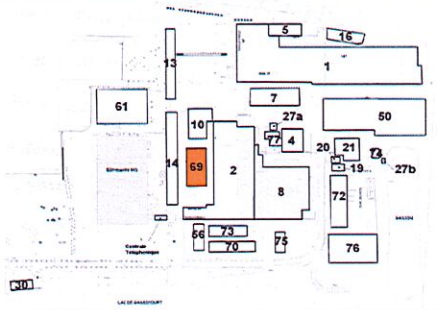


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

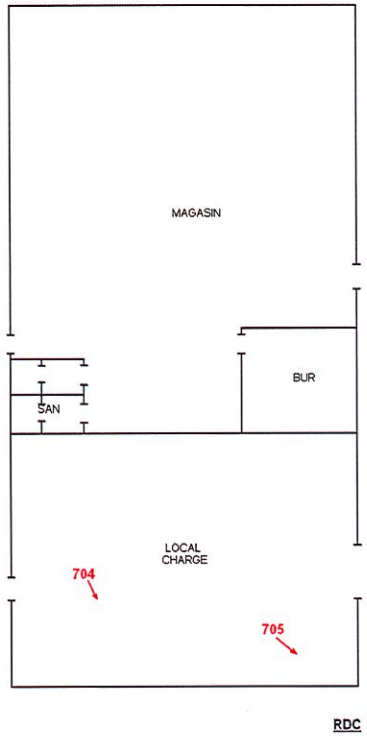

RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 70

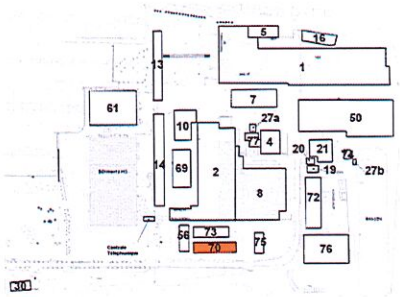


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B



RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 72

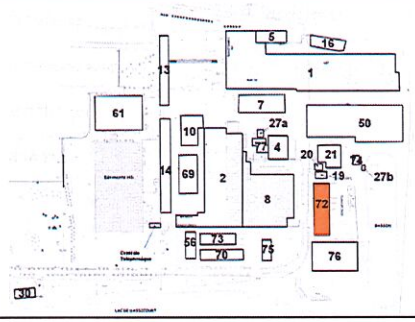


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

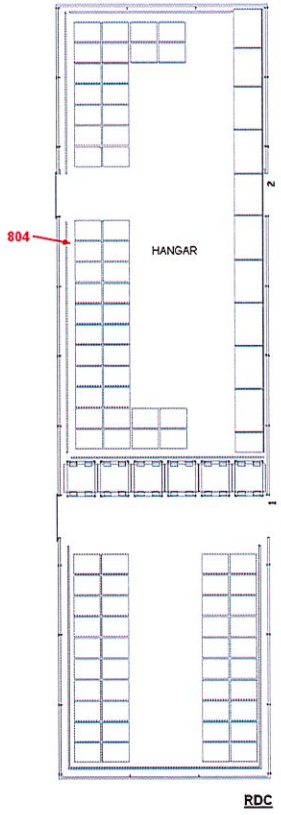


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 73

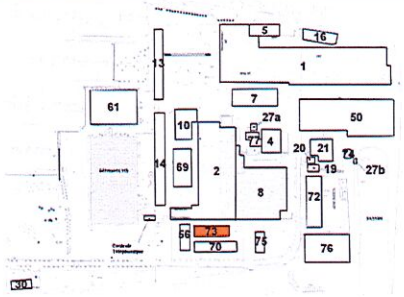


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

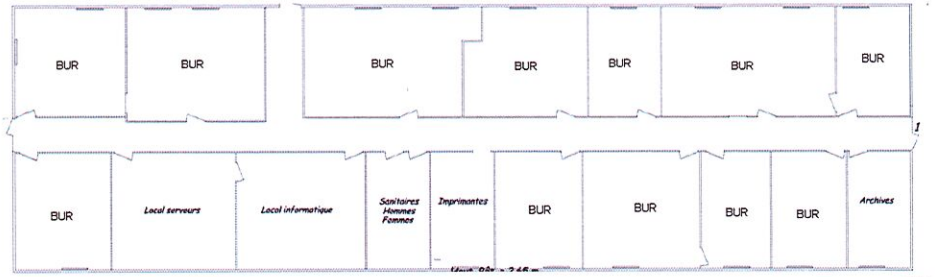

RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 74

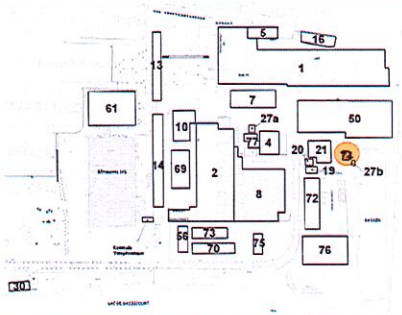


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B



RDC


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 75

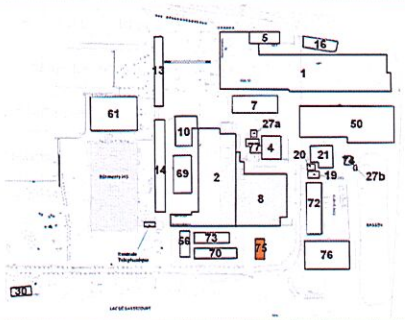


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

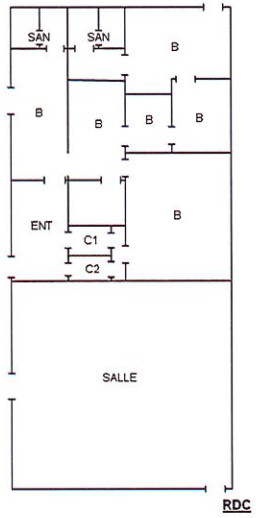


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 76

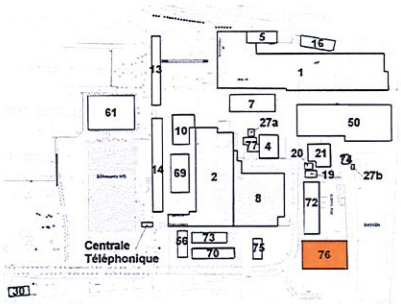


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

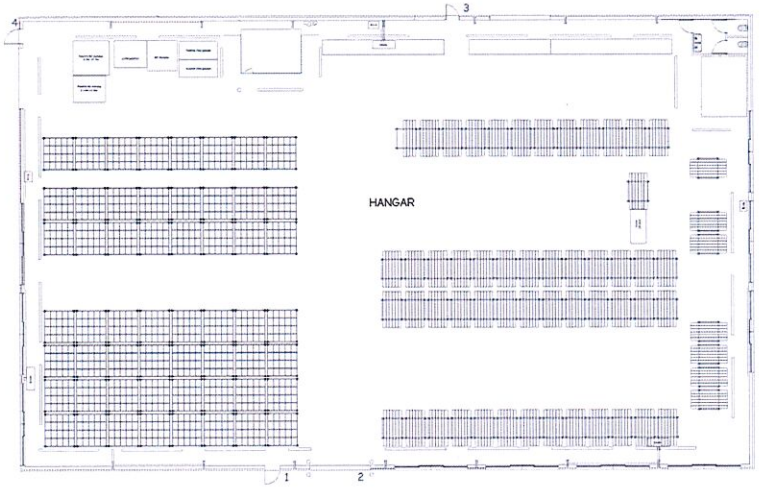


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
BAT. 77

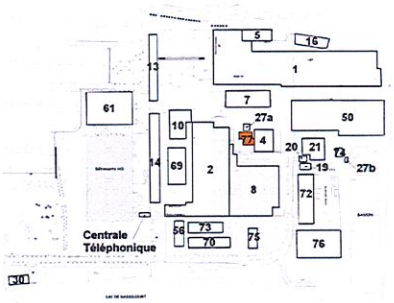


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B

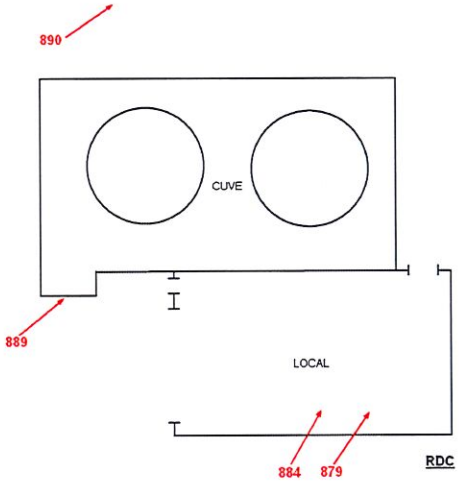


mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

Rapport P442901
du 29/10/2018

MANTES LA JOLIE

Site DUNLOPILLO
Centrale Téléphonique

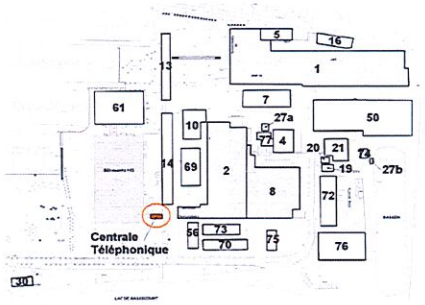


E.P.F. ILE DE FRANCE

Localisation des mesures plombifères

DIAGTIM
34 rue Druelle
59000 LILLE
Tél. : 03 20 88 44 01

H
G(auche) D(roit)
B



mesure plombifère (plb > 1mg/cm²)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

BAT. 1-5
Zone BAT. 1

Mesure 2 : Porte Atelier 1 : RDC	Mesure 9 : Poteaux ronds Atelier 1 : RDC
	

Mesure 10 : Poteaux Atelier 1 : RDC	Mesure 11 : Garde-corps Atelier 1 : RDC
	

Mesure 16 : Garde-corps Atelier 2 : RDC	Mesure 17 : Poteaux ronds Atelier 2 : RDC
	

Mesure 20 : Poteaux Atelier 2 : RDC	Mesure 28 : Garde-corps Atelier 3 : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 29 : Porte Atelier 3 : RDC	Mesure 31 : Rampe Cave UBT : RDC
	

Mesure 32 : Poteaux Cave UBT : RDC	Mesure 33 : Porte Cave UBT : RDC
	

Mesure 35 : Porte Sanitaire : RDC	Mesure 36 : Porte/dégagement Sanitaire : RDC
	

Mesure 50 : Porte/poste technique Stock 5 : RDC	Mesure 51 : Escalier Stock 6 : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 53 : Escalier extérieur Cour : RDC	Mesure 55 : Porte/stock 3 Stock 1 : 1er étage
	

Mesure 61 : Porte/stock 2 Stock 1 : 1er étage	Mesure 62 : Poutre Stock 1 : 1er étage
	

Mesure 68 : Poutre Stock 2 : 1er étage	Mesure 72 : Trappe Stock 3 : 1er étage
	

Mesure 73 : Garde-corps Stock 3 : 1er étage	Mesure 79 : Garde-corps Stock 4 : 1er étage
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 87 : Poteaux colombage Stock 5 : 1er étage	Mesure 96 : Porte/bureau Stock 5 : 1er étage
	

Mesure 97 : Fenêtres/bureau Stock 5 : 1er étage	Mesure 98 : Grille Stock 5 : 1er étage
	

Mesure 99 : Garde-corps Stock 5 : 1er étage	Mesure 141 : Poteaux Hall : 1er étage
	

<u>Zone BAT. 5</u>

Mesure 168 : Escalier Dégagement : RDC	Mesure 183 : Porte Entrée : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 188 : Porte Bureau 1 : RDC	Mesure 194 : Porte Bureau 2 : RDC
	

Mesure 195 : Fenêtre Bureau 2 : RDC	Mesure 196 : Volet Bureau 2 : RDC
	

Mesures 197 à 200 : Murs Sanitaire : RDC	Mesure 202 : Fenêtre Sanitaire : RDC
	

BAT. 2-3-9

Mesure 203 : Poteaux Cave : Sous-sol	Mesure 204 : Escalier Cave : Sous-sol
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 230 : Barrière Stock : RDC	Mesure 231 : Protège tuyau Stock : RDC
	

Mesure 237 : Poteaux Stock : RDC	Mesure 238 : Fenêtre Stock : RDC
	

Mesure 239 : Poteaux Atelier 1 : RDC	Mesure 245 : Grille Atelier 1 : RDC
	

Mesure 246 : Fenêtre Atelier 1 : RDC	Mesure 248 : Barrière Atelier 1 : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 250 : Poteaux Atelier 1 : RDC	Mesure 251 : Poteaux Atelier 2 : RDC
	

Mesure 252 : Bâti/cage escalier Atelier 2 : RDC	Mesure 253 : Garde-corps Atelier 2 : RDC
	

Mesure 254 : Porte/cour Atelier 2 : RDC	Mesure 255 : Porte/sous-sol Atelier 2 : RDC
	

Mesure 256 : Poteaux Atelier 2 : RDC	Mesure 264 : Rampe/1er étage Escalier : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 265 : Poteaux jaunes Latex : RDC	Mesure 276 : Echelle jaune Latex : RDC
	

Mesure 277 : Fenêtre Latex : RDC	Mesure 282 : Poteaux ronds Latex : RDC
	

Mesure 284 : Garde-corps Latex : RDC	Mesure 285 : Rambarde Local 3 : RDC
	

Mesure 286 : Fenêtre Atelier 3 : 1er étage	Mesure 287 : Porte/latex Atelier 3 : 1er étage
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 288 : Fenêtre Salle mélange : 1er étage	Mesure 296 : Ferme Salle mélange : 1er étage
	

Mesure 309 : Porte Stock : 1er étage	Mesure 310 : Garde-corps Stock : 1er étage
	

Mesure 312 : Fenêtre Stock : 1er étage	Mesure 313 : Garde-corps Passerelle : 1er étage
	

Mesure 314 : Escalier Archive : 2ème étage	Mesure 315 : Fenêtre Archive : 2ème étage
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 323 : Garde-corps Terrasse : 3ème étage


BAT. 4

Mesure 328 : Poteaux Stock : RDC	Mesure 329 : Porte Stock : RDC
	

Mesure 331 : Garde-corps Stock : RDC


BAT. 7

Mesure 332 : Fenêtre Laboratoire 1 : RDC


REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

BAT. 8

Mesure 359 : Escalier/rambarde Couture : RDC	Mesure 364 : Fenêtre Couture : RDC
	

Mesure 367 : Sol Couture : RDC	Mesure 368 : Poteaux Couture : RDC
	

Mesure 377 : Poteaux Matelas : RDC	Mesure 378 : Sol Matelas : RDC
	

Mesure 379 : Porte Matelas : RDC	Mesure 380 : Garde-corps Matelas : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 381 : Porte/latex Matelas : RDC	Mesure 383 : Garde-corps Sommier : RDC
	

Mesure 384 : Fenêtre Sommier : RDC	Mesure 394 : Grille Vestiaire : 1er étage
	

Mesure 409 : Ferme Dégagement : 1er étage


BAT. 10-11

Mesure 410 : Rambarde Mezzanine	Mesure 421 : Fenêtre Bureau 4 : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 432 : Porte Douche : RDC	Mesure 444 : Colonne Atelier 2 : RDC
	

Mesure 445 : Poteaux Structure : RDC	Mesure 451 : Grille Stock : RDC
	

Mesure 452 : Escalier Stock : RDC


BAT. 13

Mesure 453 : Porte Fenêtre Bâtiment : RDC	Mesure 467 : Porte Bâtiment : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

BAT. 14

Mesure 468 : Fenêtre Façade : RDC	Mesure 469 : Porte Stock 1 : RDC
	

Mesure 476 : Barrière Stock 2 : RDC	Mesure 481 : Porte Stock 3 : RDC
	

Mesure 482 : Barrière Stock 3 : RDC	Mesure 483 : Porte Stock 4 : RDC
	

Mesure 489 : Porte Stock 5 : RDC	Mesure 491 : Porte Sanitaire : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES


BAT. 16

Mesure 492 : Porte Hangar : RDC


BAT. 21

Mesure 520 : Poteaux jaunes Chaufferie : 1er étage	Mesure 521 : Poteaux Chaufferie : 1er étage
	

Mesure 522 : Conduite Chaufferie : 1er étage	Mesure 525 : Porte Chaufferie : 1er étage
	

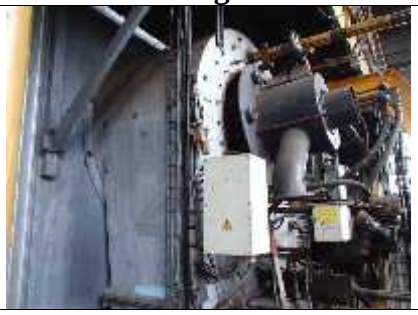Mesure 526 : Chaudière Chaufferie : 1er étage	Mesure 527 : Porte Chaufferie : 1er étage
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 532 : Escalier Chaufferie : 1er étage	Mesure 533 : Fenêtre Chaufferie : 1er étage
	

Mesure 534 : Garde-corps Chaufferie : 1er étage	Mesure 543 : Cuve Déminéralisation : 1er étage
	

Mesure 544 : Garde-corps Déminéralisation : 1er étage


BAT. 61

Mesure 621 : Porte/cour Entrée : RDC	Mesure 624 : Porte/machinerie asc Stockage : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 632 : Garde-corps Stockage : RDC	Mesure 654 : Poteaux jaunes Escalier 2 : RDC
	

Mesure 667 : Escalier Stockage : 1er étage	Mesure 668 : Poteaux Stockage : 1er étage
	

Mesure 669 : Garde-corps Stockage : 1er étage	Mesure 672 : Porte Stockage : 1er étage
	

Mesure 673 : Sol Stockage : 1er étage


DIAGTIM

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

BAT. 69

Mesure 704 : Pied de poteau Local charge : RDC	Mesure 705 : Barrière Local charge : RDC
	

BAT. 72

Mesure 804 : Barrière Hangar : RDC


BAT. 77

Mesure 879 : Poteaux jaunes Local : RDC	Mesure 884 : Echelle Local : RDC
	

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
EXEMPLES REPRESENTATIFS D'ELEMENTS PLOMBIFERES RELEVES

Mesure 889 : Garde-corps Extérieur : RDC	Mesure 890 : Poteaux bleus Extérieur : RDC
	

CENTRALE TELEPHONIQUE

Mesure 892 : Porte Centrale Téléphonique : RDC
