ENVIRONNEMENT

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX183871
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 24/02/2026
Reférence mandataire : ER098557

DÉSIGNATION DU BIEN

Tribunal d'Instance
45 Rue du Grand Chemin
59100 ROUBAIX

PROPRIÉTAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX183871
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 24/02/2026
Reférence mandataire : ER098557

DÉSIGNATION DU BIEN

Tribunal d'Instance
45 Rue du Grand Chemin
59100 ROUBAIX

PROPRIÉTAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. — Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 45 Rue du Grand Chemin 59100 ROUBAIX

Référence client : ER098557

Désignation : Tribunal d'Instance

Date de construction : En 2022

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MAJD Khalid

Accompagnateur : ()

Date de repérage 24/02/2026

Numéro attestation : CPDI5529

Délivré le : 16/12/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 24/03/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 24/03/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)
Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)
Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)
Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- travaux de réfection des façades et de la cour et du remplacement des menuiseries
- Rempkacement des pavé

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- travaux de réfection des façades et remplacement des menuiseries
- Rempkacement des pavé (Cour)

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1) - Vol 2 (Façade 2) - Vol 3 (Façade 3) - Vol 4 (Façade 4) - Vol 5 (Façade 5) - Vol 6 (Façade 6)	
Revêtement de sol	Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1) - Vol 4 (Façade 4) - Vol 7 (Vue de dessus)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Aucunes

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 18387 1 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Joint de scellement	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°2 - 1	P2	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Pierre Ancienne	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Pierre Ancienne	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 18387 1 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Pierre Ancienne	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 18387 1 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Pierre Ancienne	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 18387 1 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Pierre Ancienne	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 18387 1 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 2 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 2 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 18387 1 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Menuiseries	Joint à lèvre	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°5 - 1	P5	Mousse jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Menuiseries	Joint à lèvre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX 18387 1 n°5 - 1	P5	Mousse jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélevement	Briques	002EX 18387 1 n°6 - 1	P6	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Murs	Pierre Ancienne	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°7 - 1	P7	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Murs	Pierre Ancienne	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 18387 1 n°7 - 1	P7	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Murs	Pierre Ancienne	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 18387 1 n°7 - 1	P7	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Murs	Pierre Ancienne	S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 18387 1 n°7 - 1	P7	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°8 - 1	P8	Mousse jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 18387 1 n°8 - 1	P8	Mousse jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 18387 1 n°8 - 1	P8	Mousse jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 18387 1 n°8 - 1	P8	Mousse jaune avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX 18387 1 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 6 (Façade 6)	Menuiseries	Joint à lèvre	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 6 (Façade 6)	Menuiseries	Joint à lèvre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX 18387 1 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Joint de scellement	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°11 - 1	P11	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Pierre Ancienne	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Appui de fenêtre	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Appui de fenêtre	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 18387 1 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Appui de fenêtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 18387 1 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Appui de fenêtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 18387 1 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Appui de fenêtre	P13 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 18387 1 n°13 - 1	P13	Matériau compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Murs	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélevement	Pierre ancienne	002EX 18387 1 n°14 - 1	P14	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Escalier	Enduit ciments	P15	Réalisation d'un prélevement	Pierre ancienne	002EX 18387 1 n°15 - 1	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 5 (Façade 5)	Escalier	Enduit ciments	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pierre ancienne	002EX 18387 1 n°15 - 1	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°17 - 1	P17	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Murs de soubassement	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°18 - 1	P18	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 6 (Façade 6)	Murs de soubassement	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°19 - 1	P19	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs de soubassement	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 3 (Façade 3)	Murs de soubassement	Enduit ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 18387 1 n°20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Murs	Poteaux	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°21 - 1	P21	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Murs	Poteaux	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 18387 1 n°21 - 1	P21	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 6 (Façade 6)	Murs	Pierre Ancienne	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°24 - 1	P24	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Murs	Pierre Ancienne	P25	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°25 - 1	P25	Matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 6 (Façade 6)	Murs	Joint de scellement	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°28 - 1	P28	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P29	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°29 - 1	P29	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 6 (Façade 6)	Escalier	Enduit ciments	P30	Réalisation d'un prélevement	Pierre ancienne	002EX 18387 1 n°30 - 1	P30	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades palais de justice	Vol 7 (Vue de dessus)	Revêtement de sol	Joint de pavé	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°22 - 1	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 7 (Vue de dessus)	Revêtement de sol	Joint de pavé	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°23 - 1	P23	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 4 (Façade 4)	Revêtement de sol	Seuil de porte	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX 18387 1 n°26 - 1	P26	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades palais de justice	Vol 1 (Façade 1)	Revêtement de sol	Seuil de porte	P27	Réalisation d'un prélevement			P27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Façades palais de justice	Façades palais de justice - Plan de repérage - Actions menées

FAÇADES PALAIS DE JUSTICE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX183871

Vol 6
(Façade 6)

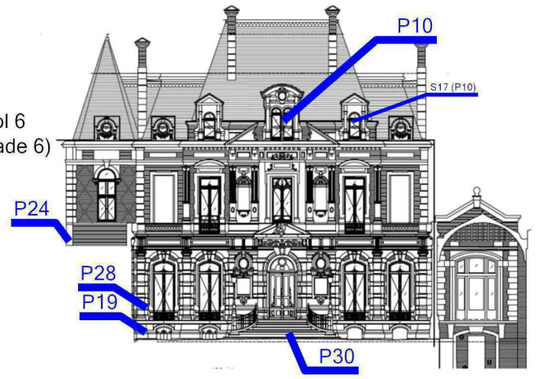


Façade hôtel coté cour

Vol 5
(Façade 5)

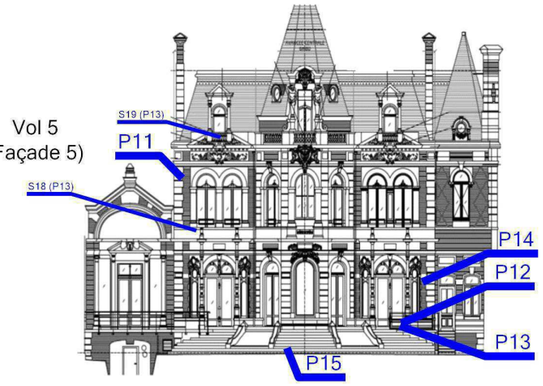


Façade jardin


Vol 1
(Façade 1)

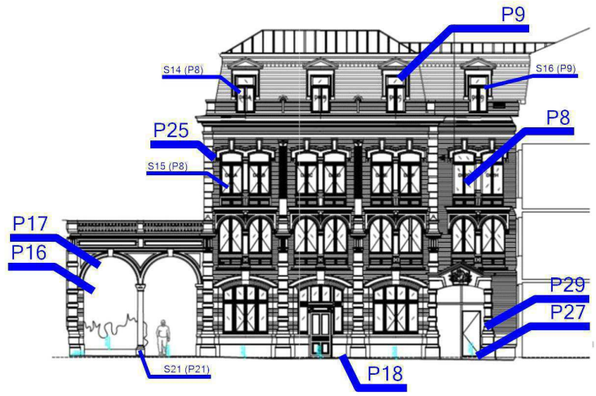

Façade aile droite

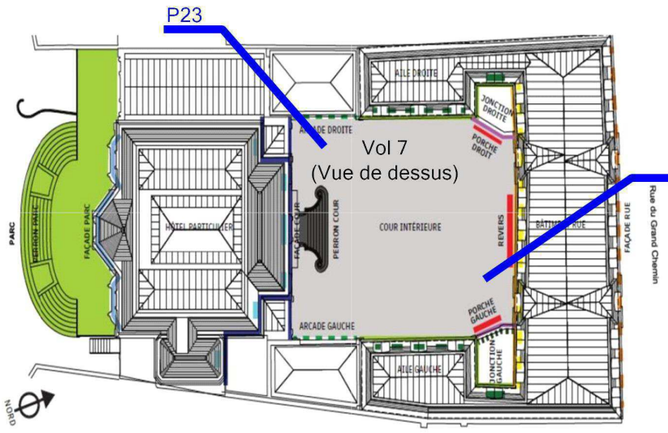



Vol 4
(Façade 4)

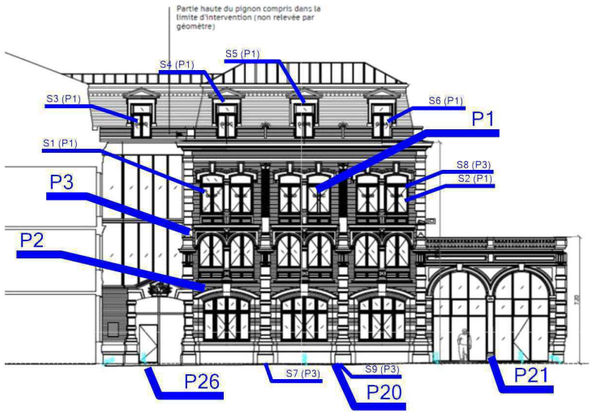

Façade aile gauche

Façade rue

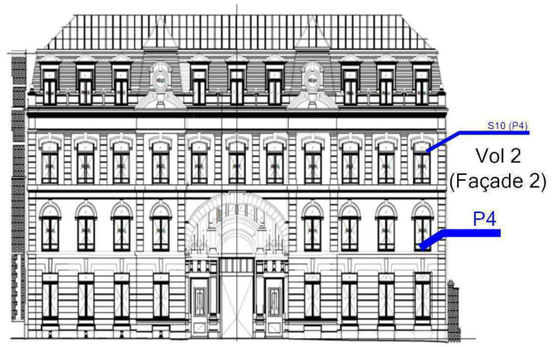

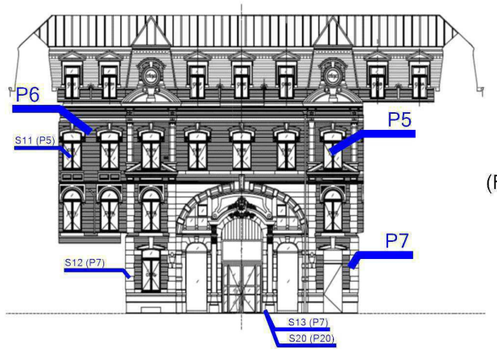

Vol 3
(Façade 3)

façade coté cour

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 Rue du Grand Chemin 59100 ROUBAIX	Tribunal dInstance	24/02/2026	MAJD Khalid

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX183871 n°1 - 1 (P1)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EX183871 n°2 - 1 (P2)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EX183871 n°3 - 1 (P3)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EX183871 n°4 - 1 (P4)	Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EX183871 n°5 - 1 (P5)	Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	Prélevement négatif
002EX183871 n°6 - 1 (P6)	Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	Prélevement négatif
002EX183871 n°7 - 1 (P7)	Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	Prélevement négatif
002EX183871 n°8 - 1 (P8)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°9 - 1 (P9)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°10 - 1 (P10)	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)	Prélevement négatif
002EX183871 n°11 - 1 (P11)	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	Prélevement négatif
002EX183871 n°12 - 1 (P12)	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	Prélevement négatif
002EX183871 n°13 - 1 (P13)	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	Prélevement négatif
002EX183871 n°14 - 1 (P14)	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	Prélevement négatif
002EX183871 n°15 - 1 (P15)	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	Prélevement négatif
002EX183871 n°16 - 1 (P16)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°17 - 1 (P17)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°18 - 1 (P18)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°19 - 1 (P19)	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)	Prélevement négatif
002EX183871 n°20 - 1 (P20)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EX183871 n°21 - 1 (P21)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EX183871 n°22 - 1 (P22)	Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)	Prélevement négatif
002EX183871 n°23 - 1 (P23)	Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)	Prélevement négatif
002EX183871 n°24 - 1 (P24)	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)	Prélevement négatif
002EX183871 n°25 - 1 (P25)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°26 - 1 (P26)	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	Prélevement négatif
002EX183871 n°28 - 1 (P28)	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)	Prélevement négatif

002EX183871 n°29 - 1 (P29)	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	Prélevement négatif
002EX183871 n°30 - 1 (P30)	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)	Prélevement négatif



002EX183871 n°1 - 1 (P1) - Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)



002EX183871 n°2 - 1 (P2) - Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)



002EX183871 n°3 - 1 (P3) - Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)



002EX183871 n°4 - 1 (P4) - Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)



002EX183871 n°5 - 1 (P5) - Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)



002EX183871 n°6 - 1 (P6) - Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)



002EX183871 n°7 - 1 (P7) - Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)



002EX183871 n°8 - 1 (P8) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°9 - 1 (P9) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°10 - 1 (P10) - Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)



002EX183871 n°11 - 1 (P11) - Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)



002EX183871 n°12 - 1 (P12) - Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)



002EX183871 n°13 - 1 (P13) - Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)



002EX183871 n°14 - 1 (P14) - Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)



002EX183871 n°15 - 1 (P15) - Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)



002EX183871 n°16 - 1 (P16) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°17 - 1 (P17) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°18 - 1 (P18) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°19 - 1 (P19) - Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)



002EX183871 n°20 - 1 (P20) - Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)



002EX183871 n°21 - 1 (P21) - Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)



002EX183871 n°22 - 1 (P22) - Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)



002EX183871 n°23 - 1 (P23) - Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)



002EX183871 n°24 - 1 (P24) - Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)



002EX183871 n°25 - 1 (P25) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°26 - 1 (P26) - Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)



002EX183871 n°28 - 1 (P28) - Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)



002EX183871 n°29 - 1 (P29) - Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)



002EX183871 n°30 - 1 (P30) - Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	
P2	Façades	Murs	Matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	
P3	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)	
P4	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)	
P5	Façades	Menuiseries	Mousse jaune avec couche en toile	Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	
P6	Façades	Murs	Matériau gris en vrac - Briques	Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	
P7	Façades	Murs	Matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)	
P8	Façades	Menuiseries	Mousse jaune avec couche en toile	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	
P9	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	
P10	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple incolore	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)	
P11	Façades	Murs	Matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	
P12	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact gris	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	
P13	Façades	Murs	Matériau compact gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	
P14	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau gris en vrac - Pierre ancienne	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	
P15	Façades	Escalier	Matériau compact gris hétérogène - Pierre ancienne	Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)	
P16	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)	

P17	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)
P18	Façades	Murs de soubassement	Peinture non séparable + matériau compact gris	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)
P19	Façades	Murs de soubassement	Peinture non séparable + matériau compact gris	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)
P20	Façades	Murs de soubassement	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)
P21	Façades	Murs	Matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)
P24	Façades	Murs	Matériau blanc en vrac	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)
P25	Façades	Murs	Matériau beige en vrac	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)
P28	Façades	Murs	Matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)
P29	Façades	Murs	Matériau gris en vrac	Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)
P30	Façades	Escalier	Matériau compact gris - Pierre ancienne	Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT1526-1314
		Réf. Commande Client :	002EX183871

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871001 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4 (Façade 4)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8480 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871002 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 4 (Façade 4)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8481 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871003 / Façades / Murs / Pierre Ancienne / Vol 4 (Façade 4)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8482 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871004 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (Façade 2)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8483 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871005 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 3 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8484 Description ITGA : Mousse jaune avec couche en toile	
Mousse jaune avec couche en toile	META (B) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871006 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 3 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8485 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871007 / Façades / Murs / Pierre Ancienne / Vol 3 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8486 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871008 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8487 Description ITGA : Mousse jaune avec couche en toile	
Mousse jaune avec couche en toile	META (B) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871009 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8488 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871010 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 6 (Façade 6)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8489 Description ITGA : Peinture / Matériau souple incolore	
Peinture non séparable + Matériau souple incolore (1)	META (B) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871011 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 5 (Façade 5)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8490 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871012 / Façades / Murs / Pierre Ancienne / Vol 5 (Façade 5)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8491 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871013 / Façades / Murs / Appui de fenêtre / Vol 5 (Façade 5)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8492 Description ITGA : Matériau compact gris en vrac	
▸ Matériau compact gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871014 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 5 (Façade 5)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8493 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871015 / Façades / Escalier / Enduit ciments / Vol 5 (Façade 5)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8494 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871016 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8495 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871017 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8496 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871018 / Façades / Murs de soubassement / Enduit ciment / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8497 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871019 / Façades / Murs de soubassement / Enduit ciment / Vol 6 (Façade 6)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8498 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871020 / Façades / Murs de soubassement / Enduit ciment / Vol 4 (Façade 4)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8499 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871021 / Façades / Murs / Poteaux / Vol 4 (Façade 4)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8500 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de pavé / Vol 7 (Vue de dessus)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8501 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de pavé / Vol 7 (Vue de dessus)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8502 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871024 / Façades / Murs / Pierre Ancienne / Vol 6 (Façade 6)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8503 Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
Matériau blanc en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871025 / Façades / Murs / Pierre Ancienne / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8504 Description ITGA : Matériau beige en vrac	
Matériau beige en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Seuil de porte / Vol 4 (Façade 4)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8505 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Seuil de porte / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8506 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1526-1314 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871028 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 6 (Façade 6)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8507 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871029 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 1 (Façade 1)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8508 Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ER098557 45 Rue du Grand Chemin - 59100 ROUBAIX Tribunal d'Instance Réf échantillon client : 002EX183871030 / Façades / Escalier / Enduit ciments / Vol 6 (Façade 6)		Réf échantillon ITGA : IT152603-8509 Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris	META (A) le 24/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	45 Rue du Grand Chemin 59100 ROUBAIX
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	ER098557
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Tribunal d'Instance
Date de construction ou permis de construire :	En 2022
Fonction du bâtiment :	ERP

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1115)
Date de chargement de la source :	08/11/2022
Nature radionucléide :	Non communiqué
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	08/11/2026
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	24/02/2026
Date du rapport :	24/02/2026
Référence mission :	002EX183871
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MAJD Khalid
Certification n° :	CPDI5529
Délivré le	26/06/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Façades palais de justice : Vol 1 (Façade 1)	Façades palais de justice : Vol 2 (Façade 2)
Façades palais de justice : Vol 3 (Façade 3)	Façades palais de justice : Vol 4 (Façade 4)
Façades palais de justice : Vol 5 (Façade 5)	Façades palais de justice : Vol 6 (Façade 6)
Façades palais de justice : Vol 7 (Vue de dessus)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1,3	Valeur étalonnage	1,6	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
213	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
216	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
217	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
226	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
227	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Bas Centre	Autre	Autre	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
235	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
236	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
237	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Haut Centre	Autre	Autre	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
246	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
247	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Centre Droite	Autre	Autre	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
256	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
257	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
258	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Haut Gauche	Autre	Autre	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
266	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
267	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Bas Gauche	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
276	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
277	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
281	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Bas Gauche	Autre	Autre	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
286	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
287	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Haut Droite	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
296	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
297	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Centre Droite	Autre	Autre	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
304	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
306	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
307	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
316	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
317	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Centre Centre	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Centre Gauche	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
326	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
327	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Haut Droite	Autre	Autre	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Centre Droite	Autre	Autre	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
336	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
337	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe13	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe13	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
346	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
347	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 1 (Façade 1)					
350	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe14	Bas Gauche	Autre	Autre	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe14	Bas Centre	Autre	Autre	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
356	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
357	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe15	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe15	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	A	Mur brique brut -Mur1	Haut Centre	Brique	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
992	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
363	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
366	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
367	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
376	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
377	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Bas Centre	Autre	Autre	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
386	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
387	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
390	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Autre	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Autre	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
396	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
397	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Haut Droite	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
406	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
407	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Bas Centre	Autre	Autre	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
413	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
416	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
417	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Bas Droite	Autre	Autre	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
426	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
427	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Centre Centre	Autre	Autre	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Bas Centre	Autre	Autre	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
436	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
437	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Centre Centre	Autre	Autre	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
446	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
447	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
456	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
457	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
459	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Centre	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
466	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
467	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Haut Gauche	Autre	Autre	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
476	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
477	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Bas Droite	Autre	Autre	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
482	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
486	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
487	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe13	Haut Gauche	Autre	Autre	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe13	Haut Droite	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
496	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
497	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe14	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe14	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
505	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
506	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
507	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe15	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe15	Haut Droite	Autre	Autre	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe16	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
516	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe16	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
517	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe16	Haut Centre	Autre	Autre	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe16	Centre Droite	Autre	Autre	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe17	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
526	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe17	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
527	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
528	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe17	Bas Gauche	Autre	Autre	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe17	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe18	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
536	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe18	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
537	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe18	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe18	Haut Centre	Autre	Autre	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe19	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
546	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe19	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
547	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
551	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe19	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe19	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe20	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
556	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe20	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
557	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe20	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe20	Bas Centre	Autre	Autre	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe21	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
566	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe21	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
567	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe21	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe21	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
574	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe22	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
576	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe22	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
577	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe22	Bas Centre	Autre	Autre	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe22	Bas Droite	Autre	Autre	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe23	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
586	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe23	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
587	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe23	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe23	Haut Gauche	Autre	Autre	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe24	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
596	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe24	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
597	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe24	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe24	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe25	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
606	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe25	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
607	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Haut Centre	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Bas Centre	Bois	Peinture	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe25	Haut Centre	Autre	Autre	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe25	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe26	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
616	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe26	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
617	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
620	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe26	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe26	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe27	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
626	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe27	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
627	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe27	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe27	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe28	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
636	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe28	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
637	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe28	Centre Centre	Autre	Autre	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe28	Haut Gauche	Autre	Autre	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
643	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe29	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
646	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe29	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
647	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe29	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe29	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe30	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
656	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe30	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
657	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe30	Haut Centre	Autre	Autre	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe30	Haut Droite	Autre	Autre	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe31	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
666	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe31	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
667	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe31	Bas Centre	Autre	Autre	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe31	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe32	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
676	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe32	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
677	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe32	Haut Droite	Autre	Autre	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe32	Haut Droite	Autre	Autre	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe33	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
686	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe33	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
687	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 2 (Façade 2)					
689	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe33	Bas Gauche	Autre	Autre	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe33	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe34	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
696	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe34	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
697	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe34	Bas Droite	Autre	Autre	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe34	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	A	Mur brique brut -Mur1	Centre Gauche	Brique	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
993	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 70

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
703	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
706	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
707	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
716	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
717	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
726	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
727	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
729	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
736	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
737	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Autre	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
746	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
747	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
752	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
756	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
757	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Haut Gauche	Autre	Autre	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
766	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
767	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Haut Centre	Autre	Autre	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Haut Droite	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
775	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
776	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
777	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
786	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
787	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Haut Gauche	Autre	Autre	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
796	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
797	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
798	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Gauche	Autre	Autre	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Haut Centre	Autre	Autre	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
806	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
807	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
816	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
817	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
821	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
826	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
827	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe13	Centre Droite	Autre	Autre	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe13	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
836	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
837	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe14	Haut Centre	Autre	Autre	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe14	Centre Droite	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
844	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
846	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
847	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe15	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe15	Centre Centre	Autre	Autre	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe16	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
856	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe16	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
857	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe16	Haut Gauche	Autre	Autre	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe16	Bas Centre	Autre	Autre	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe17	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
866	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe17	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 3 (Façade 3)					
867	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe17	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe17	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe18	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
876	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe18	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
877	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe18	Haut Centre	Autre	Autre	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe18	Centre Centre	Autre	Autre	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	A	Mur brique brut -Mur1	Haut Droite	Brique	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
994	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)					
883	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)					
884	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
886	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
887	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
896	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
897	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
906	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)					
907	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Bas Droite	Autre	Autre	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
916	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
917	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Centre Droite	Autre	Autre	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Autre	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
926	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
927	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)					
930	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Centre Droite	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Centre Droite	Autre	Autre	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
936	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
937	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Haut Droite	Autre	Autre	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
946	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
947	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Haut Centre	Autre	Autre	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)					
953	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
956	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
957	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Centre Droite	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
966	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
967	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Centre Droite	Autre	Autre	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Centre Droite	Autre	Autre	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 4 (Façade 4)					
976	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
977	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Centre	Autre	Autre	0,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Centre Gauche	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	A	Mur brique brut -Mur1	Haut Gauche	Brique	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
991	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)					
123	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
126	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
127	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)					
133	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
136	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
137	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
146	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
147	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)					
156	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
157	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
166	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
167	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Autre	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
176	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
177	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)					
179	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Haut Gauche	Autre	Autre	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
186	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
187	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Centre Centre	Autre	Autre	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
196	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
197	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Centre Centre	Autre	Autre	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 5 (Façade 5)					
202	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
206	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
207	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Centre Droite	Autre	Autre	0,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Haut Droite	Autre	Autre	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	A	Mur brique brut -Mur1	Centre Gauche	Brique	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
990	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1001	A	Escalier droit bois brut (Main courante)-Escalier1	Bas Gauche	Bois	Vernis	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	A	Escalier droit bois brut (Main courante)-Escalier1	Bas Droite	Bois	Vernis	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Escalier droit bois brut (Ensemble des contres marches)-Escalier1	Bas Centre	Bois	Vernis	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Escalier droit bois brut (Ensemble des contres marches)-Escalier1	Centre Droite	Bois	Vernis	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Escalier droit bois brut (Limon)-Escalier1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	A	Escalier droit bois brut (Limon)-Escalier1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)					
3	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
6	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
7	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
16	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe2	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
17	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe2	Bas Droite	Autre	Autre	0,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)					
26	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
27	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Autre	0,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe3	Centre Droite	Autre	Autre	0,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
36	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
37	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe4	Bas Droite	Autre	Autre	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
46	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe5	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
47	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)					
49	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Autre	0,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
56	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe6	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
57	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Haut Droite	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe6	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
66	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe7	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
67	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Centre Gauche	Autre	Autre	0,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)					
72	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe7	Haut Centre	Autre	Autre	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
76	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe8	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
77	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe8	Haut Droite	Autre	Autre	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
86	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
87	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Bas Centre	Autre	Autre	0,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe9	Haut Gauche	Autre	Autre	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)					
95	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
96	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
97	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Gauche	Autre	Autre	0,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe10	Bas Droite	Autre	Autre	0,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
106	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
107	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Bas Gauche	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe11	Bas Droite	Autre	Autre	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
116	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
117	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 6 (Façade 6)					
118	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Haut Gauche	Autre	Autre	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant exterieur)-Fe12	Haut Centre	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Mur brique brut -Mur1	Bas Centre	Brique	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
989	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
995	A	Escalier droit bois brut (Main courante)-Escalier1	Centre Centre	Bois	Vernis	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	A	Escalier droit bois brut (Main courante)-Escalier1	Centre Centre	Bois	Vernis	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	A	Escalier droit bois brut (Ensemble des contres marches)-Escalier1	Bas Gauche	Bois	Vernis	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	A	Escalier droit bois brut (Ensemble des contres marches)-Escalier1	Centre Droite	Bois	Vernis	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	A	Escalier droit bois brut (Limon)-Escalier1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	A	Escalier droit bois brut (Limon)-Escalier1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades palais de justice - Vol 7 (Vue de dessus)					
1007	A	Lanterneau (Lanterneau)-Lant1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	A	Lanterneau (Lanterneau)-Lant1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	A	Lanterneau (Lanterneau)-Lant2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	A	Lanterneau (Lanterneau)-Lant2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement









Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

FAÇADES PALAIS DE JUSTICE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX183871


Légende

Vol 1
(Façade 1)




Façade aile droite

Façade rue

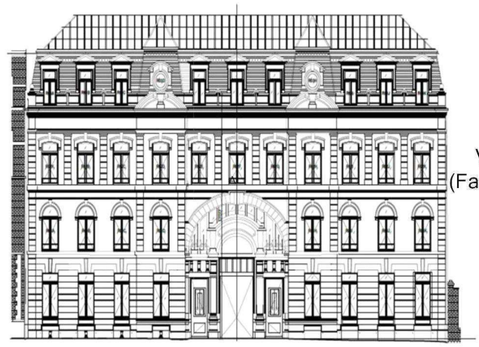


Vol 2
(Façade 2)

Vol 6
(Façade 6)

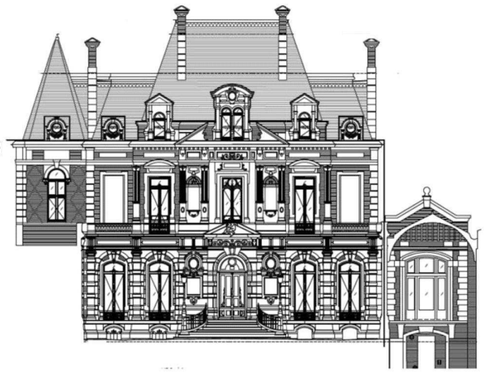

Façade hôtel coté cour

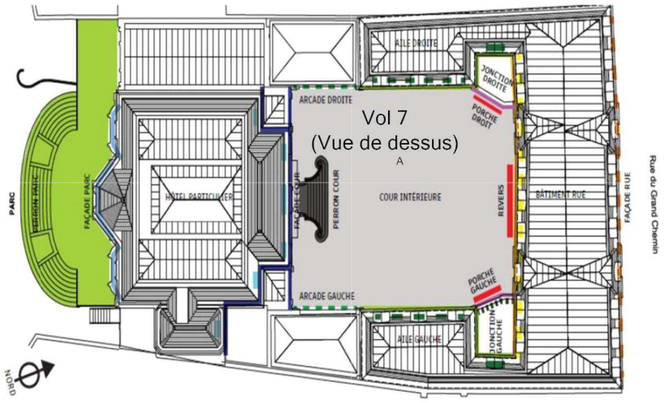


Vol 5
(Façade 5)




Façade jardin

Vol 3
(Façade 3)

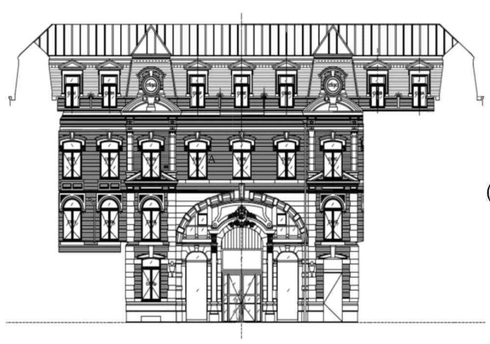

façade coté cour

Vol 4
(Façade 4)

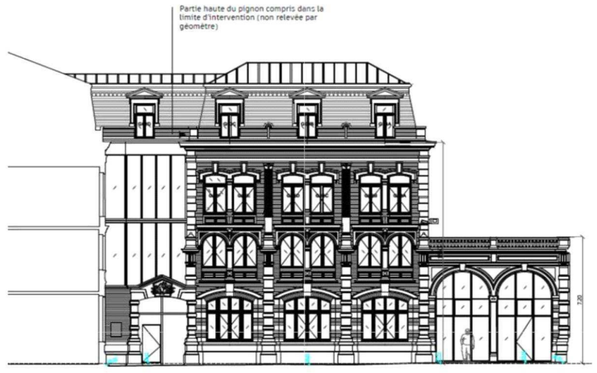


Façade aile gauche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 Rue du Grand Chemin 59100 ROUBAIX	Tribunal dInstance	24/02/2026	MAJD Khalid


FAÇADES PALAIS DE JUSTICE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX183871

Vol 6
(Façade 6)

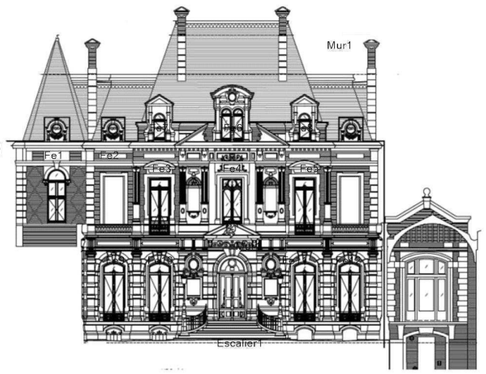


Façade hôtel coté cour

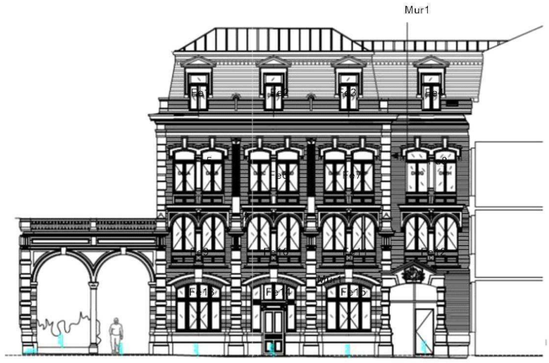


Vol 1
(Façade 1)

Façade aile droite

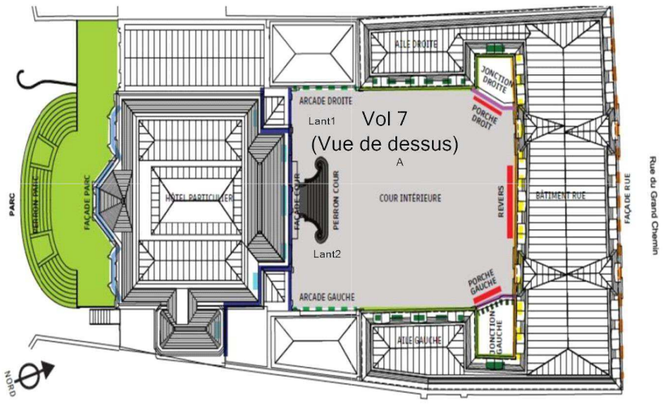


Façade rue

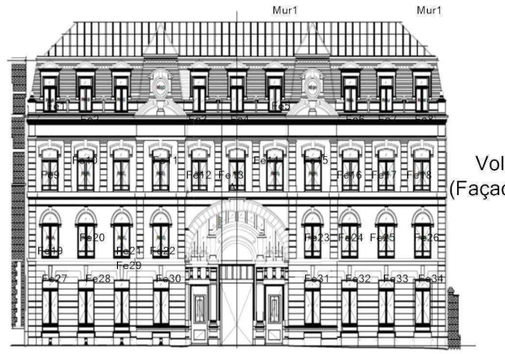


Vol 2
(Façade 2)

Vol 5
(Façade 5)

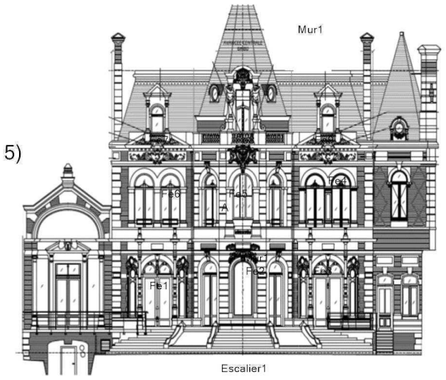


Façade jardin

Vol 4
(Façade 4)

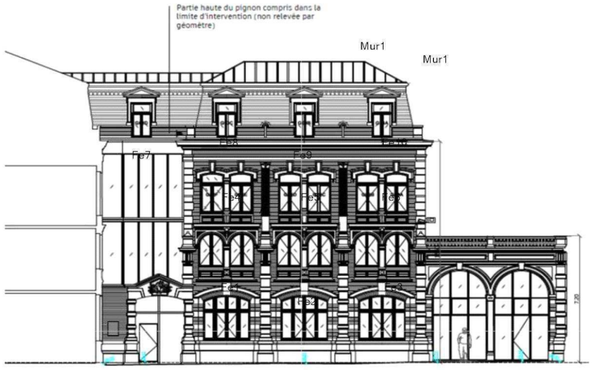

Façade aile gauche

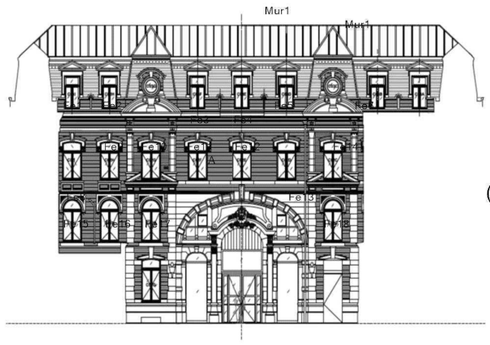

façade coté cour

Vol 3
(Façade 3)


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 Rue du Grand Chemin 59100 ROUBAIX	Tribunal dInstance	24/02/2026	MAJD Khalid

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

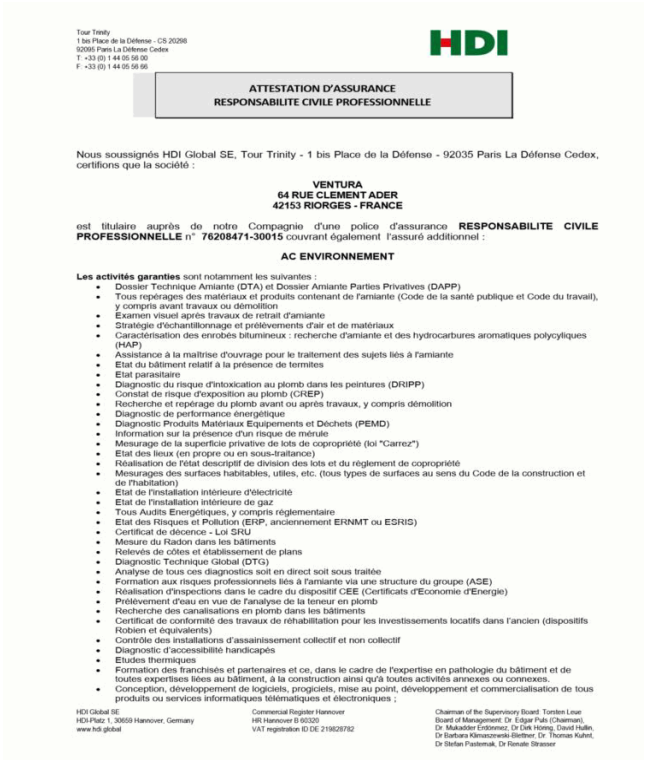

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

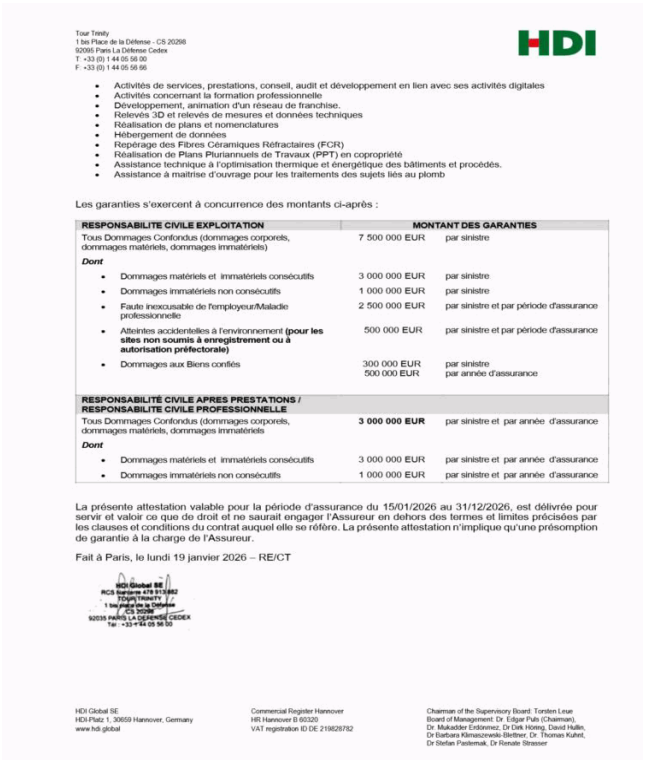

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5529



Immobilier

Certificat de compétences
Diagnostiqueur

N° CPDI5529 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAJD Khalid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/12/2024 - Date d'expiration : 15/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/12/2024 - Date d'expiration : 15/12/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 26/06/2023 - Date d'expiration : 25/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 20/12/2024.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5529



Certificat de compétences
Diagnostiqueur

Immobilier

N° CPDI5529 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAJD Khalid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/12/2024 - Date d'expiration : 15/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/12/2024 - Date d'expiration : 15/12/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 26/06/2023 - Date d'expiration : 25/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 20/12/2024.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19
