
RBX TP2 / Planning

04/09/2026

	Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Organisation du chantier.																								
Préparation de chantier 1 mois																								
- ENSEMBLE 1 / Interventions ponctuelles en façade rue du BATIMENT RUE > 4 mois																								
	Lot concerné : 2																							
- ENSEMBLE 2 / Façade sur cour d'honneur du BATIMENT RUE (REVERS) > 10 mois																								
	Lots concernés : 1+2+3																							
- ENSEMBLE 3 / Façades sur cour d'honneur des AILES. > 10 mois																								
	Lots concernés : 1+2+3																							
- ENSEMBLE 4 / HOTEL PARTICULIER																								
Restauration des maçonneries de la façade sur cour d'honneur > 5 mois																								
	Lots concernés : 1+2+3																							
Restauration des parties hautes de la façade sur parc > 6 mois																								
	Lot concerné : 1																							
Réfection PERRON ARRIÈRE > 1 mois																								
	Lot concerné : 1																							
- ENSEMBLE 5/ Réfection de la cour d'honneur > 4 mois en 3 zones successives :																								
	- Zone 1 centrale,																							
	- Zone 2 gauche en maintenant un accès pmr provisoire,																							
	- Zone 3 droite en maintenant un accès logement provisoire.																							
	Lot concerné : 4																							

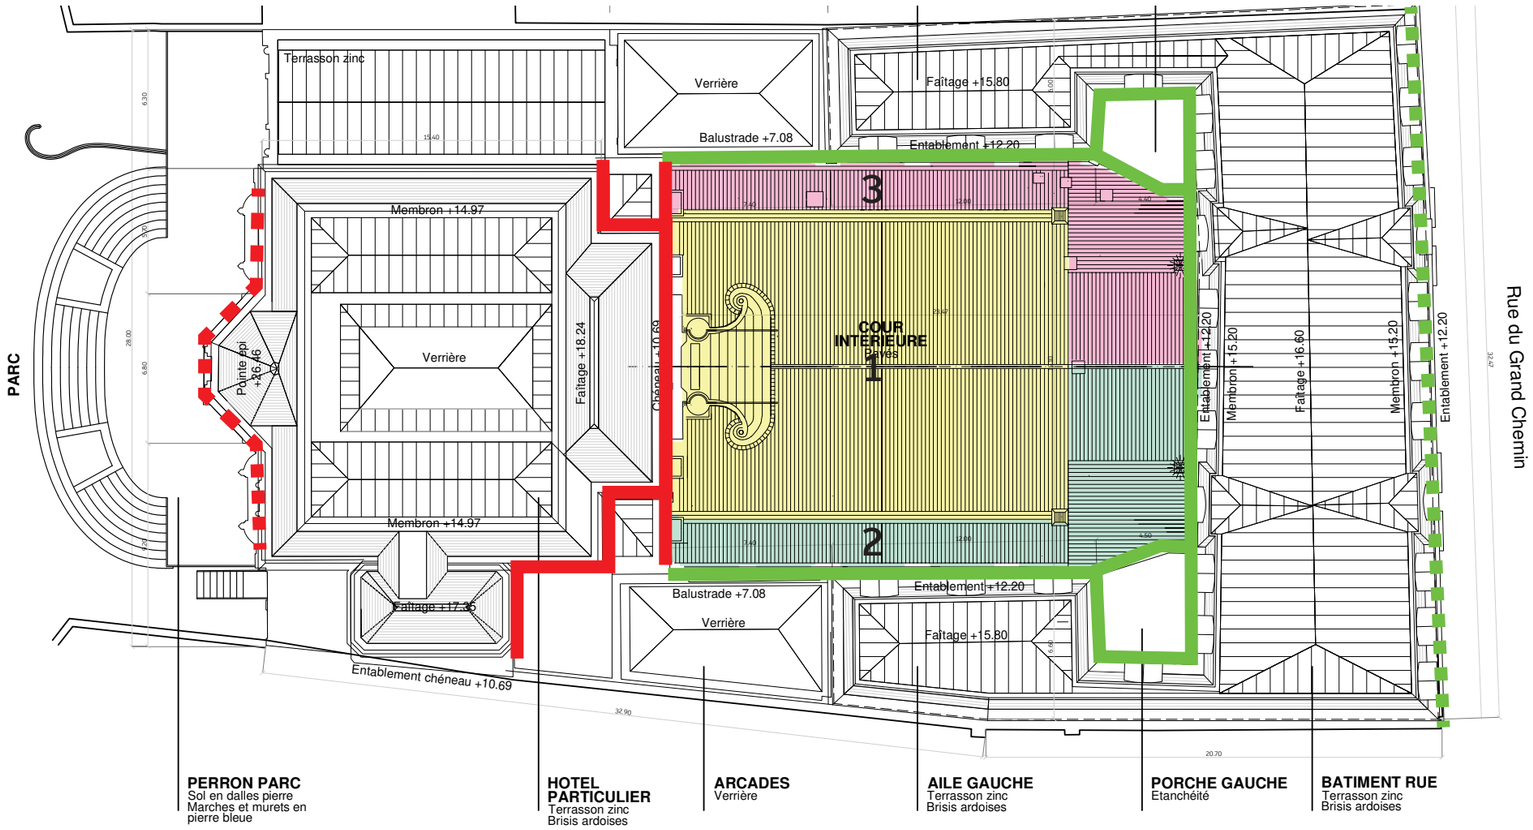

PAW ARCHITECTES

Olivier **DUTHOIT** architecte dplg
Pierre-Marie **CARBON** architecte dplg / CEAA Histoire et patrimoine moderne XIX/XX
Etienne **SINTIVE** architecte dplg / architecte du patrimoine
23 rue Arago 59000 LILLE / 03 20 57 84 42 / agence@paw.archi / www.paw.archi

Aff 24-14 PRO
ROUBAIX Tribunal de Proximité/Conseil de Prud'hommes
Maître d'ouvrage
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Désignation du document ou du plan
PLANNING D'INTERVENTION

Date
04/09/26
Page
P09
