
SONDAGE PRESSIOMETRIQUE N°1

Altitude (estimée) **Z** : + 31,00 m NGM

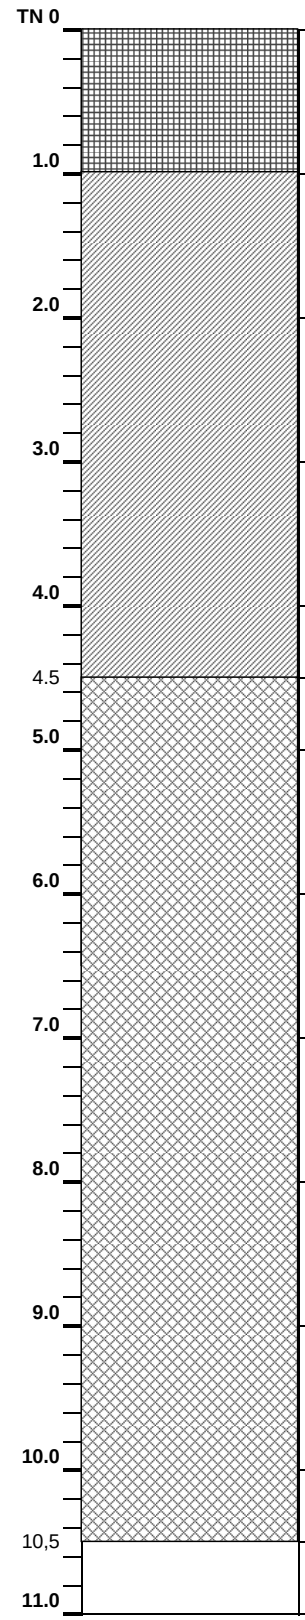

Profondeur (m)	Em (MPa)	Pl* (MPa)	Em/Pl	DESCRIPTION
TN 0				
1.0	35.1	1.26	27.5	Remblais (limono-graveleux)
2.0	21.8	1.04	20.4	Limons argilo-sableux brun à rougeâtre devenant brun clair en profondeur moyennement compacts, à éléments polygéniques sains et altérés de taille millimétrique à pluri-centimétrique
3.0	18.8	0.88	20.5	
				Colluvions
4.0	6.9	0.41	14.9	
4.5				
5.0	9.3	0.62	13.6	
6.0	9.6	0.66	13.0	
7.0	10.9	0.83	11.8	Limons argileux peu sableux, moyennement à fortement compacts, brun à grisâtre à structure minéralogique visible
8.0	3.7	0.29	9.0	Altérites
9.0	35.7	1.65	20.2	
10.0	27.0	2.06	12.3	
10,5				Arrêt du sondage
11.0				

Tarière mécanique hélicoïdale à sec (Ø 63 mm)
Diamètre de la sonde 60 mm

OBSERVATIONS

Aucune venue d'eau à 10,5 mètre de profondeur/TN

PROJET

R+6 - Internat au Lycée de Dembéni

CLIENT

Vice Rectorat

OPERATEUR

Julien PITET

DATE

13 novembre 2013
