
| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseu | Noms ressources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attribution marché | 2 sem. | Mar 29/12/26 | Lun 11/01/27 | | MOA |
| 2 | **Etape 4 : Suivi de réalisation (VISA/DET/AOR)** | **184 jrs** | **Mar 12/01/27** | **Ven 24/09/27** | | |
| 3 | **VISA** | **86 jrs** | **Mar 12/01/27** | **Mar 11/05/27** | | |
| 4 | Réunion de lancement | 1 jr | Mar 12/01/27 | Mar 12/01/27 | 1 | INTEGRATEU |
| 5 | Etudes d'exécution | 2 sem. | Lun 18/01/27 | Ven 29/01/27 | 1 | INTEGRATEU |
| 6 | Validation VISA | 2 sem. | Mar 19/01/27 | Lun 01/02/27 | 5DD+1 jr | LMIAV |
| 7 | Approvisionnements (à confirmer) | 16 sem. | Mer 20/01/27 | Mar 11/05/27 | 6DD+1 jr | INTEGRATEU |
| 8 | **DET** | **149 jrs** | **Mar 02/02/27** | **Ven 27/08/27** | | |
| 9 | Préparation chantier | 2 m | Mar 02/02/27 | Lun 29/03/27 | 6 | INTEGRATEU |
| 10 | Amphis disponibles pour chantier | 7 sem. | Lun 12/07/27 | Ven 27/08/27 | | MOA |
| 11 | Dépose, câblage, baies, plans de travail | 2 sem. | Lun 12/07/27 | Ven 23/07/27 | 9;10DD | INTEGRATEU |
| 12 | Installation des terminaux | 2 sem. | Lun 26/07/27 | Ven 06/08/27 | 11;7 | INTEGRATEU |
| 13 | Mise en service | 2 sem. | Lun 09/08/27 | Ven 20/08/27 | 12 | INTEGRATEU |
| 14 | **AOR** | **25 jrs** | **Lun 23/08/27** | **Ven 24/09/27** | | |
| 15 | OPR | 1 sem. | Lun 23/08/27 | Ven 27/08/27 | | LMIAV |
| 16 | Réception | 0 jr | Ven 27/08/27 | Ven 27/08/27 | 15 | MOA |
| 17 | Levée des réserves | 4 sem. | Lun 30/08/27 | Ven 24/09/27 | 16 | INTEGRATEU |

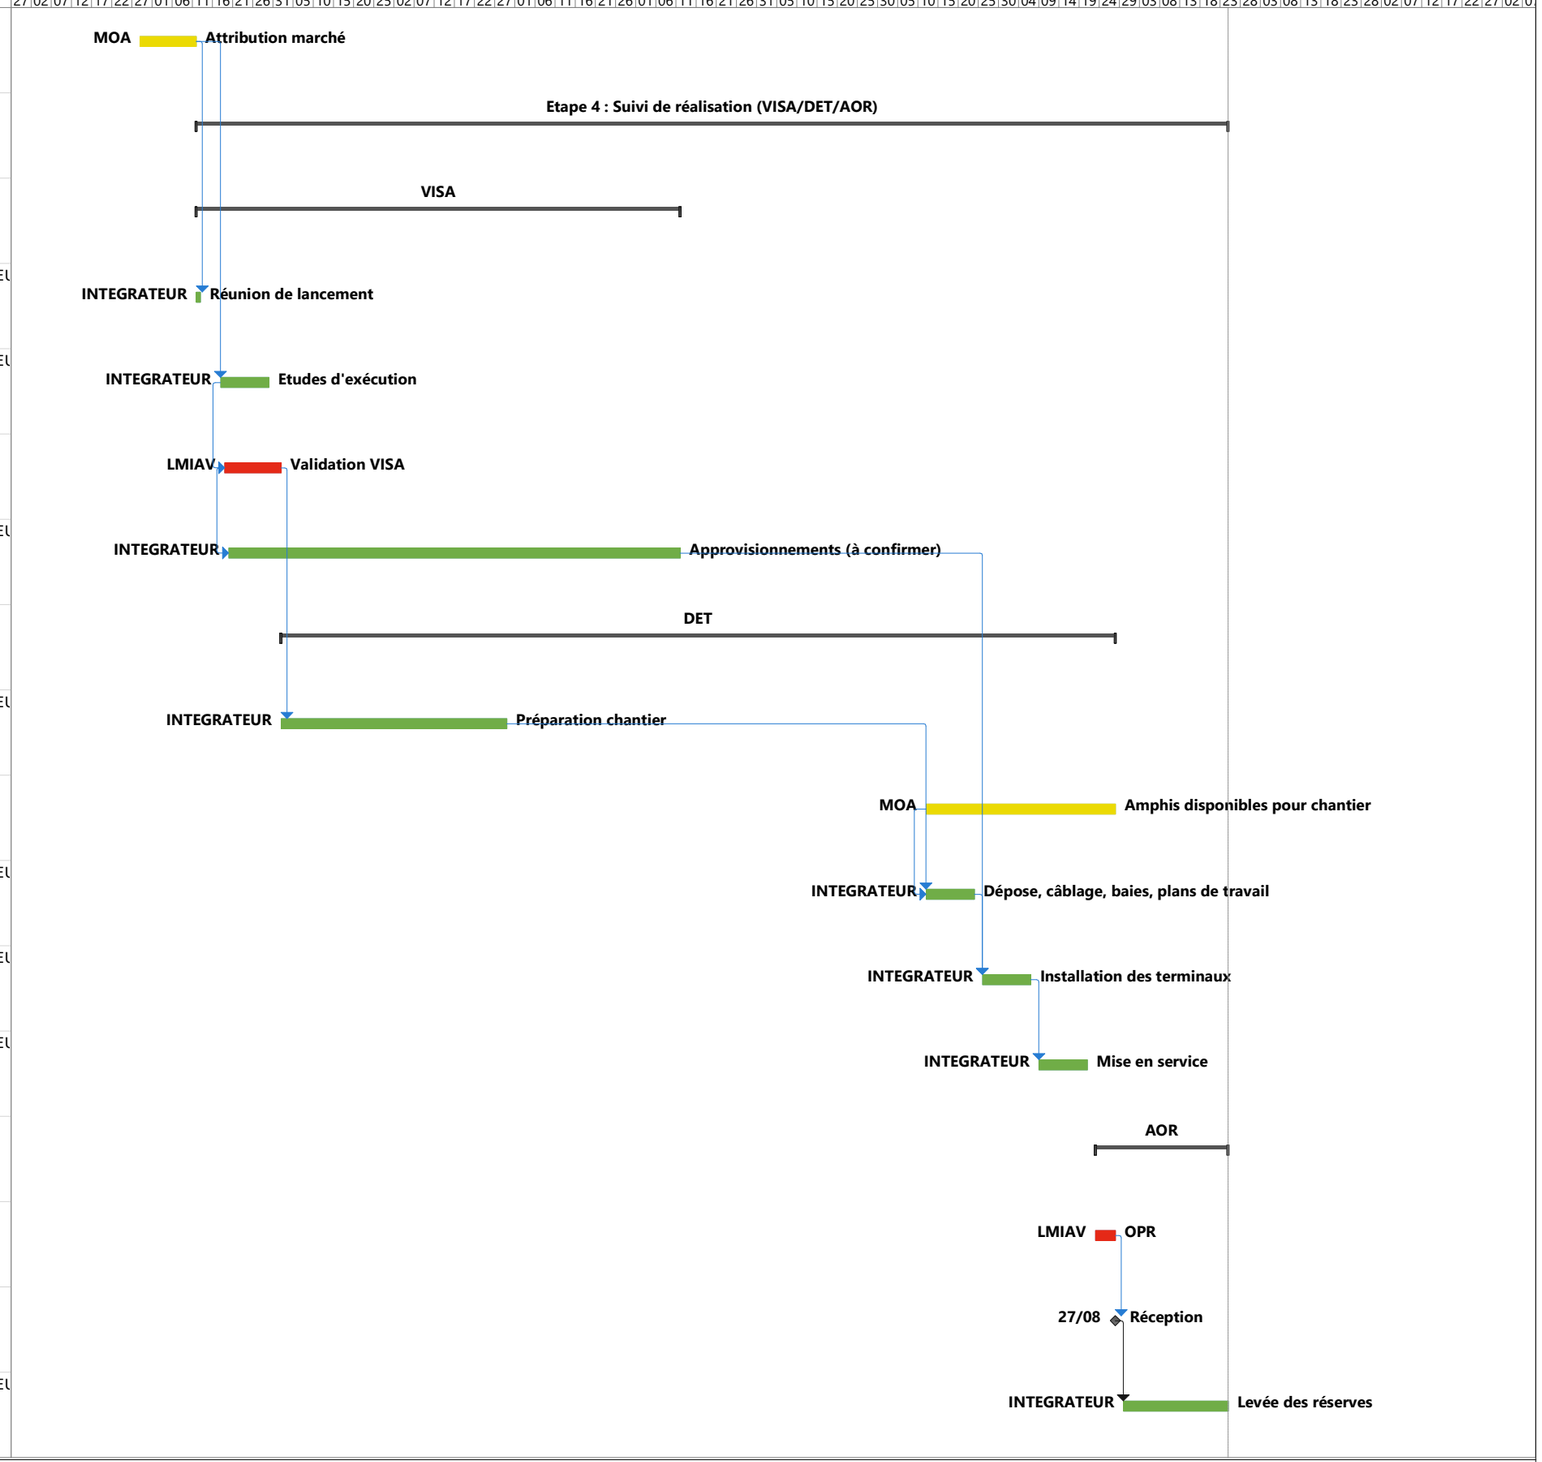


LM Ingénierie AUDIOVISUEL

Projet : Ecole Nationale de la Magistrature - AMO Audiovisuel -
Date : Lun 07/09/26

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tâche | Récapitulatif du projet | Tâche manuelle | Début uniquement | Échéance | MOA |
| Fractionnement | Tâche inactive | Durée uniquement | Fin uniquement | Avancement | Intégrateur |
| Jalon | Jalon inactif | Report récapitulatif manuel | Tâches externes | Progression manuelle | |
| Récapitulative | Récapitulatif inactif | Récapitulatif manuel | Jalons externes | LMI AV | |
