
Planning EXE indice 0 - Réaménagement de bureaux CNRS - Rennes (35)

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**REFECTION CNRS RENNES**	**75 jours?**	**Lun 01/03/27**	**Ven 11/06/27**	
2	**Lot curage - démolition**	**10 jours**	**Lun 01/03/27**	**Ven 12/03/27**	
3	Installation de chantier compris protection de l'existant	5 jours	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27	
4	Dépose installations électriques non conservés	1 jour	Lun 08/03/27	Lun 08/03/27	3
5	Dépose du second oeuvre (cloisons/faux plafond/mint/sols/placards)	3 jours	Mar 09/03/27	Jeu 11/03/27	4
6	Nettoyage - repli	1 jour	Ven 12/03/27	Ven 12/03/27	5
7	**Second-œuvre**	**50 jours**	**Lun 15/03/27**	**Ven 21/05/27**	
8	Cloisons type placostil compris bande	15 jours	Lun 15/03/27	Ven 02/04/27	6
9	Préparation et Peinture Cloisons	15 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27	8
10	Ossatures plafonds	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27	9
11	Electricité, éclairage, dépose/repose CVC	5 jours	Lun 03/05/27	Ven 07/05/27	10
12	Sol souple PVC	5 jours	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27	11
13	Pose cloisons modulaires, blanchiment du plafond et pose des portes	5 jours	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	12
14	**Réception**	**13 jours**	**Lun 24/05/27**	**Mer 09/06/27**	
15	**Nettoyage avant OPR**	**1 jour**	**Lun 24/05/27**	**Lun 24/05/27**	**13**
16	**OPR**	**10 jours**	**Mar 25/05/27**	**Lun 07/06/27**	**15**
17	**Nettoyage final**	**1 jour**	**Mar 08/06/27**	**Mar 08/06/27**	**16**
18	**Réception**	**1 jour**	**Mer 09/06/27**	**Mer 09/06/27**	**17**

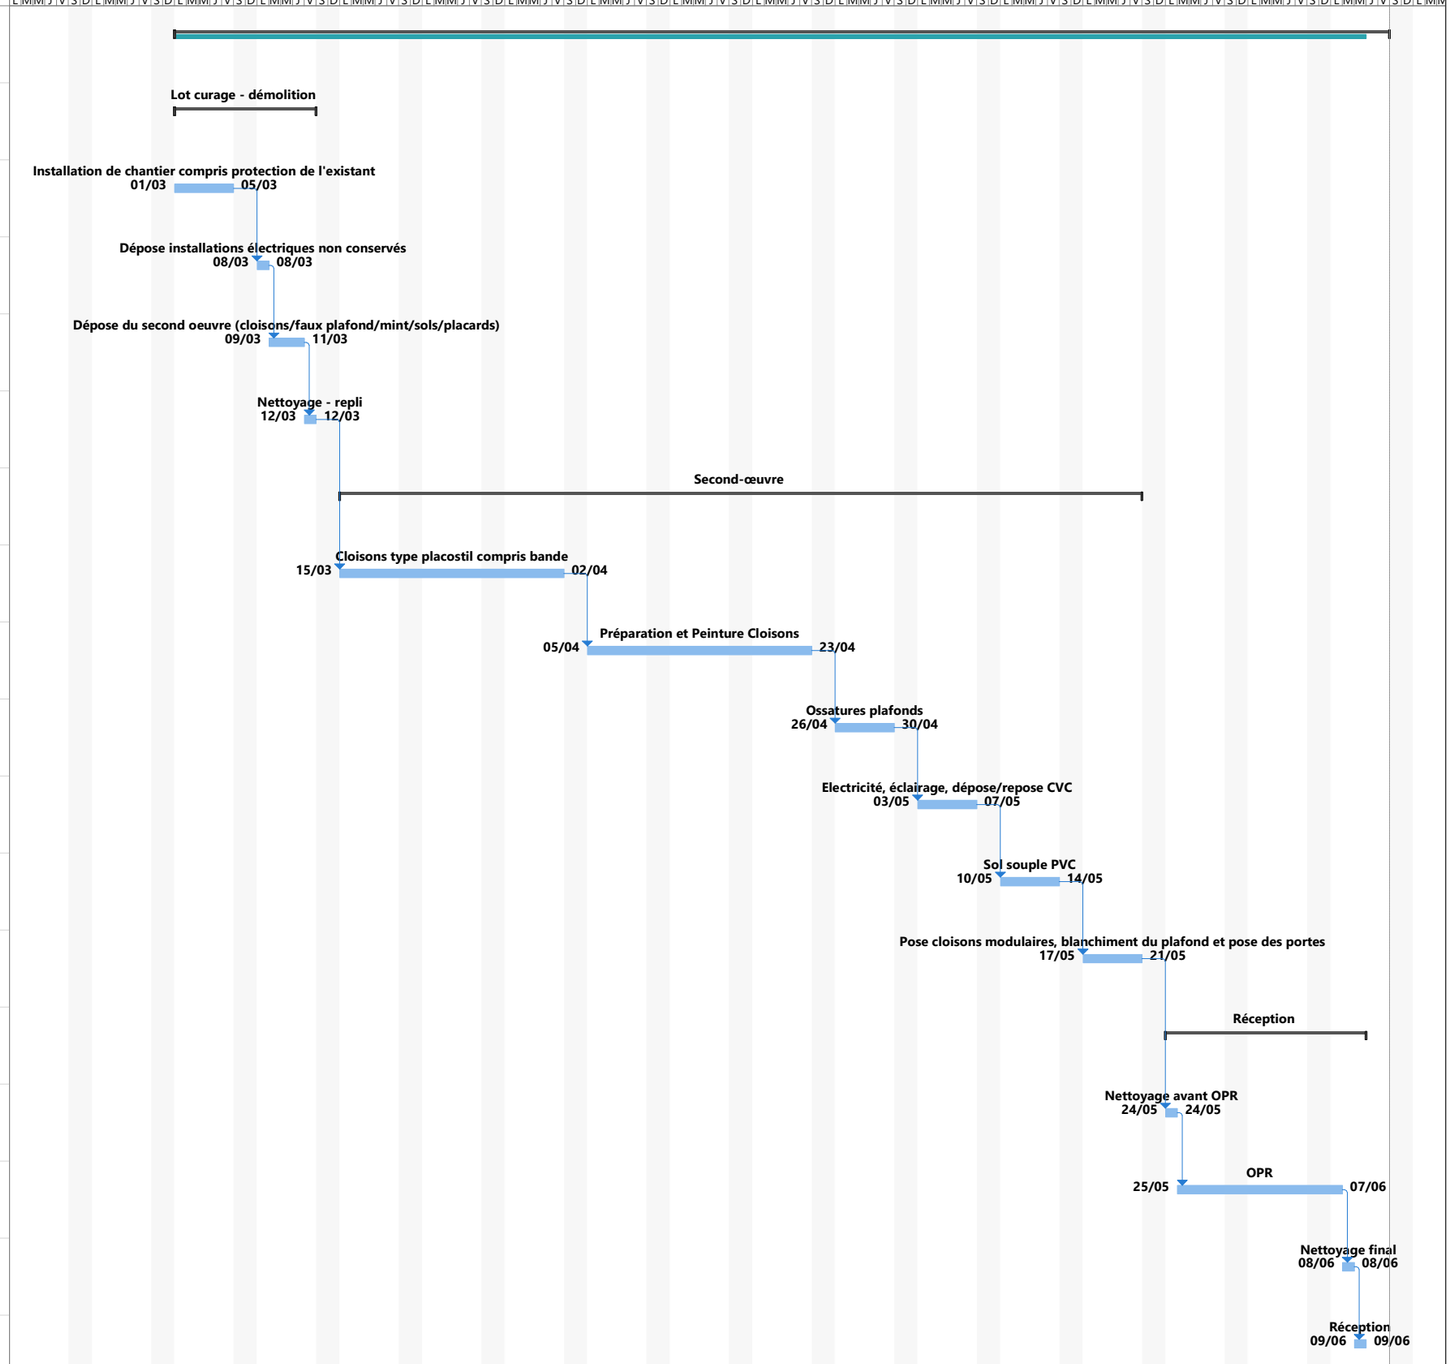

Projet : Planning EXE - indice 0
Date : Jeu 10/09/26

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle		
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance			
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement			
