
Chantier - Tranche 03 - R+2	170 jours	févr. 13 → juil. 31
Installation de chantier - Tranche 03	17 jours	févr. 13 → févr. 29
Déménagement bureaux - R+2	17 jours	févr. 13 → févr. 29
Curage / démolition - Tranche 03 : R+2	14 jours	mars 1 → mars 14
Cloisons et doublage couloirs - R+2	47 jours	mars 15 → avr. 30
Soffites et joues bureaux - R+2	17 jours	avr. 14 → avr. 30
Reprises faux plafonds - R+2	14 jours	mai 1 → mai 14
Pose des cloisons amovibles	29 jours	juin 10 → juil. 8
Fermeture faux plafonds - R+2	9 jours	juil. 9 → juil. 17
Fourniture châssis et blocs portes - R+2	31 jours	mars 15 → avr. 14
Eléments de cuisine	10 jours	avr. 15 → avr. 24
Reprises des tablettes bois - R+2	16 jours	avr. 15 → avr. 30
Pose des vitrages et portes - R+2	14 jours	juin 9 → juin 22
Pose des supports signalétique	8 jours	juin 23 → juin 30
Faïence et revêtements muraux	19 jours	mai 1 → mai 19
Ragréage sol / pose de la moquette - R+2	21 jours	mai 20 → juin 9
Peinture des murs et plafonds placo - R+2	13 jours	mai 7 → mai 19
Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois	13 jours	mai 7 → mai 19
Pose de la signalétique / vitrophanie	9 jours	juin 23 → juil. 1
Coupure et consignation des équipements	14 jours	févr. 16 → févr. 29
Déploiement équipements plateau R+2	16 jours	avr. 15 → avr. 30
Mise en service équipements	16 jours	juil. 2 → juil. 17
Coupure et consignation des équipements	14 jours	févr. 16 → févr. 29
Déploiement équipements plateau R+2	16 jours	avr. 15 → avr. 30
Mise en service équipements	17 jours	juil. 1 → juil. 17
AOR : Tranche 03 - R+2	30 jours	juil. 1 → juil. 30
Livraison : Tranche 03	2 jours	juil. 30 → juil. 31

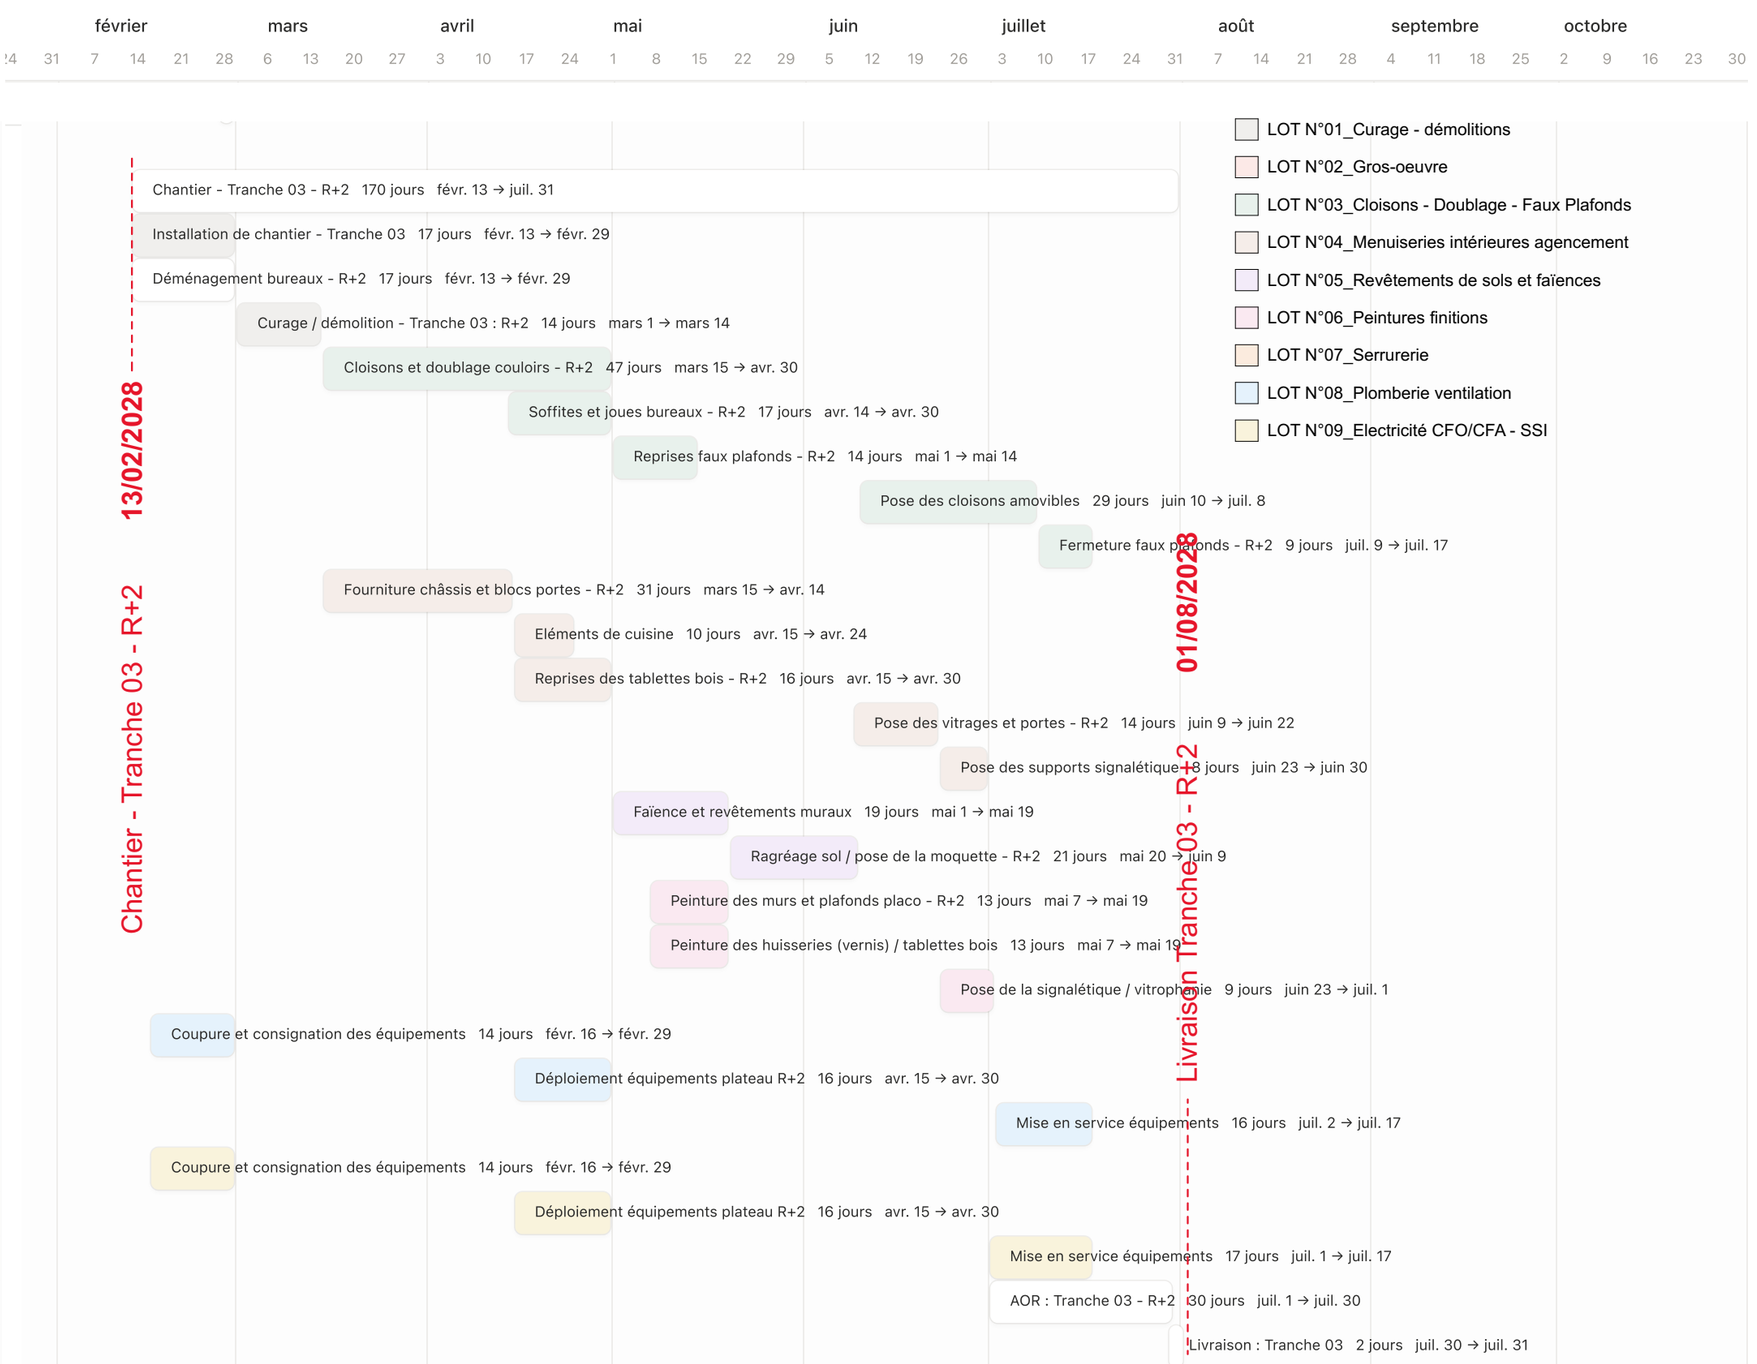

CPAM de l'Aude 2 allées bezons, 11 000 Carcassonne LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>	**Charrière & Jacob** 8 rue Saint Joseph 31400 Toulouse agence@charrierejacob.fr 05 61 53 49 54	**taaac** 61bis rue des fontaines 31300 Toulouse contact@taaac.fr 0685111847	**LS Ingénierie** 1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne d.leblay@ls-ing.fr 0680685509	**BET LAUMONT** 79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne nadine.bousquet@laumont-ing.fr 0688737161	**BUREAU VERITAS** Avenue du Forum - 11000 Narbonne morgane.buisson@bureauveritas.com 0676873559			**DOSSIER DCE** **suivi des modifications** date 24/09/2026 · ind - · modifications dossier définitif			**TR03 - Tranche 03 - Planning** CPAM Carcassonne - Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne						
								CPA	16/10/2026	DCE	ARC	TR03		A3	
maîtrise d'ouvrage	**architecte (m)**	**architecte**	**bet structure**	**bet CVC / elec / SSI**	**bureau de contrôle**			**projet**	**date**	**phase**	**auteur**	**type**	**niveau**	**format**	**échelle**
