
ZAC DES TARTERETS
TRANCHE 1 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Planning**	**1661 jours**	**Lun 24/11/25**	**Lun 05/04/32**
2		**ACT**	**112 jours**	**Lun 05/10/26**	**Mar 09/03/27**
3		Consultation	1,5 mois	Lun 05/10/26	Ven 13/11/26
4		Analyse des offres	20 jours	Lun 16/11/26	Ven 11/12/26
5		Notification	1 mois	Lun 14/12/26	Ven 08/01/27
6		Période de préparation	2 mois	Mer 13/01/27	Mar 09/03/27
7					
8		**Travaux de construction des lots**	**1438 jours**	**Jeu 01/10/26**	**Lun 05/04/32**
9		Ilot A	490 jours	Lun 01/02/27	Ven 15/12/28
10		Ilot B	488 jours	Lun 04/10/27	Mer 15/08/29
11		Ilot C1	423 jours	Jeu 01/10/26	Lun 15/05/28
12		Ilot C2	423 jours	Ven 01/01/27	Mar 15/08/28
13		Ilot D1	526 jours	Lun 01/04/30	Lun 05/04/32
14		Ilot D2	468 jours	Mer 01/09/27	Ven 15/06/29
15		Ilot G	521 jours	Lun 03/04/28	Sam 30/03/30
16		Ilot H	521 jours	Lun 03/04/28	Sam 30/03/30
17					
18		**Travaux anticipés**	**545 jours**	**Lun 01/06/26**	**Ven 30/06/28**
19		**Travaux concessionnaires**	**545 jours**	**Lun 01/06/26**	**Ven 30/06/28**
20		**Enedis**	**66 jours**	**Mer 01/07/26**	**Mer 30/09/26**
21		Renouvellement de câble et dévoiement	66 jours	Mer 01/07/26	Mer 30/09/26
22		**GRDF**	**66 jours**	**Mer 01/07/26**	**Mer 30/09/26**
23		Intervention de GrDF	3,3 mois	Mer 01/07/26	Mer 30/09/26
24		**GPS eau**	**99 jours**	**Lun 01/06/26**	**Jeu 15/10/26**
25		Interventon de GPS eau	4,95 mois	Lun 01/06/26	Jeu 15/10/26
26		**SIARCE**	**87 jours**	**Jeu 01/07/27**	**Sam 30/10/27**
27		Intervention SIARCE sur Renoir	88 jours	Jeu 01/07/27	Sam 30/10/27
28		**Coriance**	**262 jours**	**Jeu 01/07/27**	**Ven 30/06/28**
29		Intervention de Coriance	262 jours	Jeu 01/07/27	Ven 30/06/28
30		**Travaux accord cadre - Lot 0**			
31		Travaux de viabilisation Av. Léon Blum - zone centre	107 jours	Jeu 01/10/26	Ven 26/02/27
32		Travaux de viabilisation Rue Paul Cézanne - zone sud	67 jours	Jeu 01/10/26	Ven 01/01/27
33					
34		**Travaux d'aménagement des espaces publics**	**1661 jours**	**Lun 24/11/25**	**Lun 05/04/32**
35					
36		**Emprise A - Lot 1, Lot 3 et Lot 4**	**1661 jours**	**Lun 24/11/25**	**Lun 05/04/32**
37		**Av. Léon Blum**	**799 jours**	**Mar 09/03/27**	**Sam 30/03/30**
38		1 - BLUM - Travaux de viabilisation - zone Est	4 mois	Mar 09/03/27	Lun 28/06/27
39		1 - BLUM - Travaux de viabilisation - zone Ouest	4,5 mois	Mar 21/09/27	Lun 24/01/28
40		1 - BLUM - Travaux qualitatif - zone centre	3 mois	Mar 25/01/28	Lun 17/04/28
41		4 - BLUM - Travaux esapaces verts - zone centre	3 mois	Mar 25/01/28	Lun 17/04/28
42		3 - BLUM - ECL - zone centre	3 mois	Mar 25/01/28	Lun 17/04/28
43		1 - BLUM - Travaux qualitatifs - zone Est	3 mois	Mar 18/04/28	Lun 10/07/28
44		4 - BLUM - Travaux espaces verts - zone est	3 mois	Mar 18/04/28	Lun 10/07/28
45		3 - BLUM - ECL - zone est	3 mois	Mar 18/04/28	Lun 10/07/28
46		1 - BLUM - Travaux qualitatifs - zone Ouest	3 mois	Mar 18/04/28	Lun 10/07/28
47		4 - BLUM - travaux espaces verts - zone ouest	3 mois	Mar 18/04/28	Lun 10/07/28
48		3 - BLUM - ECL - zone ouest	3 mois	Mar 18/04/28	Lun 10/07/28
49		1 - BLUM - TO1 : Abords des lots G et H	2 mois	Lun 04/02/30	Sam 30/03/30
50		**Av. Charles de Gaulle**	**330 jours**	**Mar 29/06/27**	**Lun 02/10/28**
51		1 - CDG - Travaux de viabilisation - zone parvis du collège	3 mois	Mar 29/06/27	Lun 20/09/27
52		1 - CDG - Travaux qualitatifs - zone parvis du collège	3 mois	Mar 11/07/28	Lun 02/10/28
53		4 - CDG - Travaux espaces verts - parvis collège	3 mois	Mar 11/07/28	Lun 02/10/28
54		**Rue Paul Gauguin**	**766 jours**	**Lun 24/11/25**	**Lun 30/10/28**
55		1- GAU - Travaux de viabilisation	5,5 mois	Lun 29/03/27	Ven 27/08/27
56		1 - GAU - Travaux de viabilisation - zone nord	1 mois	Mar 03/10/28	Lun 30/10/28
57		4 - GAU - travaux espaces verts - zone nord	1 mois	Mar 03/10/28	Lun 30/10/28
58		3 - GAU - ECL - zone nord	1 mois	Mar 03/10/28	Lun 30/10/28
59		1 - GAU - Travaux de viabilisation - zone sud	1 mois	Lun 24/11/25	Ven 19/12/25
60		4 - GAU - Travaux espaces verts - zone sud	1 mois	Lun 24/11/25	Ven 19/12/25
61		3 - GAU - ECL - zone sud	1 mois	Lun 24/11/25	Ven 19/12/25

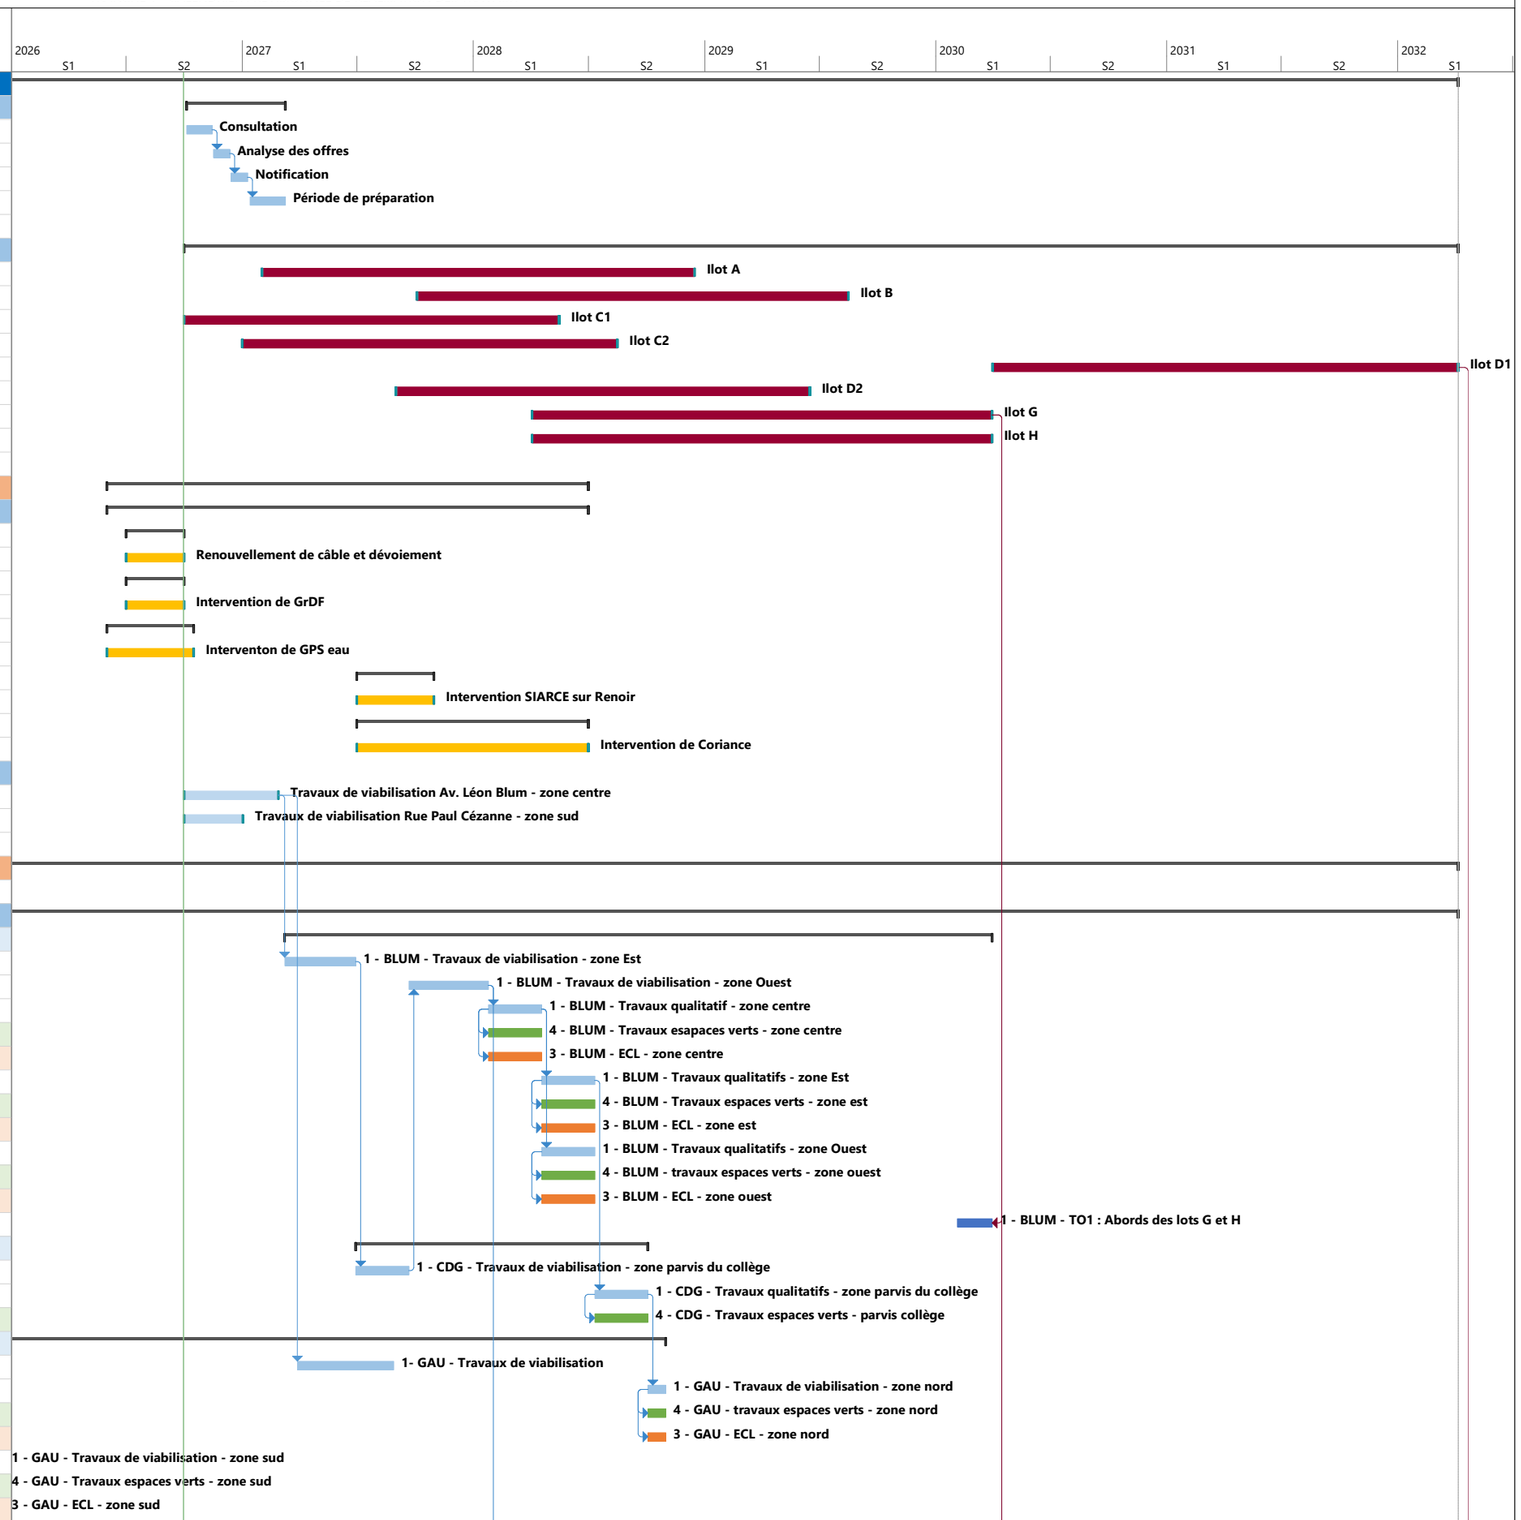


Projet : 20241031_TAR_PRO_Pl
Date : Mer 30/09/26

Tâche — Récapitulative — Jalon inactif — Durée uniquement — Début uniquement — Jalons externes — Progression manuelle
Fractionnement — Récapitulatif du projet — Récapitulatif inactif — Report récapitulatif manuel — Fin uniquement — Échéance
Jalon — Tâche inactive — Tâche manuelle — Récapitulatif manuel — Tâches externes — Avancement

ZAC DES TARTERETS
TRANCHE 1 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
62		**Rue Paul Cézanne**	**1661 jours**	**Lun 24/11/25**	**Lun 05/04/32**
63		1 - CEZ - Travaux qualitatifs - zone sud	3 mois	Mar 25/01/28	Lun 17/04/28
64		4 - CEZ- Travux espaces verts - zone sud	3 mois	Mar 25/01/28	Lun 17/04/28
65		3 - CEZ - ECL - zone sud	3 mois	Mar 25/01/28	Lun 17/04/28
66		1 - CEZ - Travaux de viabilisation - zone nord	2 mois	Lun 24/11/25	Ven 16/01/26
67		1- CEZ - Travaux qualitatifs - zone nord	2 mois	Lun 19/01/26	Ven 13/03/26
68		4 - CEZ - Travaux espaces verts - zone nord	2 mois	Lun 19/01/26	Ven 13/03/26
69		3 - CEZ - ECL - zone nord	2 mois	Lun 19/01/26	Ven 13/03/26
70		1 - CEZ - TO2 : Abords du lot D1	2 mois	Mar 10/02/32	Lun 05/04/32
71		**Rue Mandela**	**1135 jours**	**Lun 24/11/25**	**Sam 30/03/30**
72		1- MAN - Travaux de viabilisation (qualitatif en TO)	1 mois	Lun 24/11/25	Ven 19/12/25
73		3 - MAN - ECL - zone sud	1 mois	Lun 24/11/25	Ven 19/12/25
74		1 - MANDELA - TO1 - Abords des lots G et H	2 mois	Lun 04/02/30	Sam 30/03/30
75					
76		**Emprise B - Lot 2, Lot 3**	**630 jours**	**Ven 01/10/27**	**Jeu 28/02/30**
77		**Parc Gauguin**	**630 jours**	**Ven 01/10/27**	**Jeu 28/02/30**
78		2 - PARC - Travaux de viabilisation et qualitatifs - zone nord et est	6 mois	Ven 01/10/27	Jeu 16/03/28
79		3 - PARC - ECL	3 mois	Ven 24/12/27	Jeu 16/03/28
80		2 - PARC - Travaux de réfection de la base vie et aménagements quali	2,15 mois	Mar 01/01/30	Jeu 28/02/30
81		**Rue Renoir**	**240 jours**	**Ven 17/03/28**	**Jeu 15/02/29**
82		2 - REN - Travaux de viabilisation - zone sud	3 mois	Ven 17/03/28	Jeu 08/06/28
83		2 - REN - Travaux de viabilisation - zone nord	3 mois	Ven 09/06/28	Jeu 31/08/28
84		2 - REN - Travaux qualitatifs - zone sud	3 mois	Ven 01/09/28	Jeu 23/11/28
85		3 -REN - ECL - zone sud	3 mois	Ven 01/09/28	Jeu 23/11/28
86		2 - REN - Travaux qualitatifs - zone nord	3 mois	Ven 24/11/28	Jeu 15/02/29
87		3 - REN - ECL - zone nord	3 mois	Ven 24/11/28	Jeu 15/02/29
88		**Mail Vert**	**240 jours**	**Ven 09/06/28**	**Jeu 10/05/29**
89		2 - MAIL - Travaux viabilisation - zone centre	3 mois	Ven 09/06/28	Jeu 31/08/28
90		2 - MAIL - Travaux qualitatifs - zone centre	3 mois	Ven 24/11/28	Jeu 15/02/29
91		3 - MAIL - ECL - zone centre	3 mois	Ven 09/06/28	Jeu 31/08/28
92		2 - MAIL - Travaux de viabilisation et qualitatifs - zone est et ouest	3 mois	Ven 16/02/29	Jeu 10/05/29
93		3 - MAIL - ECL - zone est et ouest	1,5 mois	Ven 30/03/29	Jeu 10/05/29
94		**Parc Césaire**	**70 jours**	**Ven 11/05/29**	**Jeu 16/08/29**
95		2 - CES - Travaux de viabilisation et qualitatifs	1,5 mois	Ven 11/05/29	Jeu 21/06/29
96		2 - CES - TO3 : Parc Césaire	2 mois	Ven 22/06/29	Jeu 16/08/29
97		3 - CES - ECL	3 mois	Ven 11/05/29	Jeu 02/08/29
98					
99		**Plantations des arbres**	**545 jours**	**Ven 15/10/27**	**Jeu 15/11/29**
100		**Hiver 2027 - 2028**	**109 jours**	**Ven 15/10/27**	**Mer 15/03/28**
101		4 - CDG - Planattion d'arbres - zone parvis collège	12 jours	Ven 15/10/27	Sam 30/10/27
102		2 - PARC - Plantation d'abres hors BV	22 jours	Mer 01/12/27	Jeu 30/12/27
103		4 - CEZ - Plantation d'arbres - zone sud	11 jours	Mer 01/03/28	Mer 15/03/28
104		4 - BLUM - Plantation d'arbres - zone centre	11 jours	Mer 01/03/28	Mer 15/03/28
105		**Hiver 2028 - 2029**	**118 jours**	**Mar 03/10/28**	**Jeu 15/03/29**
106		4 - GAU - Palntation d'arbres - zone nord	20 jours	Mar 03/10/28	Lun 30/10/28
107		4 - CEZ - Plantation d'arbres - zone nord	1 mois	Mer 01/11/28	Mar 28/11/28
108		4 - BLUM - Plantation d'arbres - zone est et ouest	17 jours	Ven 01/12/28	Sam 23/12/28
109		2 - REN - Plantation d'arbres - zone sud	17 jours	Ven 01/12/28	Sam 23/12/28
110		4 - CEZ - Plantation d'arbres - zone sud	14 jours	Lun 01/01/29	Jeu 18/01/29
111		2 - REN - Plantation d'arbres - zone nord	21 jours	Mar 02/01/29	Mar 30/01/29
112		4 - GAU - Plantations d'arbres - zone sud	10 jours	Ven 02/02/29	Jeu 15/02/29
113		2 - MAIL - Plantations d'arbres	11 jours	Jeu 01/03/29	Jeu 15/03/29
114		**Hiver 2029 - 2030**	**11 jours**	**Jeu 01/11/29**	**Jeu 15/11/29**
115		2 - CES - Plantations d'arbres	11 jours	Jeu 01/11/29	Jeu 15/11/29
116					
117		**Mobilisation des lots**	**784 jours**	**Lun 01/03/27**	**Jeu 28/02/30**
118		Lot 1 - VRD - Lot principal emprise A	590 jours	Lun 01/03/27	Ven 06/07/29
119		Lot 2 - VRD Aménagements paysagés - Lot principal emprise B	630 jours	Ven 01/10/27	Jeu 28/02/30
120		Lot 3 - Eclairage public et Basse tension - emprises A et B	420 jours	Ven 24/12/27	Mer 05/09/29
121		Lot 4 - Espace vert emprise A	350 jours	Lun 31/01/28	Mer 04/07/29

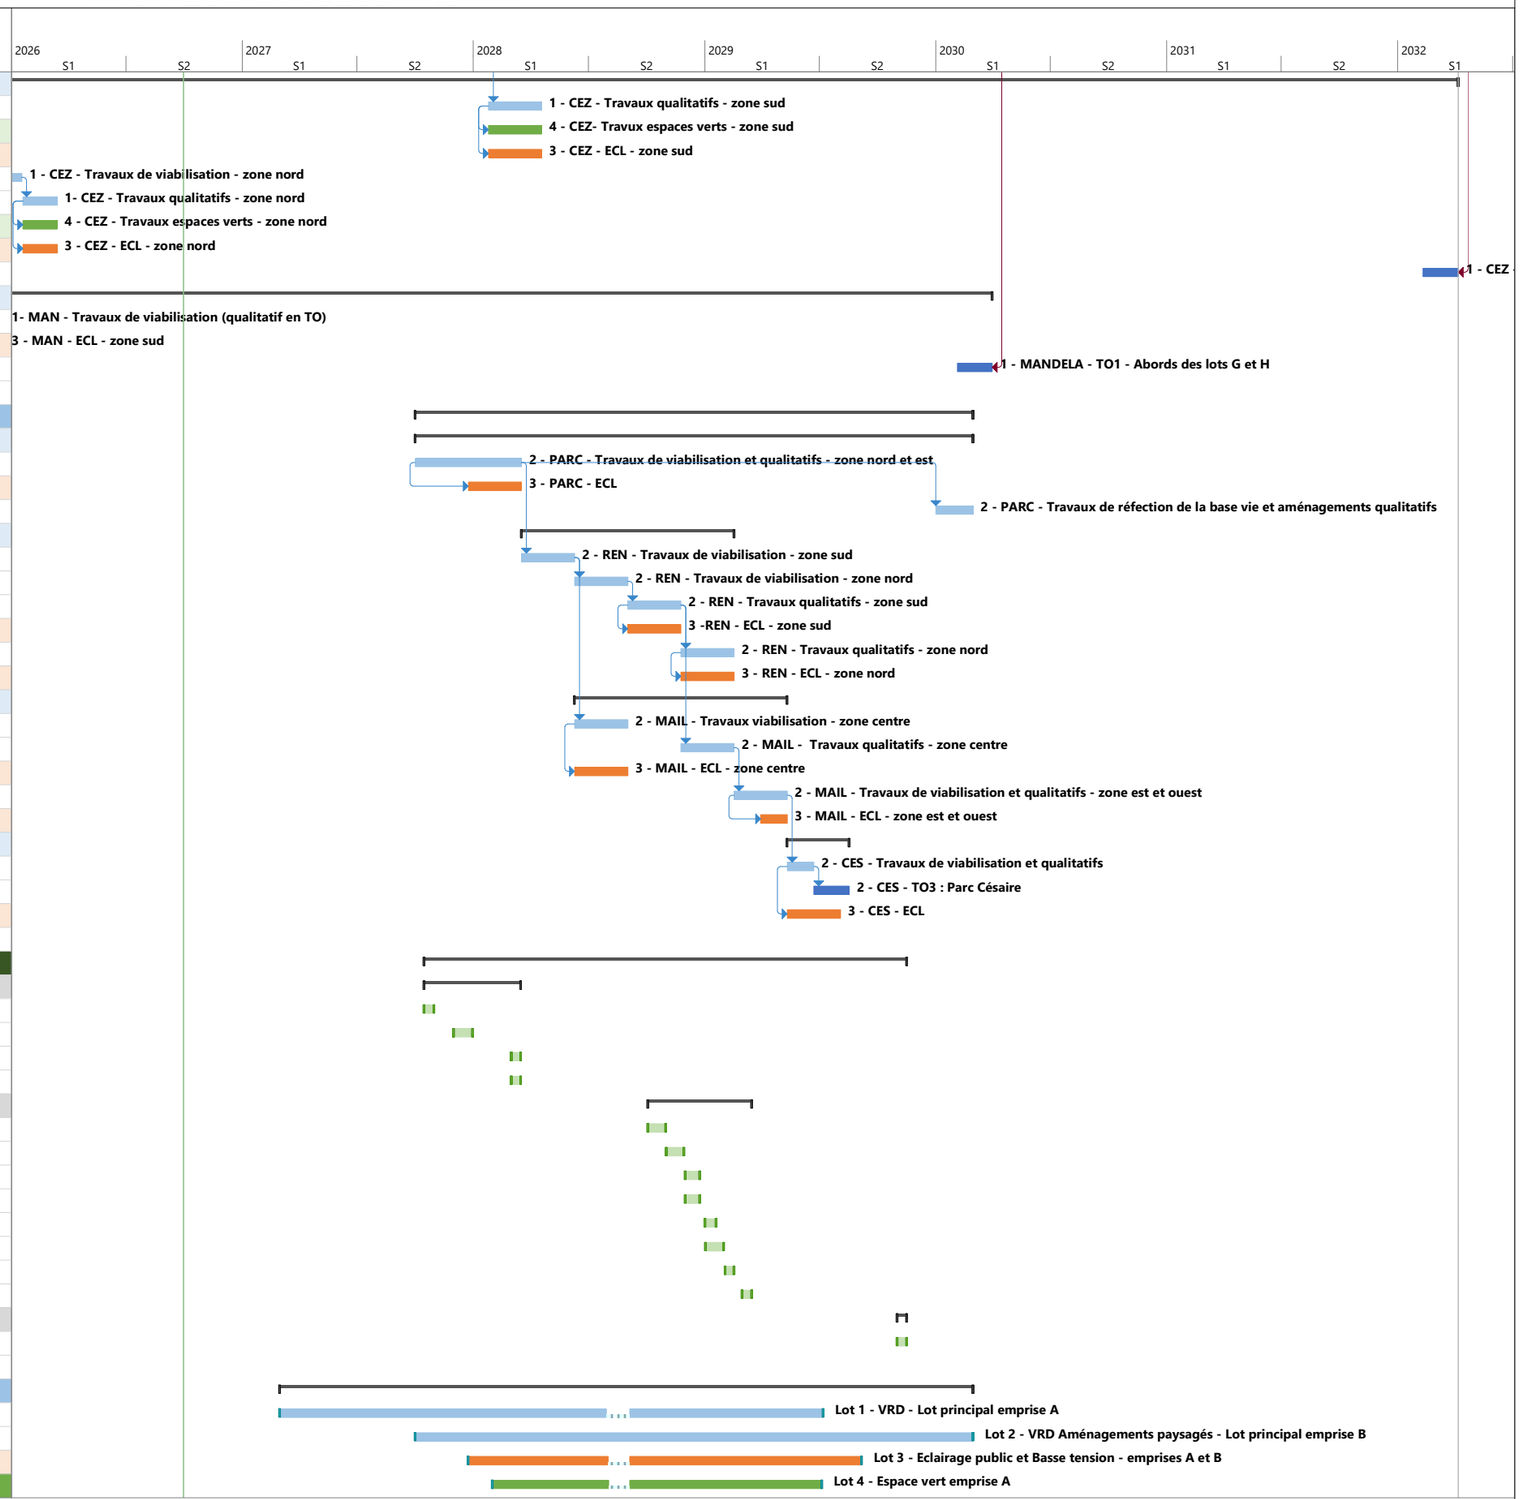

Projet : 20241031_TAR_PRO_PI
Date : Mer 30/09/26

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle		
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance			
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement			
