Réhabilitation partielle du bâtiment 026

Adresse du projet	QUARTIER MIOLLIS - 13 Bd des Poilus - 13100 Aix-en-Provence
MAITRE D'OUVRAGE	**ESID LYON - USID MARSEILLE** Section travaux 111 Avenue de la Corse - BP 40026 13568 Marseille Cedex 02 Chargé d'affaires : Jessee CALICAT 06.17.40.25.22 jessee.calicat@intradef.gouv
ARCHITECTE MANDATAIRE	**Cabinet d'Architecte Mazzella Magali** Résidence Claudel Parc - Bât. E 151 Boulevard Paul Claudel 13010 Marseille Chargée de projet : Leya BARTEL 06.42.86.82.13 bartel@camm.fr
BUREAU D'ETUDES PLURIDISCIPLINAIRE Emetteur de la pièce	**BETEM PACA SAS** 900 Rue Ampère - CS 50453 13592 Aix-en-Provence Chargé de projets : Alexis PORCHEROT 06.25.22.43.09 a.porcherot@betem.fr
ACOUSTICIEN	**A2MS** 8 Cours Barthélémy 13400 Aubagne Chargé de projets : Romain TOURGON 06.72.16.06.34 contacts.a2ms@gmail.com
BUREAU DE CONTROLE	**SOCOTEC** Chargé de projets : Akram ETTOUIL 06.74.82.71.98 akram.ettouil@socotec.com
COORDINATEUR SSI	**INDIGO ENERGIE** Chargé de projets : Gilles MAUREL 06.12.06.93.72 g.maurel@indigo-energie.com
MARCHÉ	DAF_2023_000686

PHASE PROJET

Plg 57

Planning prévisionnel travaux

Indice	Date	Objet	Réd.	Vér.	App.
A	01/08/25	Première diffusion	TDA	TDA	TDA
B	21/11/25	Mise à jour	TDA	TDA	TDA
C	09/10/26	Diffusion DCE	BBA	BBA	BBA


RÉFÉRENCE : 2024-03-ESID LYON-BETEM-PRO-PLG-57_C

Format : A3		Échelle(s) : Sans

LYCEE MILITAIRE D'AIX-EN-Pce - BATIMENT 026 "CINEMA"

PLANNING PREVISIONNEL TCE

N°	Nom	Durée	Début	Fin
1	**LYCEE MILITAIRE D'AIX-EN-Pce - BATIMENT 026 "CINEMA"**	**536 j**	**Lun 01/02/27**	**Mer 09/05/29**
2	**I. PHASE PREPARATOIRE**	**95 j**	**Lun 01/02/27**	**Mer 16/06/27**
3	Signature du marché de travaux	0 j	Lun 01/02/27	
4	I.1 Etudes d'exécution	35 j	Lun 01/02/27	Ven 19/03/27
5	I.2 Approvisionnements	60 j	Lun 22/03/27	Mer 16/06/27
6	I.3 Installations chantier	5 j	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27
7	**II. DEMOLITIONS - CURAGE - GROS-OEUVRE**	**219 j**	**Mar 30/03/27**	**Ven 03/03/28**
8	II.1 Démolitions, VRD	25 j	Mar 30/03/27	Lun 03/05/27
9	II.2 Curage	40 j	Mar 30/03/27	Mer 26/05/27
10	II.3 Gros Œuvre, Ouvrages intérieurs	51 j	Mar 13/04/27	Jeu 24/06/27
11	II.4 Gros Œuvre, Ouvrages extérieurs, annexes	30 j	Mar 27/04/27	Mer 09/06/27
12	II.5 Abords, Signalétique extérieure, Finitions	10 j	Lun 21/02/28	Ven 03/03/28
13	**III. ENVELOPPE**	**82 j**	**Mar 27/04/27**	**Lun 13/09/27**
14	III.1 Couverture	40 j	Mar 27/04/27	Mer 23/06/27
15	III.2 Etanchéité	57 j	Jeu 03/06/27	Lun 13/09/27
16	III.3 Menuiseries extérieures	15 j	Jeu 01/07/27	Jeu 22/07/27
17	Hors d'eau / hors d'air	0 j	Jeu 22/07/27	
18	III.4 Isolation, doublage	18 j	Ven 23/07/27	Mar 07/09/27
19	**IV. Serrureries, équipements extérieurs**	**135 j**	**Jeu 01/07/27**	**Lun 07/02/28**
20	IV.1 Serrureries	43 j	Jeu 01/07/27	Mar 21/09/27
21	IV.2 Signalétique	5 j	Mar 01/02/28	Lun 07/02/28
22	**V. Corps d'états secondaires, aménagements**	**165 j**	**Jeu 24/06/27**	**Lun 13/03/28**
23	V.1 Cloisonnements, menuiseries, faux plafonds, Habillages	92 j	Jeu 24/06/27	Mer 24/11/27
24	V.2 Peintures, revêtements sols et muraux	69 j	Lun 08/11/27	Ven 18/02/28
25	V.3 Menuiseries intérieures, aménagements, agencements	63 j	Jeu 09/12/27	Lun 13/03/28
26	**VI. ELECTRICITE CFO-CFA**	**86 j**	**Mer 08/09/27**	**Ven 14/01/28**
27	VI.1 Réseaux, tableaux, SSI	33 j	Mer 08/09/27	Ven 22/10/27
28	VI.2 Appareillages, éclairage	22 j	Lun 08/11/27	Mer 08/12/27
29	VI.3 Mises en service, essais	14 j	Mar 21/12/27	Ven 14/01/28
30	**VII. CVC - PLOMBERIE**	**192 j**	**Mar 27/04/27**	**Mer 23/02/28**
31	VII.1 Chauffage, Ventilation, Climatisation	166 j	Mar 27/04/27	Mar 18/01/28
32	VII.2 Plomberie	5 j	Mar 21/12/27	Lun 03/01/28
33	VII.3 Mises en service	37 j	Mar 04/01/28	Mer 23/02/28
34	**IX. Repli, réception**	**271 j**	**Mar 14/03/28**	**Mer 09/05/29**
35	IX.1 Nettoyages, replis	40 j	Mar 14/03/28	Jeu 11/05/28
36	IX.2 Réception, GPA	261 j	Mar 28/03/28	Mer 09/05/29
37	OPR	0 j	Lun 27/03/28	
38	Réception des ouvrages	0 j	Jeu 11/05/28	

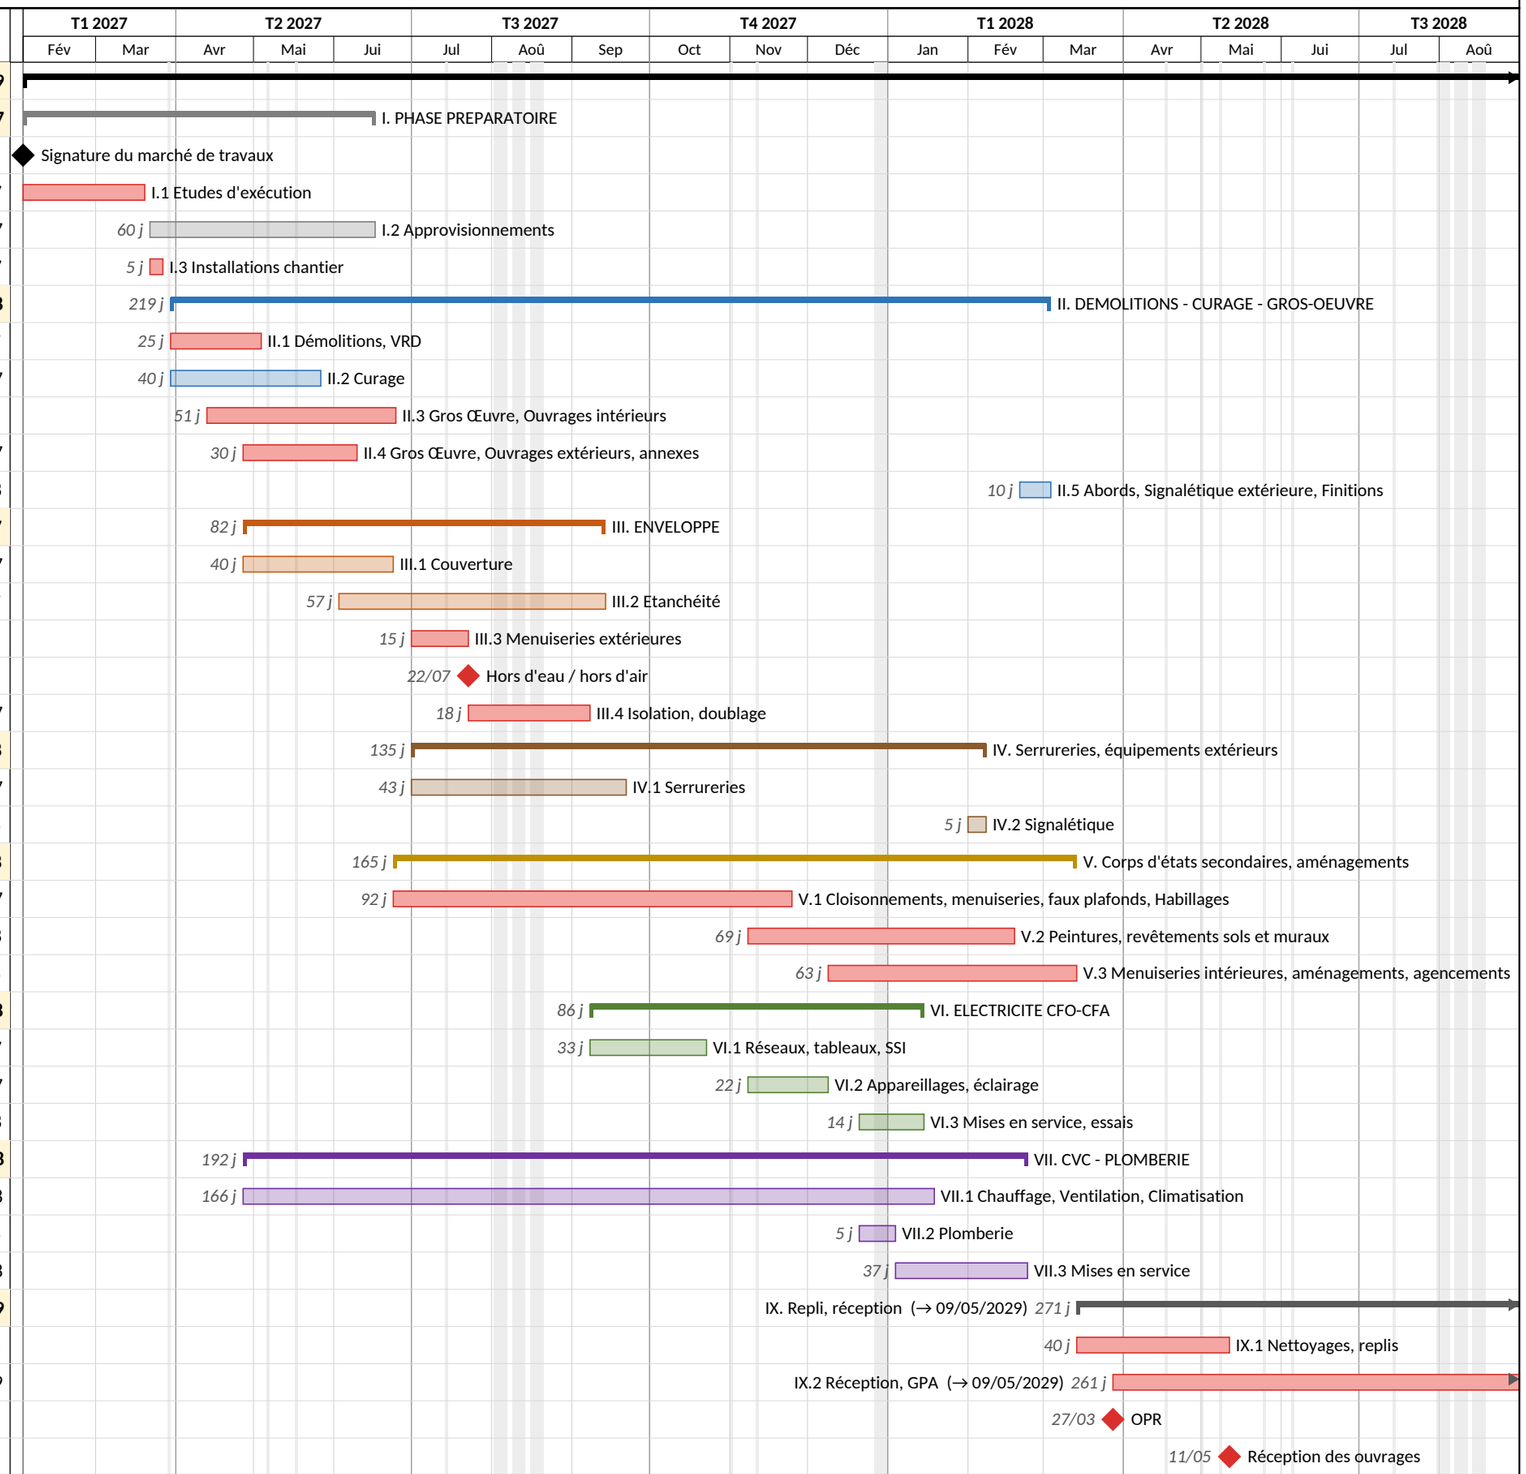

Projet : **LMA BATIMENT 026 "CINEMA"**
MOA : **ESID DE LYON**
MOE : **CAMM-BETEM-A2MS**

Tâche
Tâche critique
Récapitulatif
Jalon
Jours fériés / congés BTP

Durées en jours ouvrés
(5 j/semaine, 7 h/jour)

Calendrier : jours fériés français ; congés BTP du 02/08 au 20/08/2027 ; fermeture du 27/12 au 31/12/2027.
Sous-lot en rouge : contient au moins une tâche du chemin critique (calculé sur la réception).
Durées des sous-lots : enveloppes calendaires en jours ouvrés, hors aléas intempéries.
