
Planning travaux sanitaires B28 - V.DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Notification des marchés	5 jrs	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
2	Préparation plan de retrait et	15 jrs	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
3	Instruction Plan de Retrait et	25 jrs	Lun 25/01/27	Ven 26/02/27
4	Dépose des luminaires et des équipements électriques	1 jr	Lun 26/04/27	Lun 26/04/27
5	Dépose des équipements sanitaires	2 jrs	Mar 27/04/27	Mer 28/04/27
6	Dépose des bouches de ventilations	1 jr	Mar 27/04/27	Mar 27/04/27
7	Dépose faux plafond	2 jrs	Mer 28/04/27	Jeu 29/04/27
8	Confinement sanitaire 11	5 jrs	Ven 30/04/27	Lun 10/05/27
9	Désamiantage sanitaire 11	4 jrs	Mar 11/05/27	Ven 14/05/27
10	Déconfinement sanitaire 11	4 jrs	Mar 18/05/27	Ven 21/05/27
11	Démolition sanitaire 1	5 jrs	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27
12	Cloisonnement	9 jrs	Lun 31/05/27	Jeu 10/06/27
13	Passage des réseaux électriques	3 jrs	Lun 31/05/27	Mer 02/06/27
14	Pose des réseaux et des bâtis supports	5 jrs	Ven 11/06/27	Jeu 17/06/27
15	Pose faux plafond	3 jrs	Ven 18/06/27	Mar 22/06/27
16	pose luminaires et bouches de ventilation	1 jr	Mer 23/06/27	Mer 23/06/27
17	carrelage	7 jrs	Mer 23/06/27	Jeu 01/07/27
18	Faience	7 jrs	Ven 02/07/27	Lun 12/07/27
19	Habillage des bâtits supports	5 jrs	Mar 13/07/27	Mar 20/07/27
20	Pose des équipements	4 jrs	Mer 21/07/27	Lun 26/07/27
21	Pose flash	1 jr	Mar 13/07/27	Mar 13/07/27
22	Peinture, pose miroir	5 jrs	Mar 27/07/27	Lun 23/08/27
23	Ménage	1 jr	Mar 24/08/27	Mar 24/08/27
24	Confinement sanitaire 12	4 jrs	Mar 11/05/27	Ven 14/05/27
25	Désamiantage sanitaire 12	4 jrs	Mar 18/05/27	Ven 21/05/27
26	Déconfinement sanitaire 12	5 jrs	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27
27	Démolition sanitaire 1	5 jrs	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27
28	Cloisonnement	10 jrs	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
29	Passage des réseaux électriques	3 jrs	Lun 07/06/27	Mer 09/06/27
30	Pose des réseaux et des bâtis supports	5 jrs	Lun 21/06/27	Ven 25/06/27
31	Pose faux plafond	3 jrs	Lun 28/06/27	Mer 30/06/27
32	pose luminaires et bouches de ventilation	1 jr	Jeu 01/07/27	Jeu 01/07/27
33	carrelage	7 jrs	Jeu 01/07/27	Ven 09/07/27
34	Faience	7 jrs	Lun 12/07/27	Mer 21/07/27
35	Habillage des bâtits supports	5 jrs	Jeu 22/07/27	Mer 28/07/27
36	Pose des équipements	4 jrs	Jeu 29/07/27	Mar 24/08/27
37	Pose flash	1 jr	Jeu 22/07/27	Jeu 22/07/27
38	Peinture, pose miroir	5 jrs	Mer 25/08/27	Mar 31/08/27
39	Ménage	1 jr	Mer 01/09/27	Mer 01/09/27
40	Confinement sanitaire 13	4 jrs	Mar 18/05/27	Ven 21/05/27
41	Désamiantage sanitaire 13	5 jrs	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27
42	Déconfinement sanitaire 13	5 jrs	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27
43	Passage des réseaux électriques	2 jrs	Lun 07/06/27	Mar 08/06/27
44	Réalisation des réseaux en sous -sol	10 jrs	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
45	Pose des réseaux et des bâtis supports	5 jrs	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27
46	Pose faux plafond	3 jrs	Lun 14/06/27	Mer 16/06/27
47	pose luminaires et bouches de ventilation	1 jr	Jeu 17/06/27	Jeu 17/06/27
48	carrelage	5 jrs	Jeu 17/06/27	Mer 23/06/27
49	Faience	3 jrs	Jeu 24/06/27	Lun 28/06/27
50	Habillage des bâtits supports	1 jr	Mar 29/06/27	Mar 29/06/27
51	Pose des équipements sanitaires	2 jrs	Mer 30/06/27	Jeu 01/07/27
52	Pose flash	1 jr	Mar 29/06/27	Mar 29/06/27
53	Peinture, pose miroirs	3 jrs	Ven 02/07/27	Mar 06/07/27
54	Ménage	1 jr	Mer 07/07/27	Mer 07/07/27

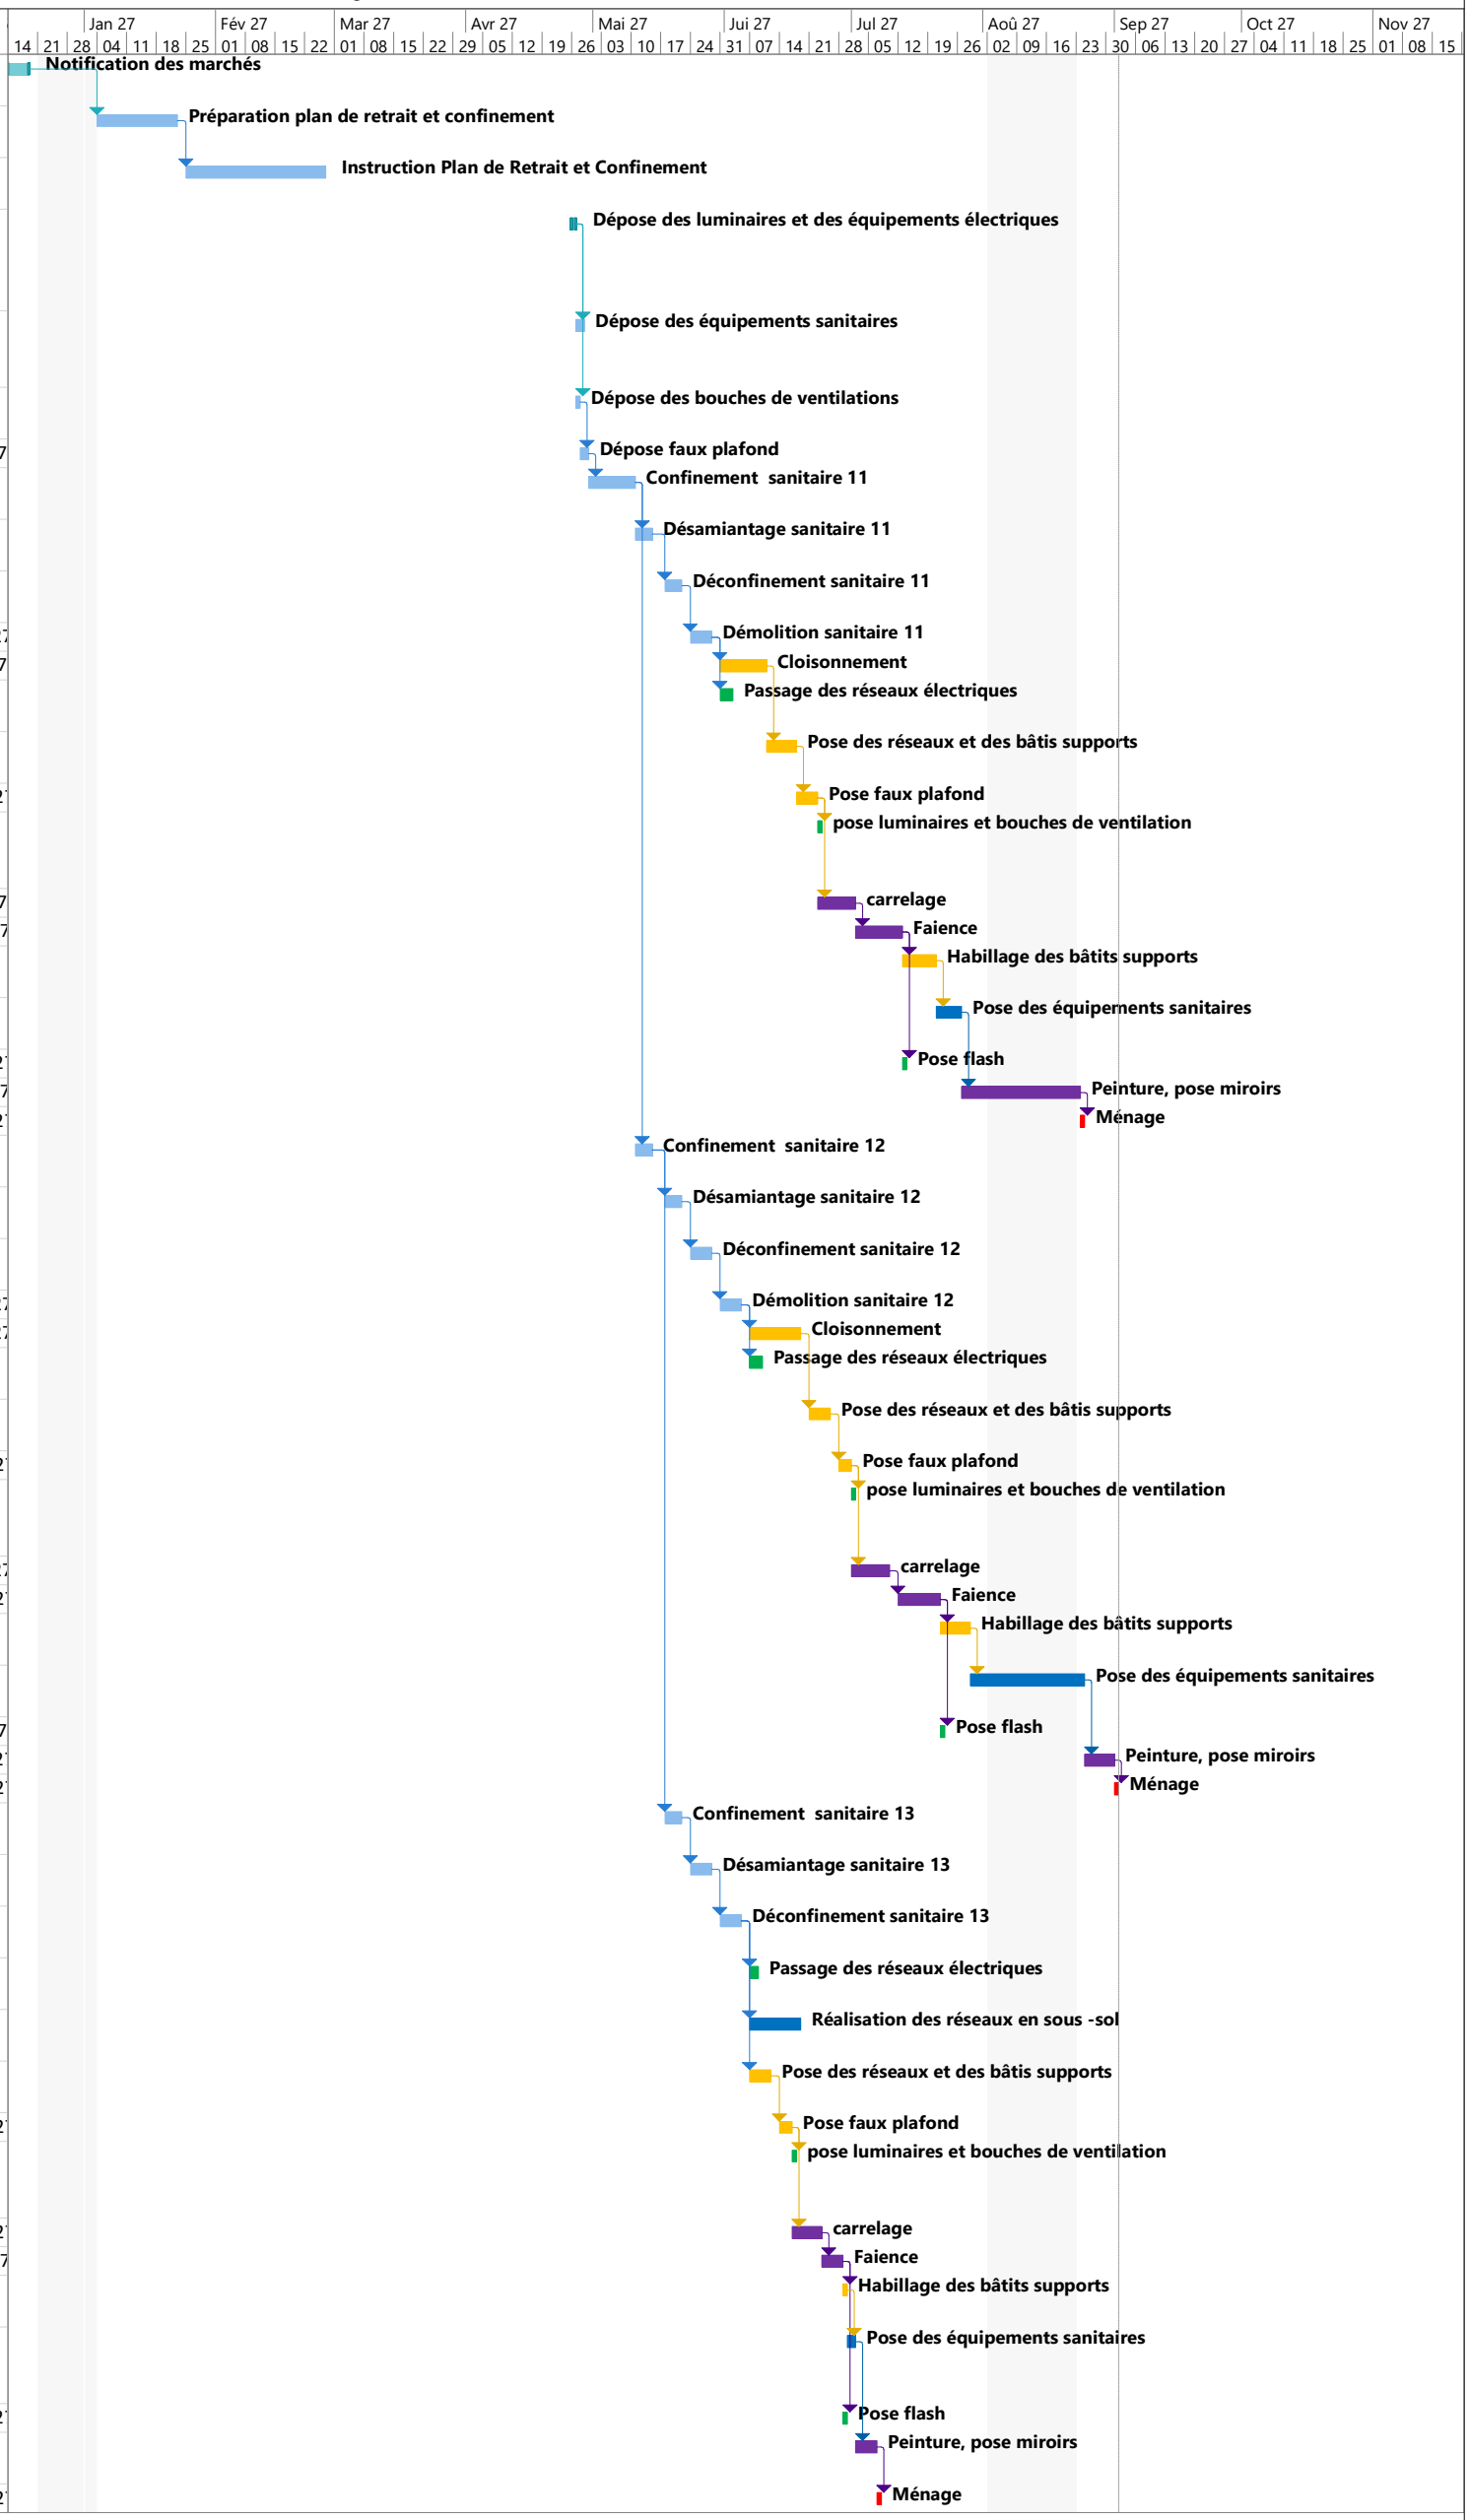

Projet : planning_sanitaire_B28
Date : Mer 14/10/26

Tâche	Tâche inactive	Report récapitulatif manuel	Jalons externes
Fractionnement	Jalon inactif	Récapitulatif manuel	Échéance
Jalon	Récapitulatif inactif	Début uniquement	Avancement
Récapitulative	Tâche manuelle	Fin uniquement	Progression manuelle
Récapitulatif du projet	Durée uniquement	Tâches externes	
