
Mise en conformité de la cuisine et remplacement des chambres froides du CMPR "Le Hohberg" à Sarreguemines

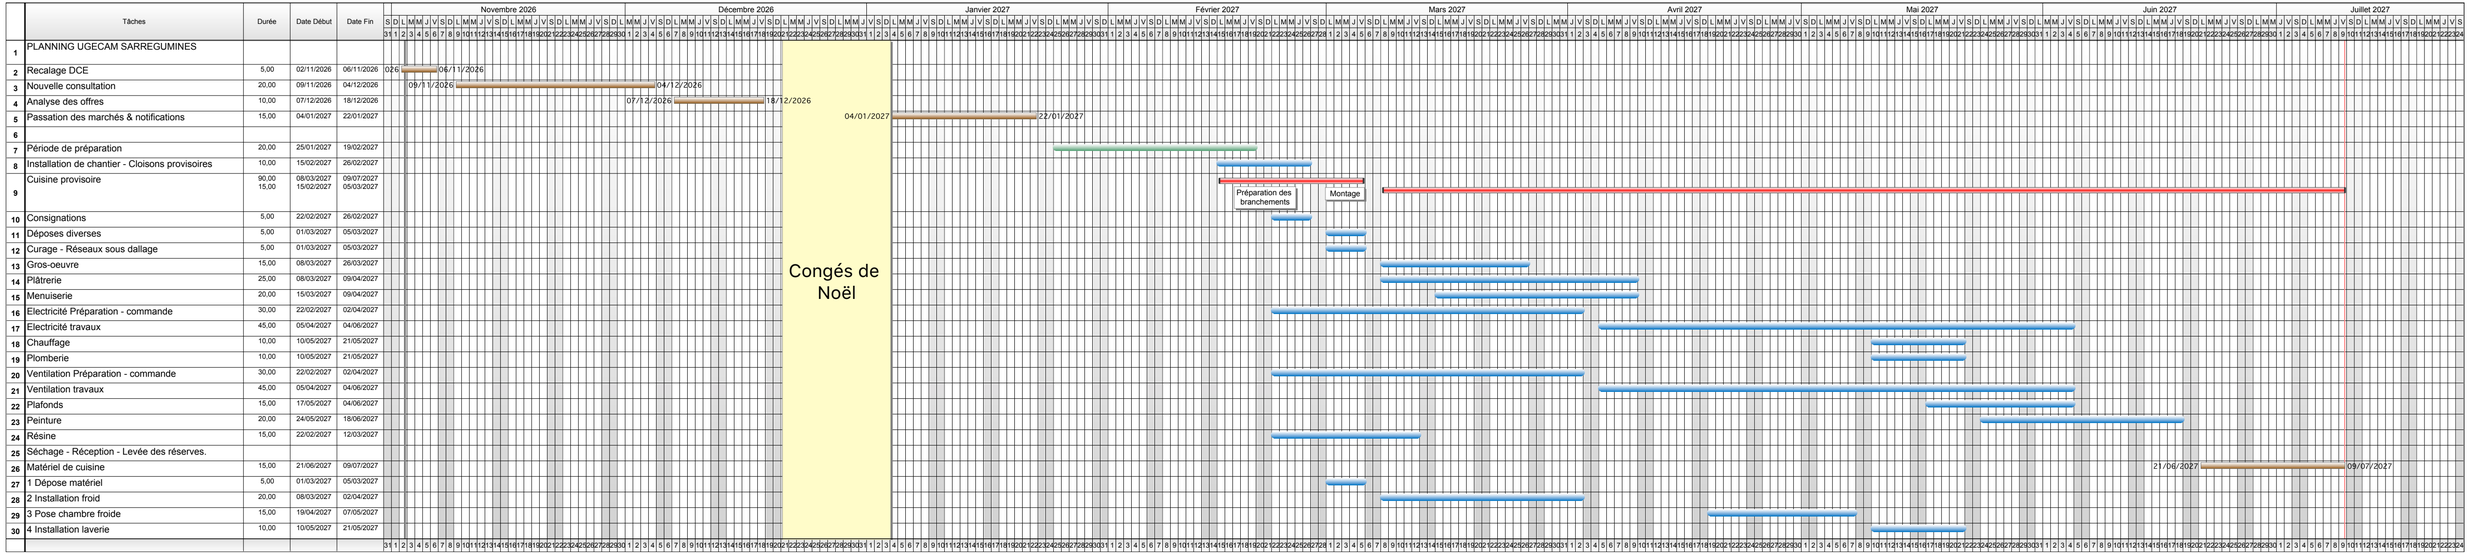

	Tâches	Durée	Date Début	Date Fin
1	PLANNING UGECAM SARREGUMINES			
2	Recalage DCE	5,00	02/11/2026	06/11/2026
3	Nouvelle consultation	20,00	09/11/2026	04/12/2026
4	Analyse des offres	10,00	07/12/2026	18/12/2026
5	Passation des marchés & notifications	15,00	04/01/2027	22/01/2027
6				
7	Période de préparation	20,00	25/01/2027	19/02/2027
8	Installation de chantier - Cloisons provisoires	10,00	15/02/2027	26/02/2027
9	Cuisine provisoire	90,00 15,00	08/03/2027 15/02/2027	09/07/2027 05/03/2027
10	Consignations	5,00	22/02/2027	26/02/2027
11	Déposes diverses	5,00	01/03/2027	05/03/2027
12	Curage - Réseaux sous dallage	5,00	01/03/2027	05/03/2027
13	Gros-oeuvre	15,00	08/03/2027	26/03/2027
14	Plâtrerie	25,00	08/03/2027	09/04/2027
15	Menuiserie	20,00	15/03/2027	09/04/2027
16	Electricité Préparation - commande	30,00	22/02/2027	02/04/2027
17	Electricité travaux	45,00	05/04/2027	04/06/2027
18	Chauffage	10,00	10/05/2027	21/05/2027
19	Plomberie	10,00	10/05/2027	21/05/2027
20	Ventilation Préparation - commande	30,00	22/02/2027	02/04/2027
21	Ventilation travaux	45,00	05/04/2027	04/06/2027
22	Plafonds	15,00	17/05/2027	04/06/2027
23	Peinture	20,00	24/05/2027	18/06/2027
24	Résine	15,00	22/02/2027	12/03/2027
25	Séchage - Réception - Levée des réserves.			
26	Matériel de cuisine	15,00	21/06/2027	09/07/2027
27	1 Dépose matériel	5,00	01/03/2027	05/03/2027
28	2 Installation froid	20,00	08/03/2027	02/04/2027
29	3 Pose chambre froide	15,00	19/04/2027	07/05/2027
30	4 Installation laverie	10,00	10/05/2027	21/05/2027

Atelier Bolzer Architectes
