


RU KB_DET_CALENDRIER D'EXE_260415

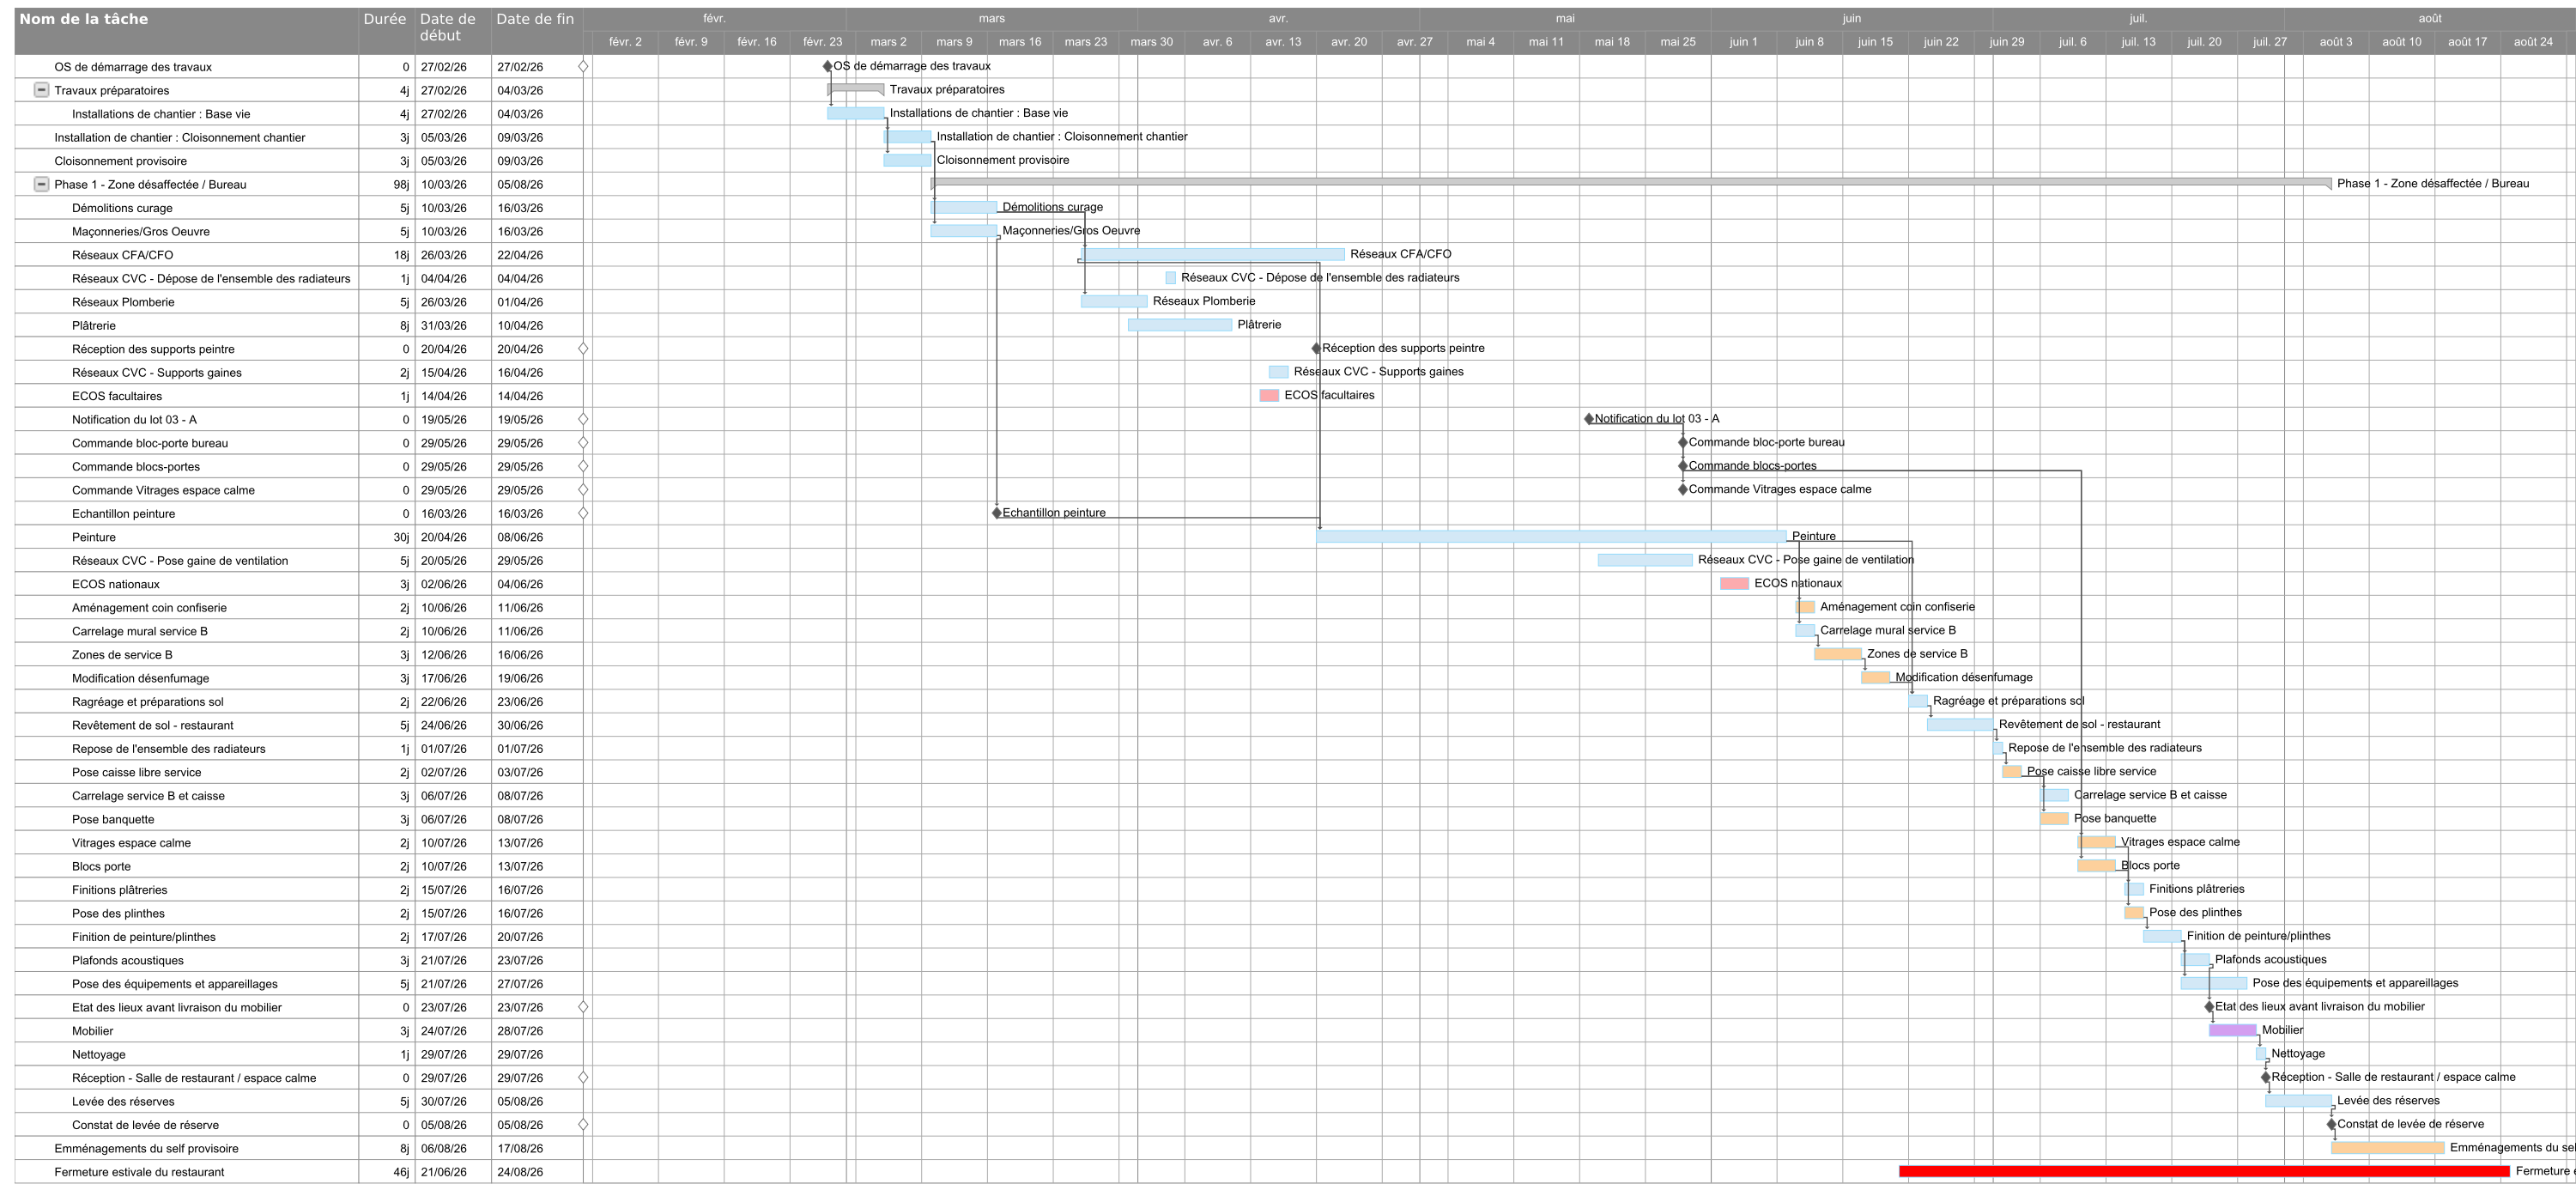

RU KB_DET_CALENDRIER D'EXE_260415

Nom de la tâche	Durée	Date de début	Date de fin	juil.					août				sept.				oct.				nov.				
				juin 29	juil. 6	juil. 13	juil. 20	juil. 27	août 3	août 10	août 17	août 24	août 31	sept. 7	sept. 14	sept. 21	sept. 28	oct. 5	oct. 12	oct. 19	oct. 26	nov. 2	nov. 9	nov. 16	nov. 23
Hall / Bureau	24j	07/07/26	10/08/26		Hall / Bureau																				
Démolitions curage	3j	07/07/26	09/07/26		Démolitions curage																				
Réseaux Plomberie	2j	10/07/26	13/07/26		Réseaux Plomberie																				
Réseaux CFA/CFO	5j	10/07/26	17/07/26		Réseaux CFA/CFO																				
Plâtrerie	5j	10/07/26	17/07/26		Plâtrerie																				
Modification des plafonds démontable - Hall	5j	16/07/26	22/07/26		Modification des plafonds démontable - Hall																				
Plafonds démontables - Bureau	4j	16/07/26	21/07/26		Plafonds démontables - Bureau																				
Encadrement MDF	2j	20/07/26	21/07/26		Encadrement MDF																				
Peinture	13j	20/07/26	05/08/26		Peinture																				
Revêtement de sol - Lino	2j	06/08/26	07/08/26		Revêtement de sol - Lino																				
Appareillage	2j	06/08/26	07/08/26		Appareillage																				
Traitement du sol	3j	06/08/26	10/08/26		Traitement du sol																				
Réception - Hall / Bureau	0	10/08/26	10/08/26		Réception - Hall / Bureau																				
Phase 2 - Restaurant existant	55j	20/08/26	04/11/26		Phase 2 - Restaurant existant																				
Démolitions curage	5j	20/08/26	26/08/26		Démolitions curage																				
Maçonneries/Gros Oeuvre	5j	20/08/26	26/08/26		Maçonneries/Gros Oeuvre																				
Blocs porte	2j	27/08/26	28/08/26		Blocs porte																				
Plâtrerie	3j	27/08/26	31/08/26		Plâtrerie																				
Réseaux CFA/CFO	5j	27/08/26	02/09/26		Réseaux CFA/CFO																				
Réseaux Plomberie	5j	27/08/26	02/09/26		Réseaux Plomberie																				
Réseaux CVC	5j	27/08/26	02/09/26		Réseaux CVC																				
Carrelage mural service A	2j	01/09/26	02/09/26		Carrelage mural service A																				
Dépose plat	2j	03/09/26	04/09/26		Dépose plat																				
Tablette sous fenêtre	3j	07/09/26	09/09/26		Tablette sous fenêtre																				
Peinture	25j	03/09/26	07/10/26		Peinture																				
Ragréage et préparations	2j	08/10/26	09/10/26		Ragréage et préparations																				
ECOS nationaux	5j	12/10/26	16/10/26		ECOS nationaux																				
Revêtement de sol - Résine zone de distribution	5j	19/10/26	23/10/26		Revêtement de sol - Résine zone de distribution																				
Plinthes	3j	26/10/26	28/10/26		Plinthes																				
Zones de service A	3j	26/10/26	28/10/26		Zones de service A																				
Carrelage service A	2j	29/10/26	30/10/26		Carrelage service A																				
Mobilier tables hautes	4j	26/10/26	29/10/26		Mobilier tables hautes																				
Banquette	2j	30/10/26	02/11/26		Banquette																				
Finition de peinture/plinthes	2j	26/10/26	27/10/26		Finition de peinture/plinthes																				
Rideau métallique	3j	28/10/26	30/10/26		Rideau métallique																				
Pose des équipements et appareillages	5j	26/10/26	30/10/26		Pose des équipements et appareillages																				
Installations provisoires	3j	02/11/26	04/11/26		Installations provisoires																				
Dépose cloison provisoire	1j	02/11/26	02/11/26		Dépose cloison provisoire																				
Reprises de peinture	2j	03/11/26	04/11/26		Reprises de peinture																				
Réceptions	11j	04/11/26	20/11/26		Réceptions																				
Etat des lieux avant livraison du mobilier	0	04/11/26	04/11/26		Etat des lieux avant livraison du mobilier																				
Equipements de cuisine	5j	05/11/26	12/11/26		Equipements de cuisine																				
Nettoyage	1j	13/11/26	13/11/26		Nettoyage																				
Réception	0	13/11/26	13/11/26		Réception																				
Levée des réserves	5j	16/11/26	20/11/26		Levée des réserves																				
Constat de levée de réserve	0	20/11/26	20/11/26		Constat de levée de réserve																				
Livraison	0	20/11/26	20/11/26		Livraison																				
