



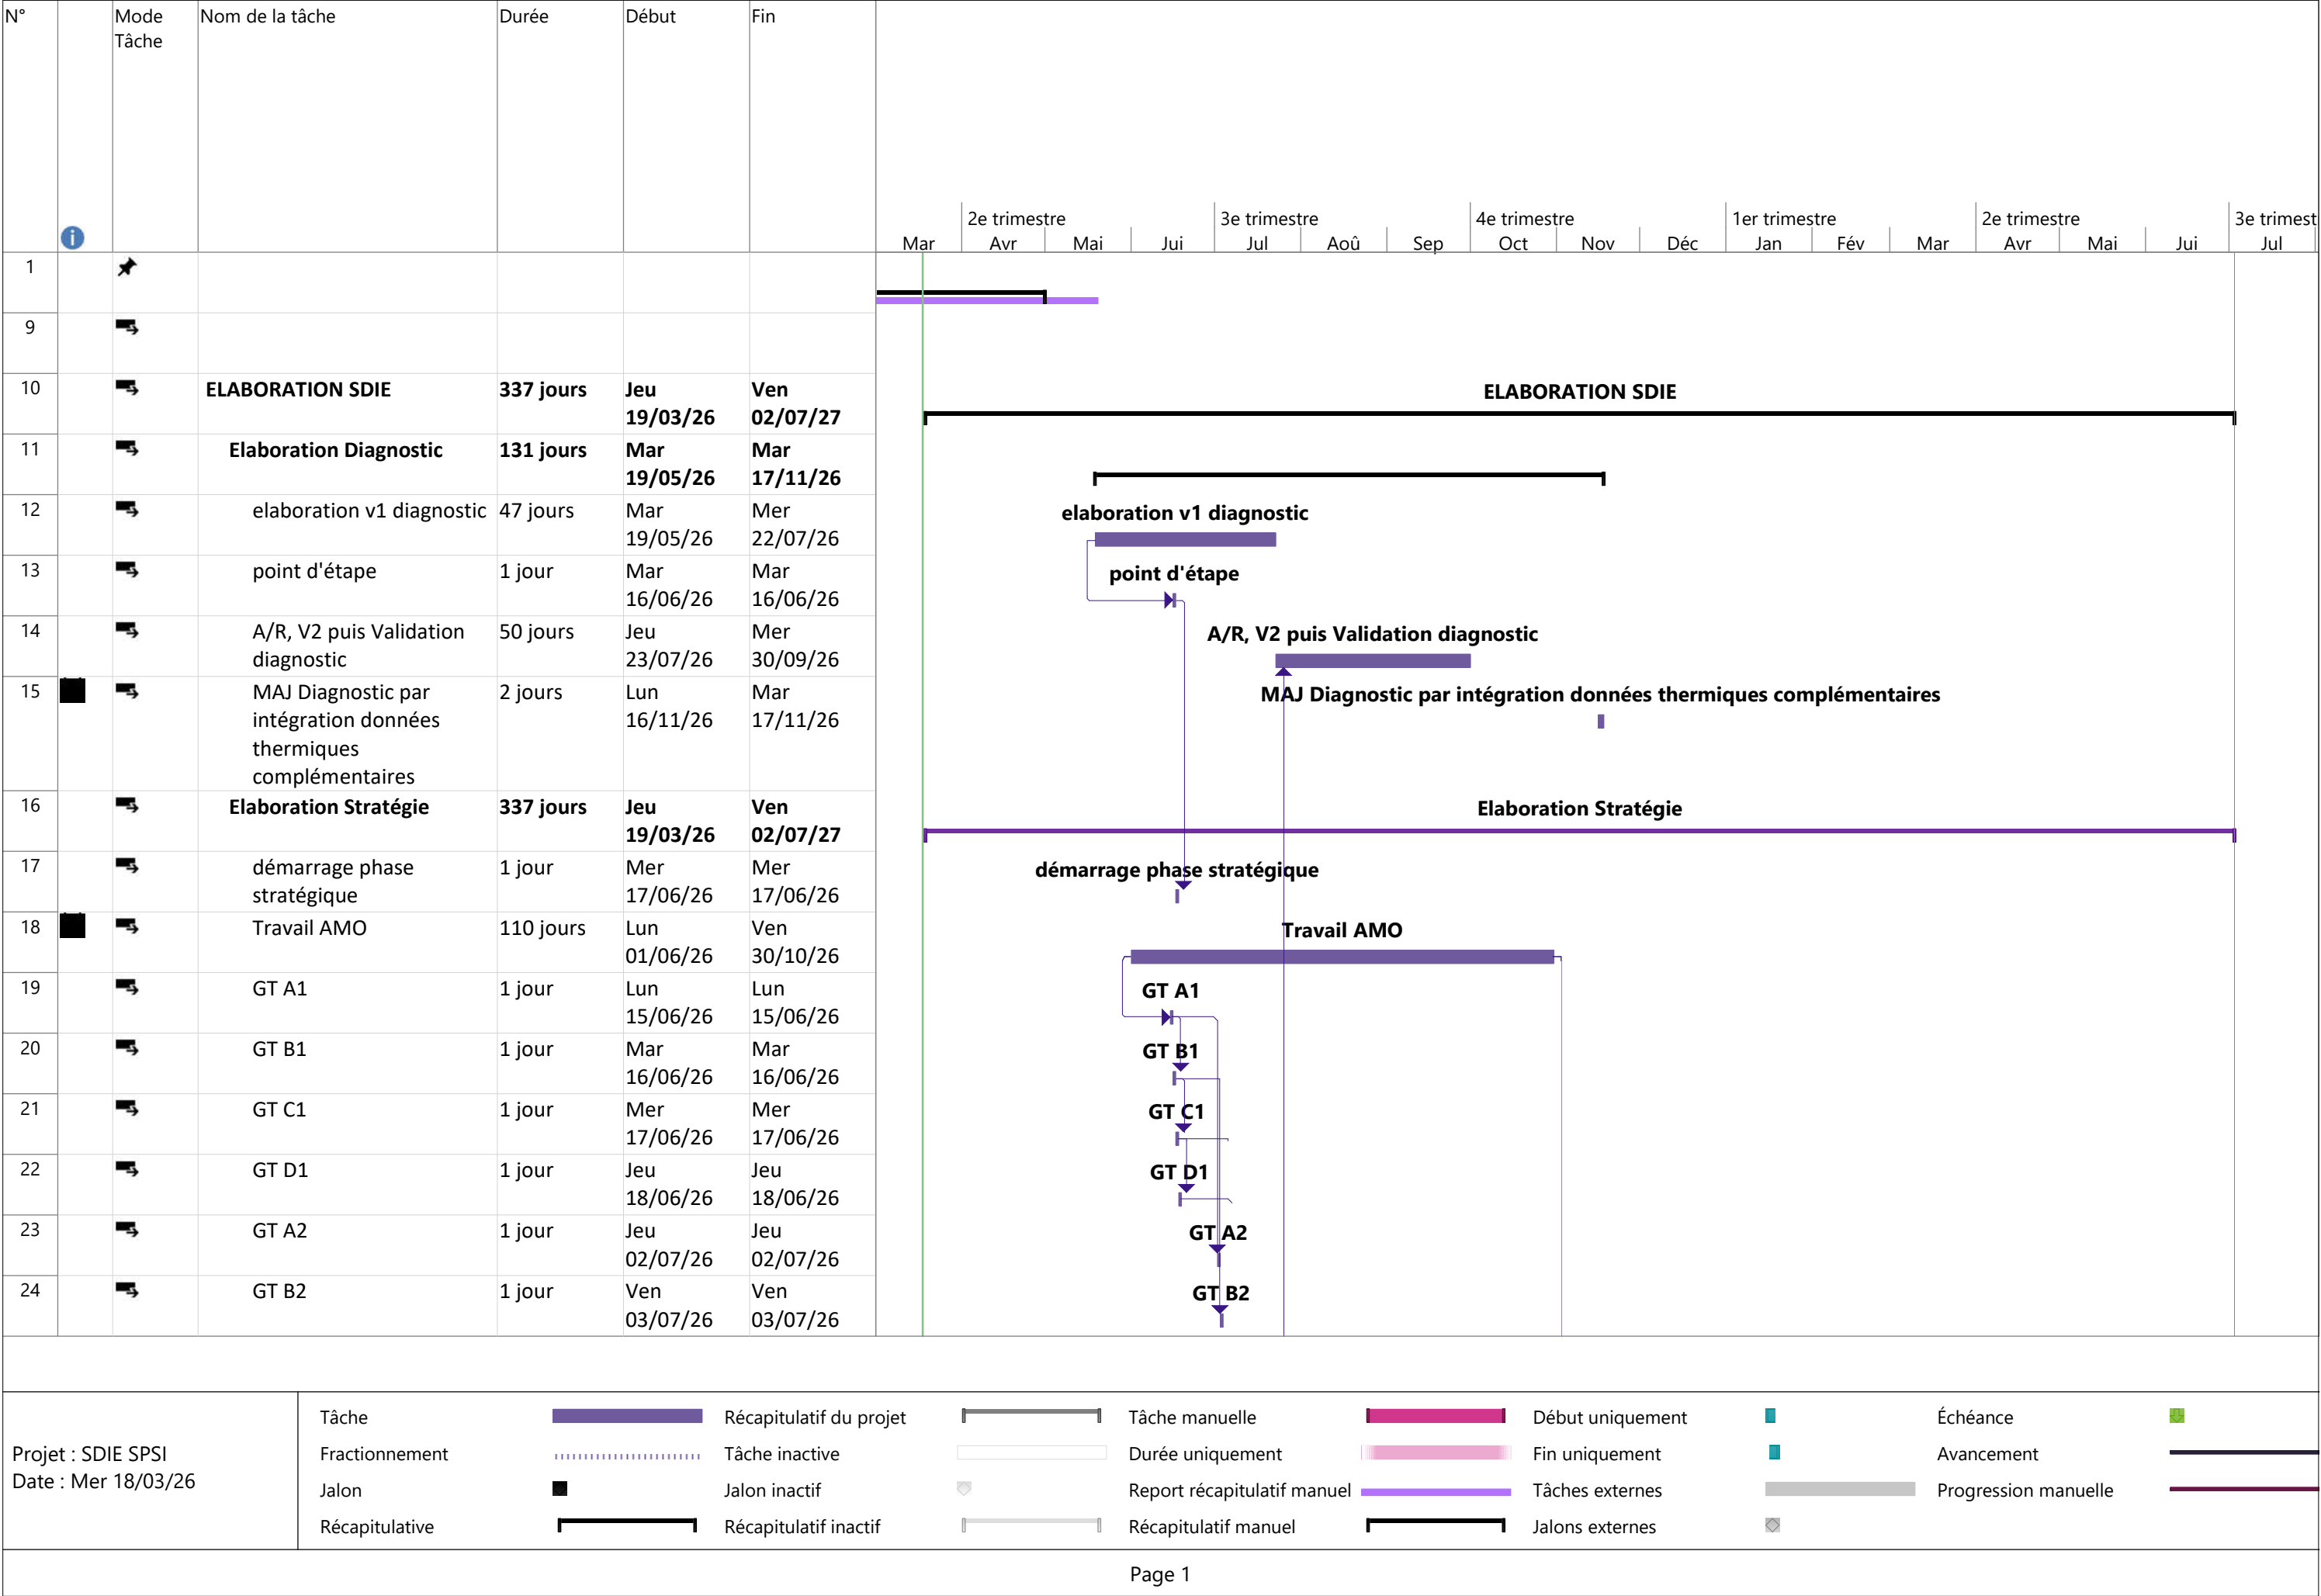

Page 1

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																					
							Mar	2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre			2e trimestre			3e trimest				
								Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul				
25			GT C2	1 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26																					
26			GT D2	1 jour	Mar 07/07/26	Mar 07/07/26																					
27			rendu V1 orientations	1 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26																					
28			A/R, V2 et validation	31 jours	Lun 02/11/26	Lun 14/12/26																					
29			Participation AMO échanges DIE instruction (2 ou 3 occurrences)	30 jours	Lun 01/02/27	Ven 12/03/27																					
30			Elaboration SPSI	337 jours	Jeu 19/03/26	Ven 02/07/27																					
31			DIAGNOSTIC SPSI	91 jours	Jeu 19/03/26	Jeu 23/07/26																					
32			Collecte données																								
33			(AMO) élaboration grille enquête	10 jours	Mer 20/05/26	Mar 02/06/26																					
34			(AMO) validation grille (FS	5 jours	Mer 03/06/26	Mar 09/06/26																					
35			(AMO + service SI ENS) diffusion enquêtes de confort	20 jours	Mer 10/06/26	Mar 07/07/26																					
36			(AMO) traitement enquête	11 jours	Mer 08/07/26	Mer 22/07/26																					
37			présentation résultats enquête	1 jour	Jeu 23/07/26	Jeu 23/07/26																					
38			(ComUE) lancement collecte résidents	15 jours	Jeu 19/03/26	Mer 08/04/26																					
39			(ComUE) calcul résidents sur base	7 jours	Jeu 09/04/26	Ven 17/04/26																					
40																											
41			STRATEGIE SPSI	219 jours	Mar 01/09/26	Ven 02/07/27																					
Projet : SDIE SPSI Date : Mer 18/03/26			Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance																
			Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement																
			Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle																
			Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes																		
Page 2																											

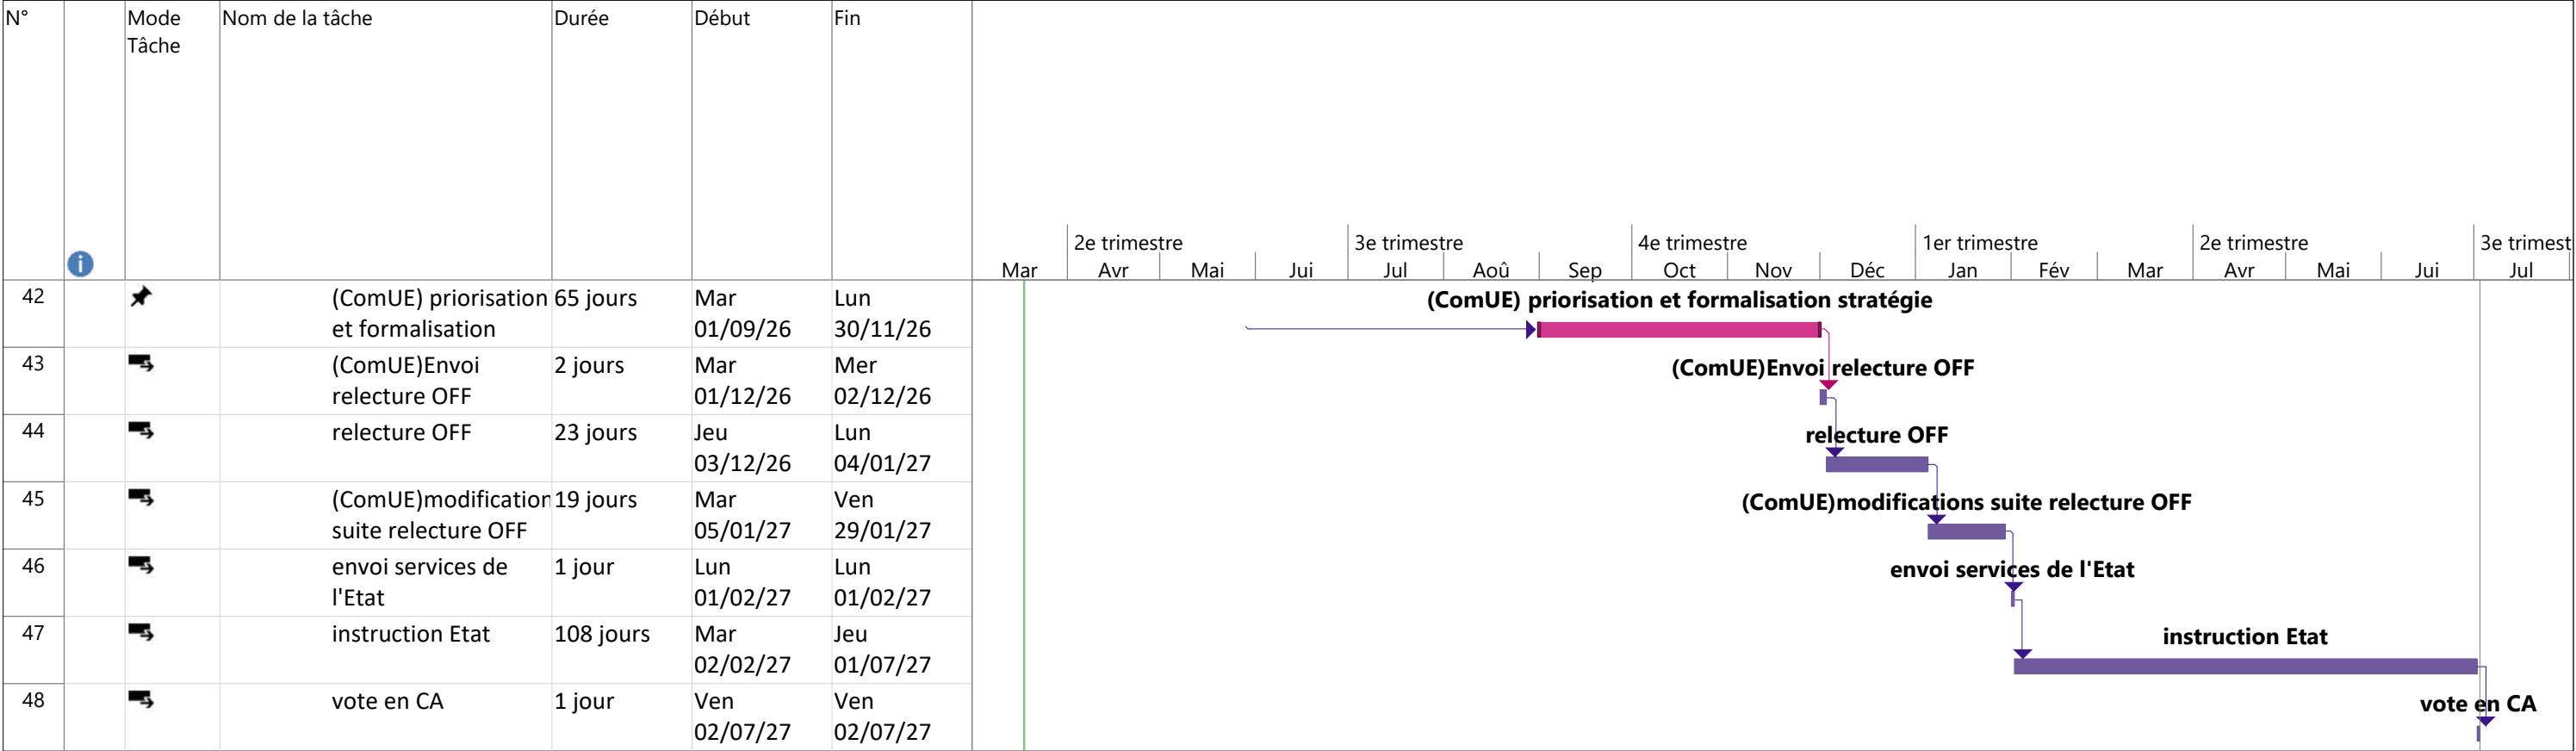

Projet : SDIE SPSI Date : Mer 18/03/26	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			
