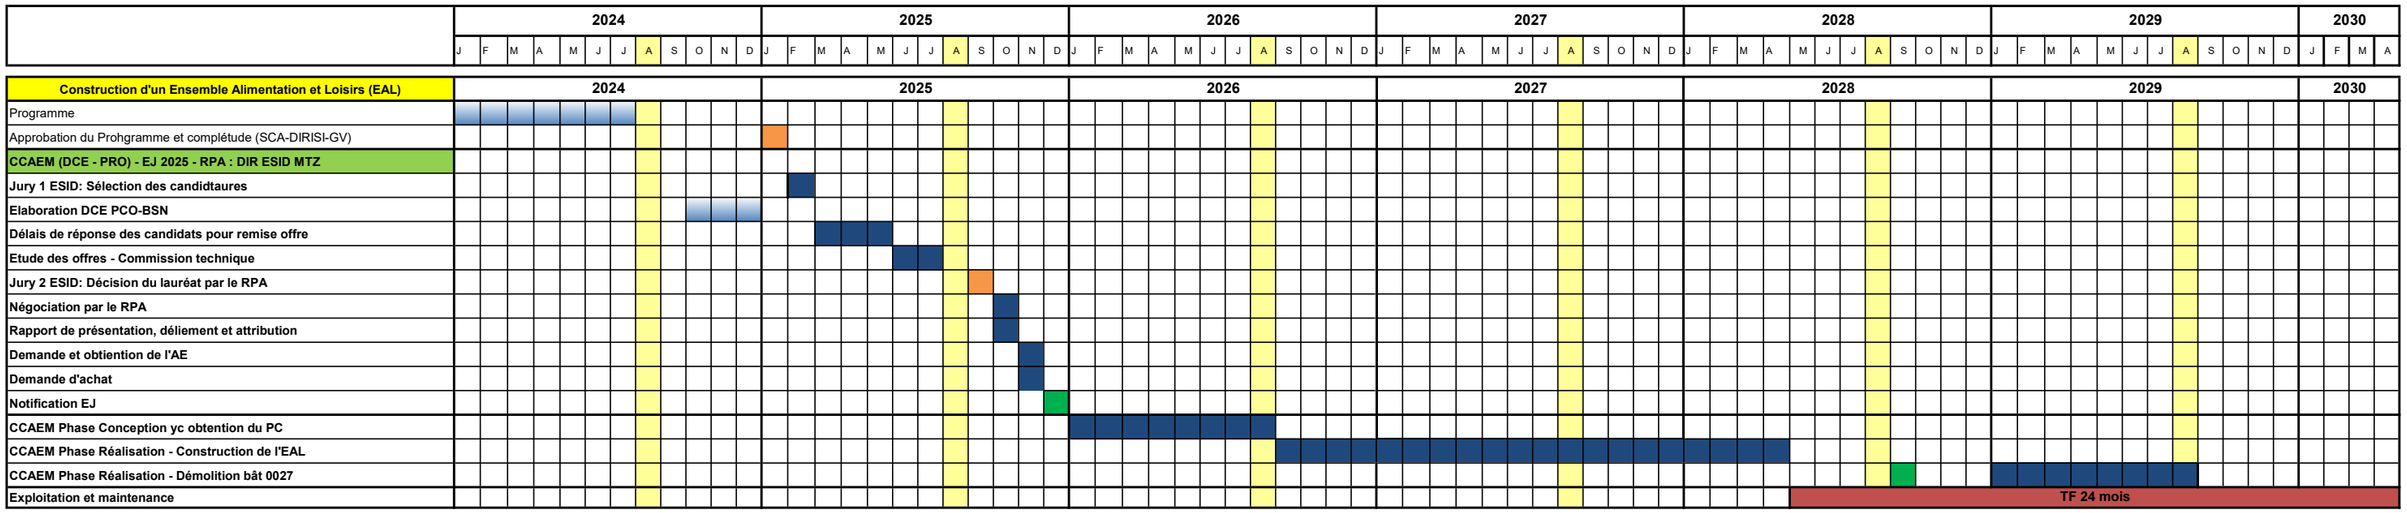
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
J F M A M J J A S O N D
Construction d'un Ensemble Alimentation et Loisirs (EAL)
Programme
Approbation du Prohgramme et complétude (SCA-DIRISI-GV)
CCAEM (DCE - PRO) - EJ 2025 - RPA : DIR ESID MTZ
Jury 1 ESID: Sélection des candidtaures
Elaboration DCE PCO-BSN
Délais de réponse des candidats pour remise offre
Etude des offres - Commission technique
Jury 2 ESID: Décision du lauréat par le RPA
Négociation par le RPA
Rapport de présentation, déliement et attribution
Demande et obtiention de l'AE
Demande d'achat
Notification EJ
CCAEM Phase Conception yc obtention du PC
CCAEM Phase Réalisation - Construction de l'EAL
CCAEM Phase Réalisation - Démolition bât 0027
Exploitation et maintenance
TF 24 mois
