MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU RU TECHNOPOLE - METZ

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**RU CROUS TECHNOPOLE**		
2			
3	APPEL D'OFFRES	28/04	23/05
4	ACT	26/05	30/05
5			
6	Notification entreprises		06/06
7			
8	Préparation de chantier		
9			
10	**Exécution des travaux**		
11	Fondations pour EPMR	07/07	11/07
12	Plancher collaborant	15/07	21/07
13			
14	Approvisionnement	23/06	16/09
15	Pose EPMR	20/10	31/10
16			
17	Rénovaiton des sanitaires	07/07	19/08
18			
19	Approvisionnement	07/07	19/08
20	Remplacement des portes	20/08	22/08
21			
22	Approvisionnement	07/07	28/07
23	Signalisations	29/07	04/08

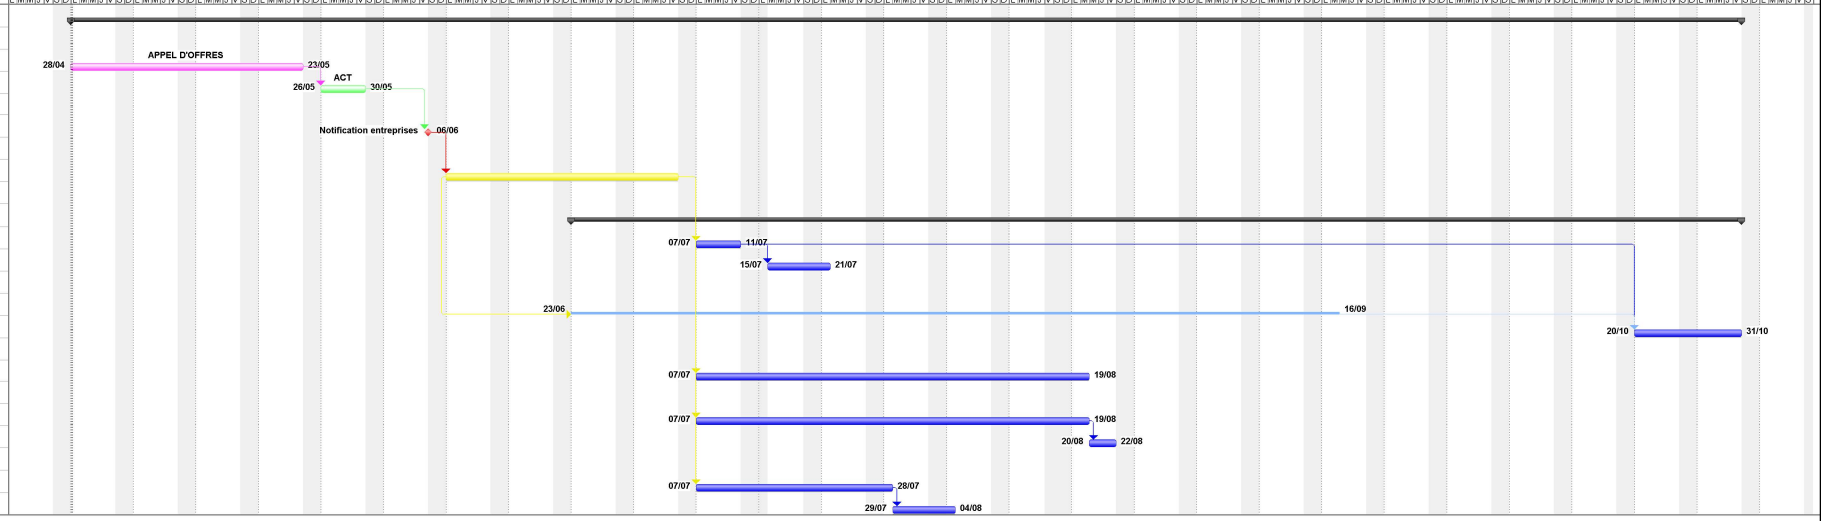

Projet : Mise en accessibilité du RU - Date : Lun 28/04/25

Tâche | Fractionnement | Avancement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâches externes | Jalons externes | Échéance
