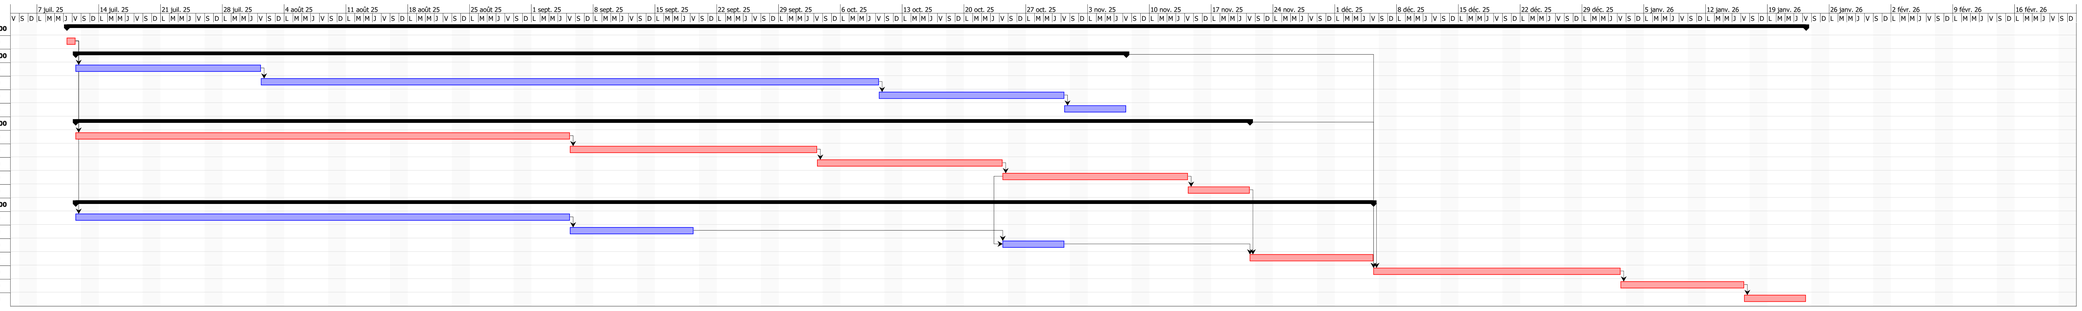	Nom	Durée	Début	Fin
1	**CRÉATION D'UN RÉSEAU D'HÉLIUM GAZEUX DE RECYCLAGE DU CBM**	**123,375 jo...**	**10/07/25 09:00**	**23/01/26 09:00**
2	Notification des marchés	1 jour	10/07/25 09:00	11/07/25 09:00
3	**Travaux de conception et intallation des équipements Lot 1**	**74,375 jours**	**11/07/25 09:00**	**07/11/25 09:00**
4	Phases études et commandes	15 jours	11/07/25 09:00	01/08/25 09:00
5	Attente livraisons	30 jours	01/08/25 09:00	10/10/25 09:00
6	Phase d'installation	15 jours	10/10/25 09:00	31/10/25 09:00
7	Mise en service	5 jours	31/10/25 09:00	07/11/25 09:00
8	**Travaux de conception et intallation des réseaux d'hélium gazeux Lot 2**	**83,125 jours**	**11/07/25 09:00**	**21/11/25 09:00**
9	Phases études et commandes	20 jours	11/07/25 09:00	05/09/25 09:00
10	Attente livraisons	20 jours	05/09/25 09:00	03/10/25 09:00
11	Phase de mise en oeuvre réseau CBM	15 jours	03/10/25 09:00	24/10/25 09:00
12	Phase de mise en oeuvre réseau extérieur	15 jours	24/10/25 09:00	14/11/25 09:00
13	Mise en service	5 jours	14/11/25 09:00	21/11/25 09:00
14	**Travaux de VRD lot 3**	**91,875 jours**	**11/07/25 09:00**	**05/12/25 09:00**
15	Phases études et commandes	20 jours	11/07/25 09:00	05/09/25 09:00
16	Attente livraisons	10 jours	05/09/25 09:00	19/09/25 09:00
17	Phase terrassement	5 jours	24/10/25 09:00	31/10/25 09:00
18	Phase travaux VRD (rebouchage et finitions)	10 jours	21/11/25 09:00	05/12/25 09:00
19	Réception	20 jours	05/12/25 09:00	02/01/26 09:00
20	Fourniture DOE après réception travaux	10 jours	02/01/26 09:00	16/01/26 09:00
21	Validation DOE	5 jours	16/01/26 09:00	23/01/26 09:00
