PLANNING ENVELOPPE DCE
PHARMACIE RENEE SABRAN

N°	Mod Tâch	Nom de la tâche	Durée
1		**REHABILITATION PHARMACIE RENEE SABRAN**	**342 jours**
2		OS DE NOTIFICATION	1 jour
3		PREPARATION DE CHANTIER	20 jours
4		ENVOIE PLAN DE RETRAIT (POUR LES 2 PHASES)	1 jour
5		DELAI DE VALIDATION DU PLAN DE RETRAIT	20 jours
6		**PHASE 1A - DESAMIANTAGE RDC HAUT + RDC BAS PARTIEL + RDC DE COUR**	**20 jours**
7		DESAMIANTAGE RDC HAUT	15 jours
8		MESURES LIBERATOIRES ET RECEPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE	5 jours
9		**PHASE 1B - TRAVAUX RDC HAUT + RDC BAS PARTIEL + RDC DE COUR**	**197 jours**
10		CURAGE LOCAUX	10 jours
11		GROS OEUVRE ET CREATION QUAI DE LIVRAISON - LOCAUX EXTERIEURS (Déchets/O2/Local PAC)	50 jours
12		ETANCHEITE	10 jours
13		MENUISERIES EXTERIEURES	5 jours
14		RESEAU PLOMBERIE - ELECTRICITE	15 jours
15		REVETEMENTS SOLS ET MURS	15 jours
16		MENUISERIES INTERIEURES	10 jours
17		PEINTURE - FAUX PLAFONDS	20 jours
18		EQUIPEMENT PLOMBERIE ET ELECTRICITE	5 jours
19		VOIRIE	10 jours
20		**OPR - RECEPTION PHASE 1**	**15 jours**
21		OPR	1 jour
22		LEVEE DE RESERVES	13 jours
23		RECEPTION	1 jour
24		**TRANSFERT PHARMACIE PAR LE MO - SUSPENSION DE TRAVAUX**	5 jours
25		**PHASE 2A - DESAMINATAGE RDC BAS**	**15 jours**
26		DESAMIANTAGE RDC BAS	10 jours
27		MESURES LIBERATOIRES ET RECEPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE	5 jours
28		**PHASE 2B - TRAVAUX RDC BAS**	**123 jours**
29		CURAGE LOCAUX	10 jours
30		GROS ŒUVRE ET MODIFICATION DE L'ANCIEN QUAI DE LIVRAISON	40 jours
31		MENUISERIES EXTERIEURES	5 jours
32		ITE	30 jours
33		CLOISONS	10 jours
34		RESEAU PLOMBERIE - ELECTRICITE	10 jours
35		REVETEMENTS SOLS ET MURS	10 jours
36		MENUISERIES INTERIEURES	5 jours
37		PEINTURE - FAUX PLAFONDS	15 jours
38		EQUIPEMENT PLOMBERIE ET ELECTRICITE	5 jours
39		**OPR - RECEPTION ZONE ESCALIER ET MONTE PERSONNE RDC HAUT**	**13 jours**
40		OPR	1 jour
41		LEVEE DE RESERVES	11 jours
42		RECEPTION	1 jour

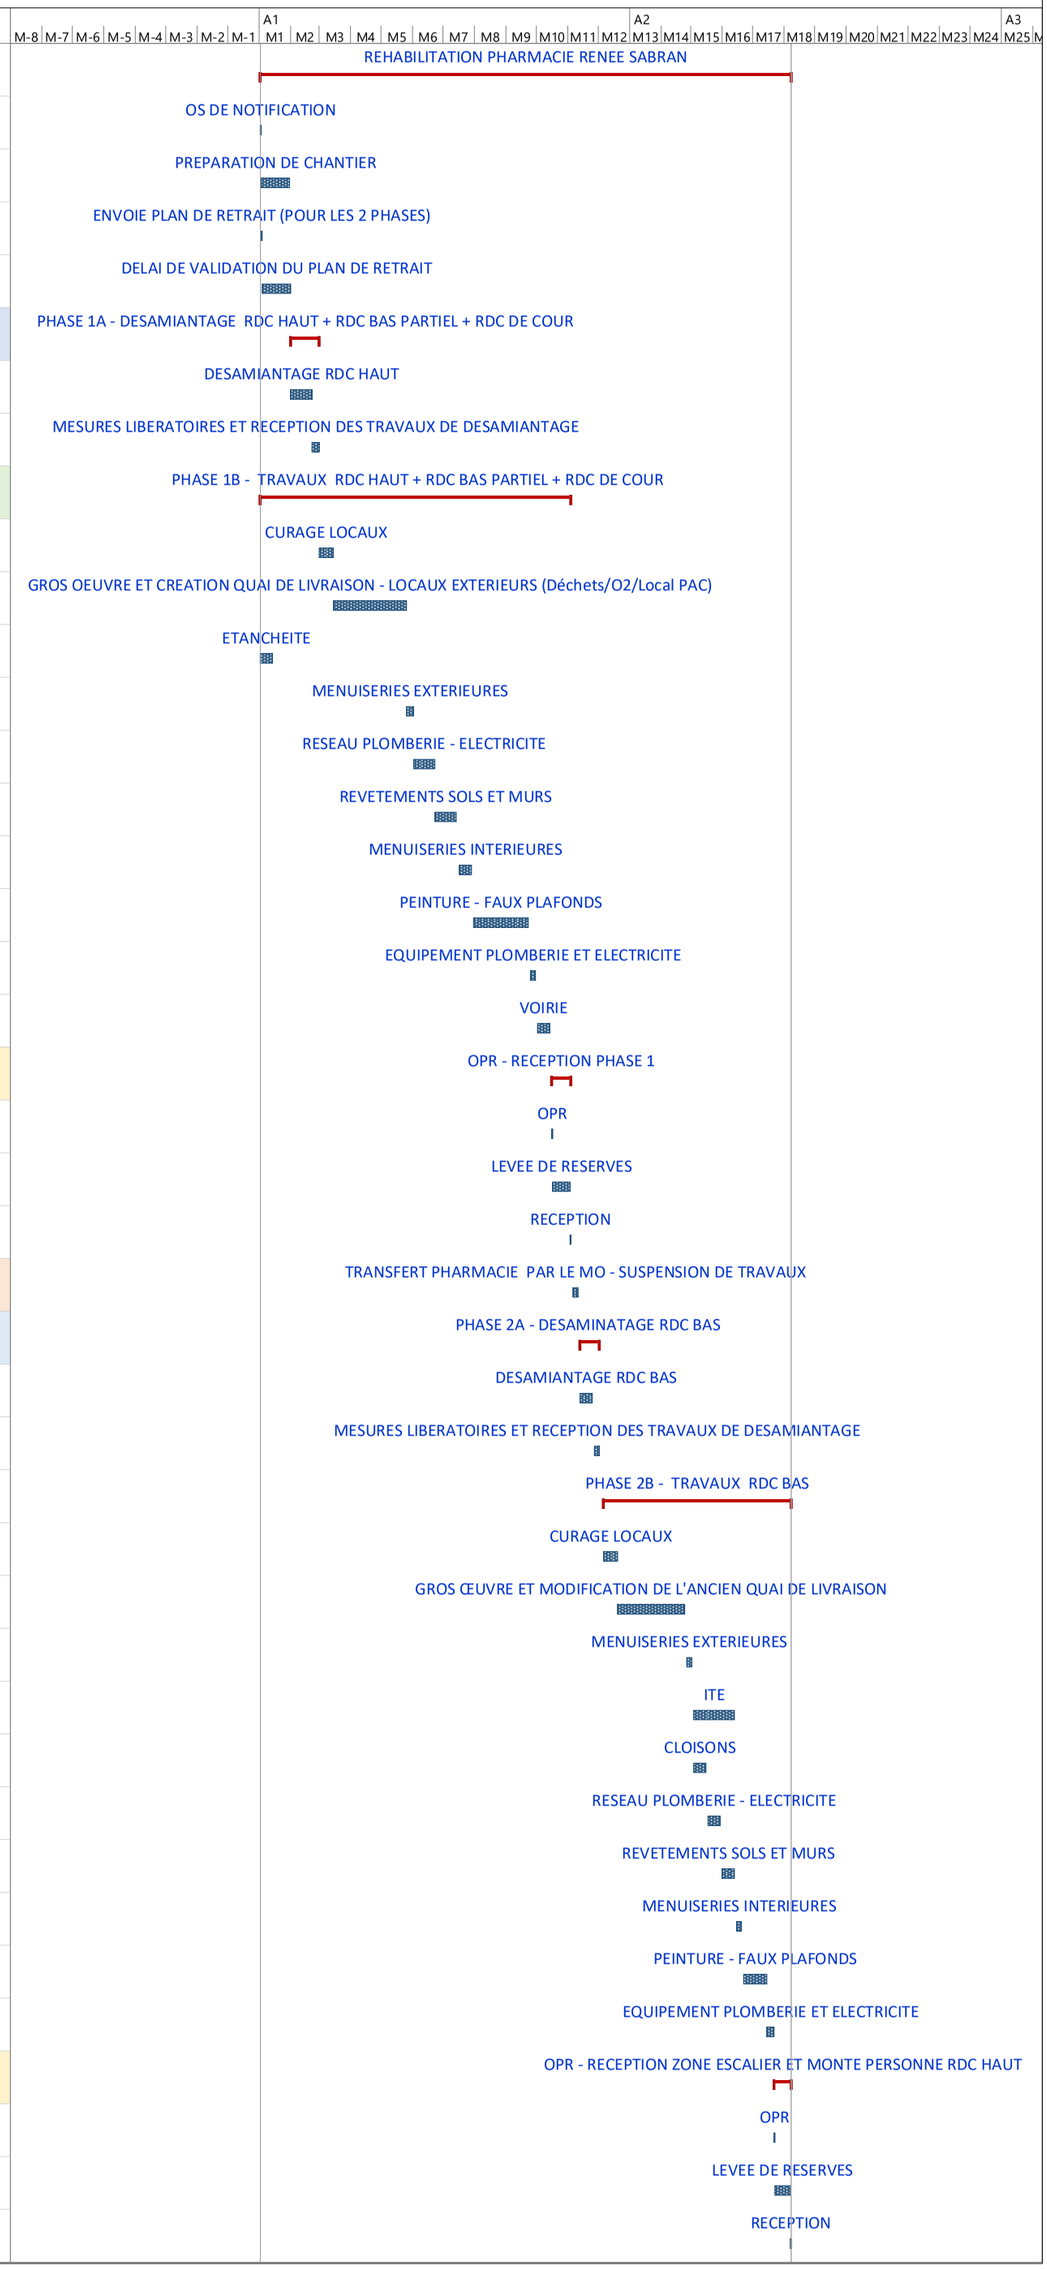

ECHELLE 1:1,05 | DATE Avril 2025

PHASE DCE | INDICE A

NUMÉRO I-2b

INTITULÉ
Phasage et planning travaux

N° d'opération : 250104

PUI - Réaménagement et mise en conformité du bâtiment - niveau supérieur : aménagement des anciens laboratoires pour l'accueil de l'administration

MAÎTRISE D'OEUVRE

145 A, rue Alexandre Borrely - 83000 TOULON
bbg.architectes@wanadoo.fr
04 98 01 30 30 - www.bbgarchitectes.com

MAÎTRISE D'OUVRAGE

GROUPEMENT HOSPITALIER RENEE SABRAN
Hôpital Renée Sabran - bd Edouard Herriot - Giens - 83400 HYERES
