CALENDRIER PREVISIONNEL
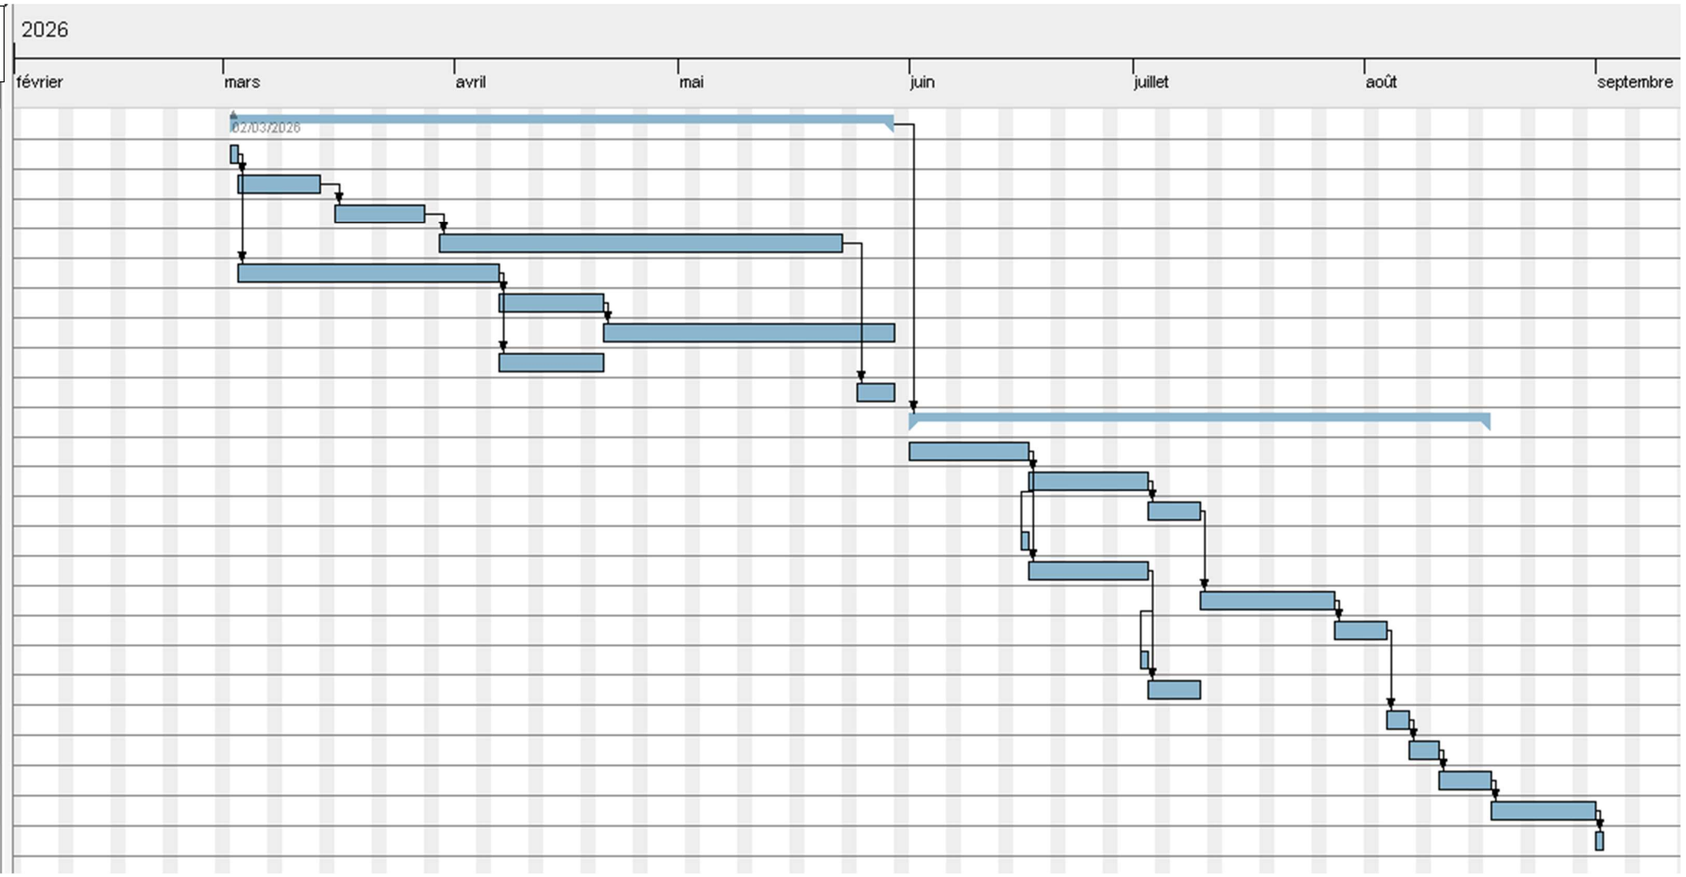
Nom	Date de début	Date de fin
PERIODE DE PREPARATION	02/03/2026	29/05/2026
Réunion de préparation	02/03/2026	02/03/2026
Remise DC4 sous-traitants	03/03/2026	13/03/2026
Remise demandes CPR tous intervenants	16/03/2026	27/03/2026
Retours demandes CPR	30/03/2026	22/05/2026
Relevés d'implantation / Etudes d'exécution	03/03/2026	06/04/2026
VISA Moe et CT	07/04/2026	20/04/2026
Commandes / Mise en fabrication / Appro 1	21/04/2026	29/05/2026
PIC, PPSPS tous intervenants	07/04/2026	20/04/2026
Installation de chantier	25/05/2026	29/05/2026
EXECUTION DES TRAVAUX	01/06/2026	17/08/2026
Charpentes Bât 01-03-05-07	01/06/2026	16/06/2026
Couvertures Bât 01-03-05-07	17/06/2026	02/07/2026
Habillages - Zingueries Bât 01-03-05-07	03/07/2026	09/07/2026
Appro 2	16/06/2026	16/06/2026
Charpentes Bât 02-04-06	17/06/2026	02/07/2026
Couvertures Bât 02-04-06	10/07/2026	27/07/2026
Habillages - Zingueries Bât 02-04-06	28/07/2026	03/08/2026
Appro 3	02/07/2026	02/07/2026
Charpentes Bât 10	03/07/2026	09/07/2026
Couvertures Bât 10	04/08/2026	06/08/2026
Habillages - Zingueries Bât 10	07/08/2026	10/08/2026
Divers (mises à la terre, rebouchages, retouches...)	11/08/2026	17/08/2026
OPR	18/08/2026	31/08/2026
RECEPTION	01/09/2026	01/09/2026
