Jeu 03/07/25

PLANNING PREVISIONNEL - CROUS ANGO - MONT ST AIGNAN

Ce planning tient compte des congés
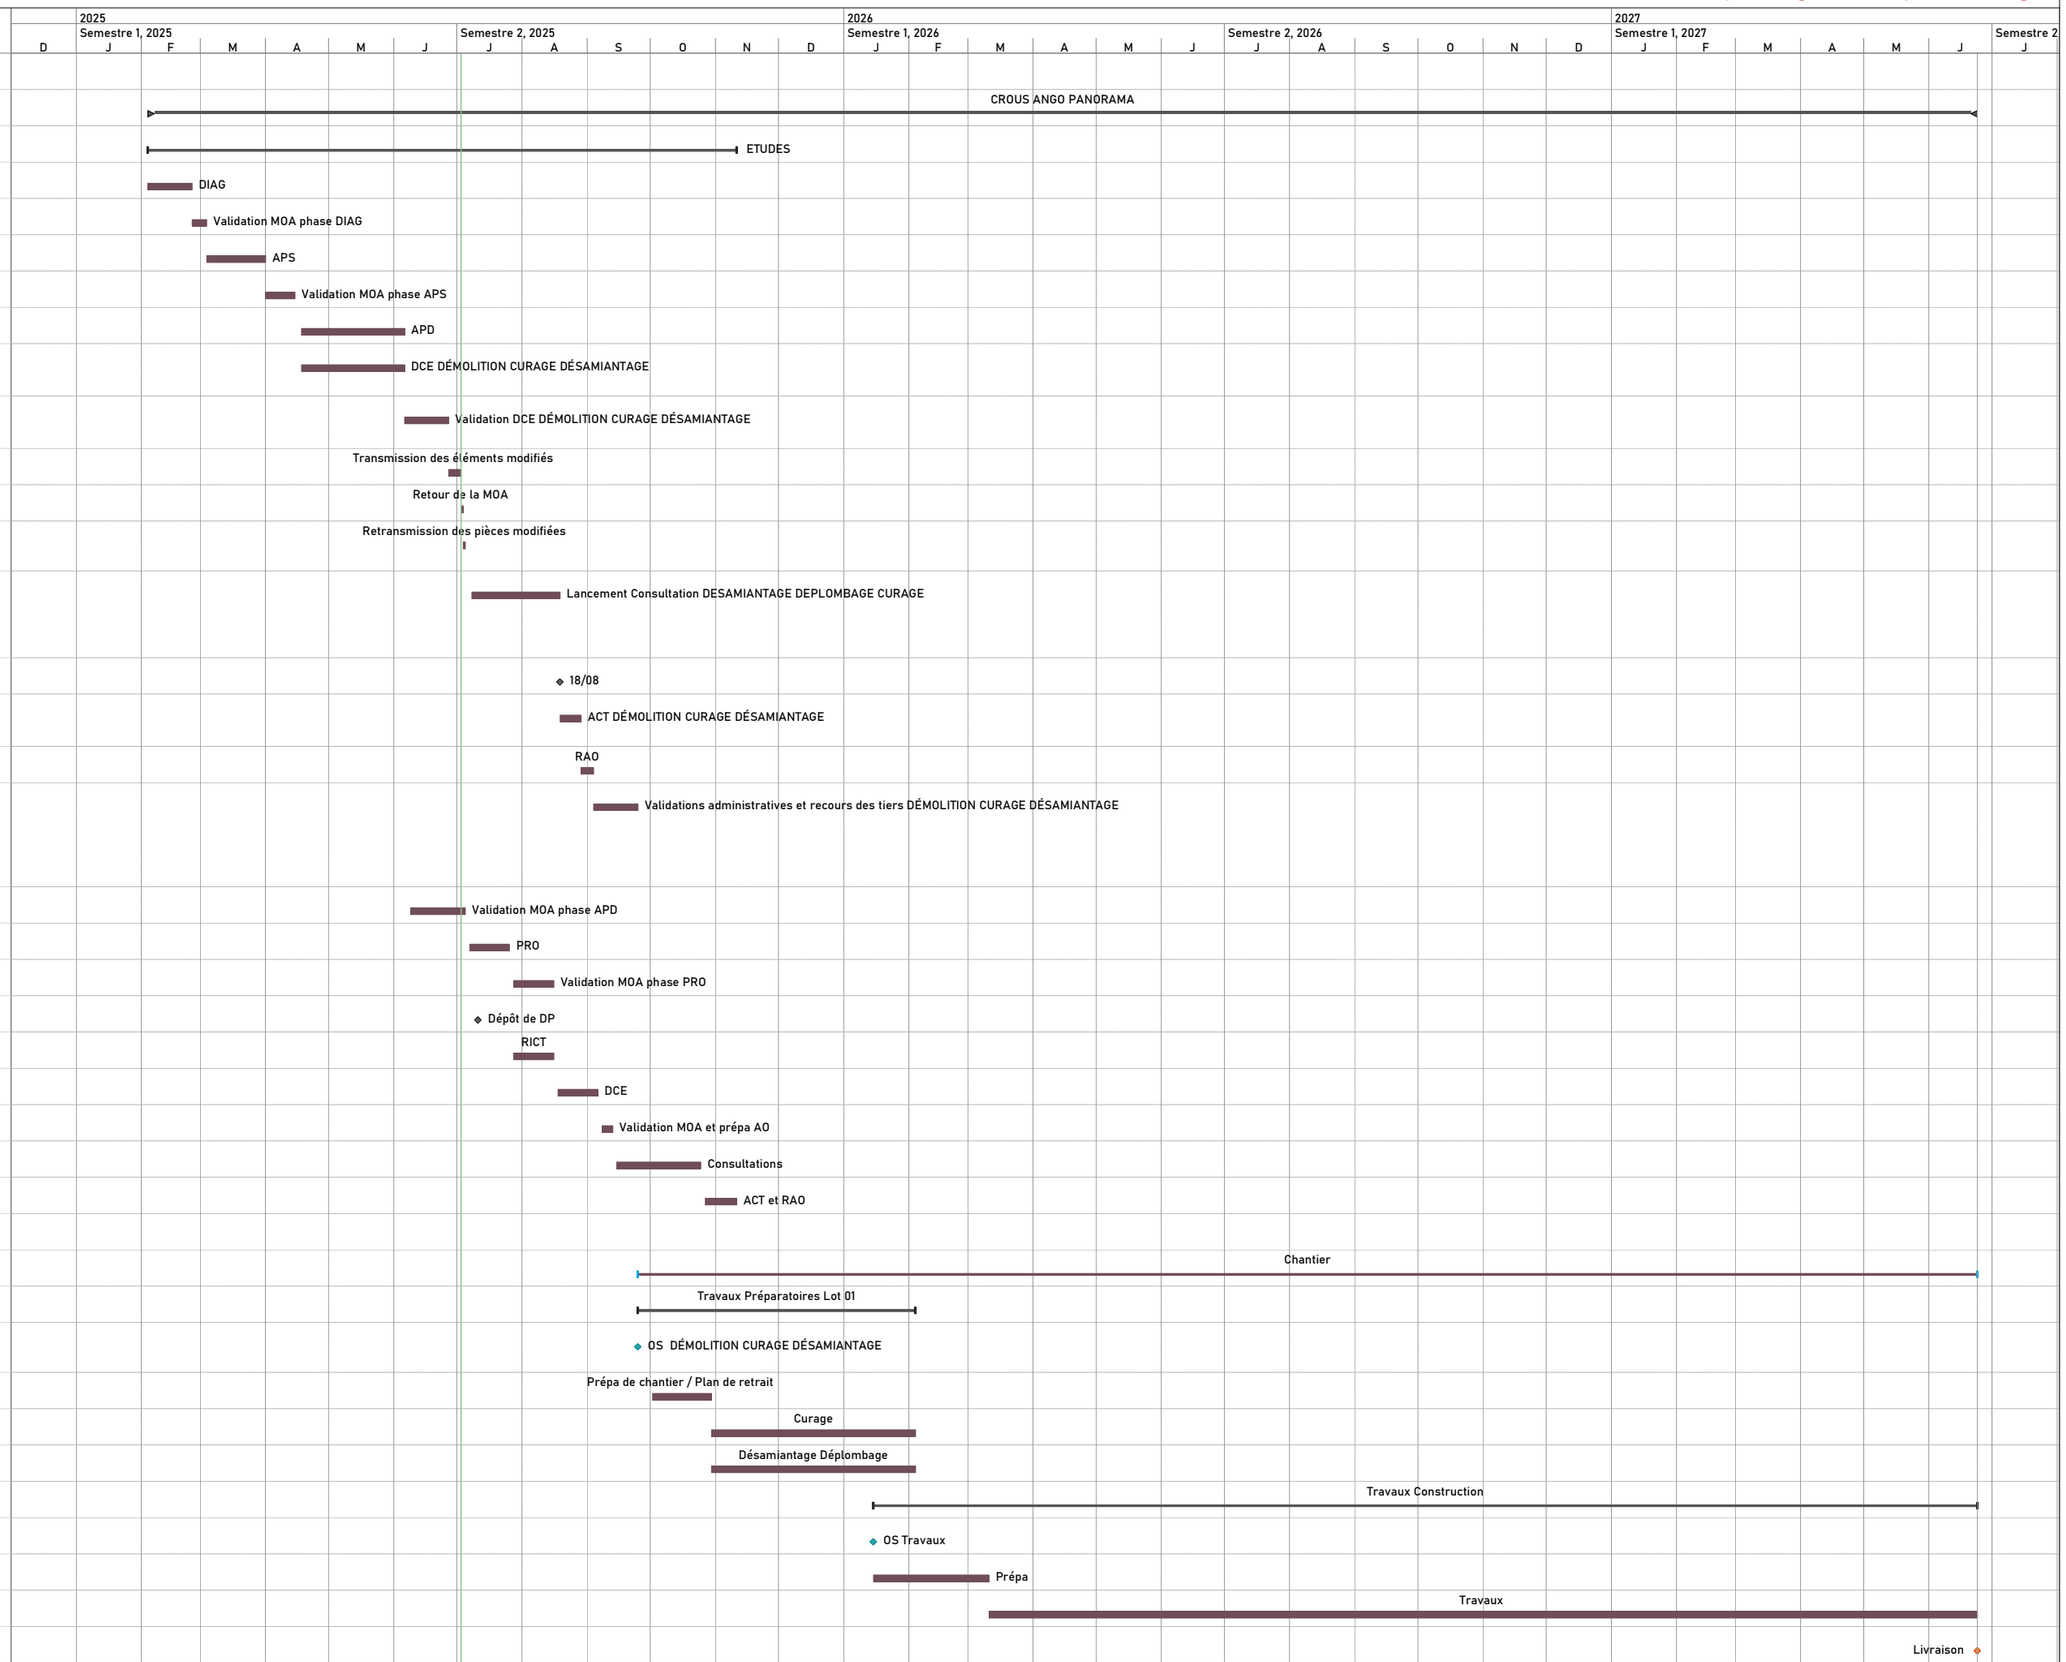
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	**CROUS ANGO PANORAMA**	597 jours	Mar 04/02/25	Mer 23/06/27
3	ETUDES	200 jours	Mar 04/02/25	Lun 10/11/25
4	DIAG	3 semaines	Mar 04/02/25	Lun 24/02/25
5	Validation MOA phase DIAG	1 semaine	Mar 25/02/25	Lun 03/03/25
6	APS	4 semaines	Mar 04/03/25	Lun 31/03/25
7	Validation MOA phase APS	2 semaines	Mar 01/04/25	Lun 14/04/25
8	APD	7 semaines	Ven 18/04/25	Jeu 05/06/25
9	DCE DÉMOLITION CURAGE DÉSAMIANTAGE	7 semaines	Ven 18/04/25	Jeu 05/06/25
10	Validation DCE DÉMOLITION CURAGE	3 semaines	Ven 06/06/25	Jeu 26/06/25
11	Transmission des éléments	4 jours	Ven 27/06/25	Mer 02/07/25
12	Retour de la MOA	1 jour	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25
13	Retransmission des pièces modifiées	1 jour	Ven 04/07/25	Ven 04/07/25
14	Lancement Consultation DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE CURAGE	6 semaines	Mar 08/07/25	Lun 18/08/25
15	Retour des offres	0 jour	Lun 18/08/25	Lun 18/08/25
16	ACT DÉMOLITION CURAGE DÉSAMIANTAGE	8 jours	Mar 19/08/25	Jeu 28/08/25
17	RAO	4 jours	Ven 29/08/25	Mer 03/09/25
18	Validations administratives et recours des tiers DÉMOLITION CURAGE DÉSAMIANTAGE	3 semaines	Jeu 04/09/25	Mer 24/09/25
19	Validation MOA phase APD	4 semaines	Lun 09/06/25	Ven 04/07/25
20	PRO	3 semaines	Lun 07/07/25	Ven 25/07/25
21	Validation MOA phase PRO	3 semaines	Lun 28/07/25	Ven 15/08/25
22	Dépôt de DP	0 jour	Ven 11/07/25	Ven 11/07/25
23	RICT	3 semaines	Lun 28/07/25	Ven 15/08/25
24	DCE	3 semaines	Lun 18/08/25	Ven 05/09/25
25	Validation MOA et prépa AO	5 jours	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25
26	Consultations	6 semaines	Lun 15/09/25	Ven 24/10/25
27	ACT et RAO	11 jours	Lun 27/10/25	Lun 10/11/25
28				
29	Chantier	430 jours	Jeu 25/09/25	Mer 23/06/27
30	Travaux Préparatoires Lot	85 jours	Jeu 25/09/25	Mar 03/02/26
31	OS DÉMOLITION CURAGE	0 jour	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25
32	Prépa de chantier / Plan	4 semaines	Jeu 02/10/25	Mer 29/10/25
33	Curage	3 mois	Jeu 30/10/25	Mar 03/02/26
34	Désamiantage Déplombage	3 mois	Jeu 30/10/25	Mar 03/02/26
35	Travaux Construction	360 jours	Jeu 15/01/26	Mer 23/06/27
36	OS Travaux	0 jour	Jeu 15/01/26	Jeu 15/01/26
37	Prépa	2 mois	Jeu 15/01/26	Mar 10/03/26
38	Travaux	16 mois	Mer 11/03/26	Mer 23/06/27
39	Livraison	0 jour	Mer 23/06/27	Mer 23/06/27
