N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéc	Nom ressou
1		LEGENDE					
2		PREPARATIONS DE CHANTIER	31 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
3		COMMANDES	31 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
4		ETUDES - EXE	31 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
5		TRAVAUX	104 jrs?	Lun 08/12/25	Jeu 30/04/26	2	
6		RECEPTIONS	1 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26		
7		**PLANNING PREVISIONNEL : Travaux préliminaires Bât 01 et 22 -CHAM EPERNAY**	**134 jrs**	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
8		**Lot 1 : DEMOLITION- DESAMIANTAGE**	134 jrs?	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
9		Préparation chantier & études exécution	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
10		Plan de retrait	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
11		BÂT 01: Confinement et installations chantier	5 jrs	Mar 02/12/25	Lun 08/12/25		
12		BÂT 01: Désamiantage + Démolitions	10 jrs	Mar 09/12/25	Lun 22/12/25	11	
13		BÂT 01: Replis des installations confinements + Analyses libératoires + inspections visuelles	5 jrs	Mar 23/12/25	Lun 29/12/25	12	
14		BÂT01 - NIV RDC (hors zone amiante): Démolitions + déposes	15 jrs	Mar 09/12/25	Lun 29/12/25		
15		BÂT 22 NIV RDC: Confinement et installations chantier	10 jrs	Lun 24/11/25	Ven 05/12/25		
16		BÂT 22 NIV RDC Désamiantage + Démolitions	25 jrs	Lun 08/12/25	Ven 09/01/26	15	
17		BÂT 22 NIV RDC: Replis des installations confinements + Analyses libératoires + inspections visuelles	5 jrs	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26	16	
18		BÂT22 - NIV RDC (hors zone amiante): Démolitions + déposes	30 jrs	Lun 08/12/25	Ven 16/01/26		
19		BÂT 22 NIV +1: Confinement et installations chantier	10 jrs	Lun 24/11/25	Ven 05/12/25		
20		BÂT 22 NIV +1: Désamiantage + Démolitions	25 jrs	Lun 08/12/25	Ven 09/01/26	19	
21		BÂT 22 NIV +1: Replis des installations confinements + Analyses libératoires + inspections visuelles	5 jrs	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26	20	
22		NIV +1 (hors zone amiante): Démolitions + déposes BÂT22 -	30 jrs	Lun 08/12/25	Ven 16/01/26		
23		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
24		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
25		**Lot 2 : GROS ŒUVRE**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
26		Préparation chantier & études exécution	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
27		Constat d'huissier	5 jrs	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25		
28		Etude structure - Béton	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
29		Equipement de la base vie	5 jrs	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25		
30		Installations chantier	5 jrs	Lun 17/11/25	Ven 21/11/25		
31		BÂT 01: Bouchement des 5 baies menuiseries EXT non réutilisées	10 jrs	Lun 15/12/25	Ven 26/12/25	99	
32		BÂT 01: Modification de baie pour nouvelle Menuiseries EXT + reprise abords et seuil PMR	10 jrs	Mer 10/12/25	Mar 23/12/25	100	
33		BÂT 22 Bouchement des révervations suite au dépose des installation de désenfumage	5 jrs	Lun 19/01/26	Ven 23/01/26	22	
34		BÂT 22: Démolition escalier secours + dalle et fondations	10 jrs	Lun 08/12/25	Ven 19/12/25	26	
35		BÂT22: Terrassements Futur escalier secours + cheminement ascenseur	20 jrs	Lun 22/12/25	Ven 16/01/26	34	
36		BÂT22: Pose bordures et coulage des dee dalles et fondations Futur escalier secours + cheminement ascenseur	15 jrs	Lun 19/01/26	Ven 06/02/26	35	
37		BÂT22: Pose escalier de secours	25 jrs	Lun 09/02/26	Ven 13/03/26	36	
38		Carottages - Reservations - Plots béton >>>pour autres lots	65 jrs	Lun 08/12/25	Ven 06/03/26	26	
39		BÂT01 Reprise de seuil entrée (Circulation2)	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	104	
40		BÂT01: Reprises des bétons & des tableaux	10 jrs	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26	101DD	
41		BÂT22: Reprises des bétons & des tableaux	25 jrs	Lun 09/02/26	Ven 13/03/26	37DD	
42		BÂT22 Edicule ASCENSEUR: Reprise jonction mur édicule et dalle haute	15 jrs	Lun 08/12/25	Ven 26/12/25	26	
43		Repli Base Vie + installations de chantier & clôtures	4 jrs	Ven 24/04/26	Mer 29/04/26		
44		Nettoyage de chantier	3 jrs	Lun 02/09/24	Mer 04/09/24		
45		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
46		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
47		**Lot 3: COUVERTURE ETANCHEITE**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
48		Préparation chantier & études exécution	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
49		BAT01 & BAT22: Installation des sécurisations de toitures + sapines d'accès	15 jrs	Lun 17/11/25	Ven 05/12/25		
50		BÂT 01: Dépose protection lourde	15 jrs	Lun 08/12/25	Ven 26/12/25	49	
51		BÂT 22: Dépose protection lourde	15 jrs	Lun 08/12/25	Ven 26/12/25	49	

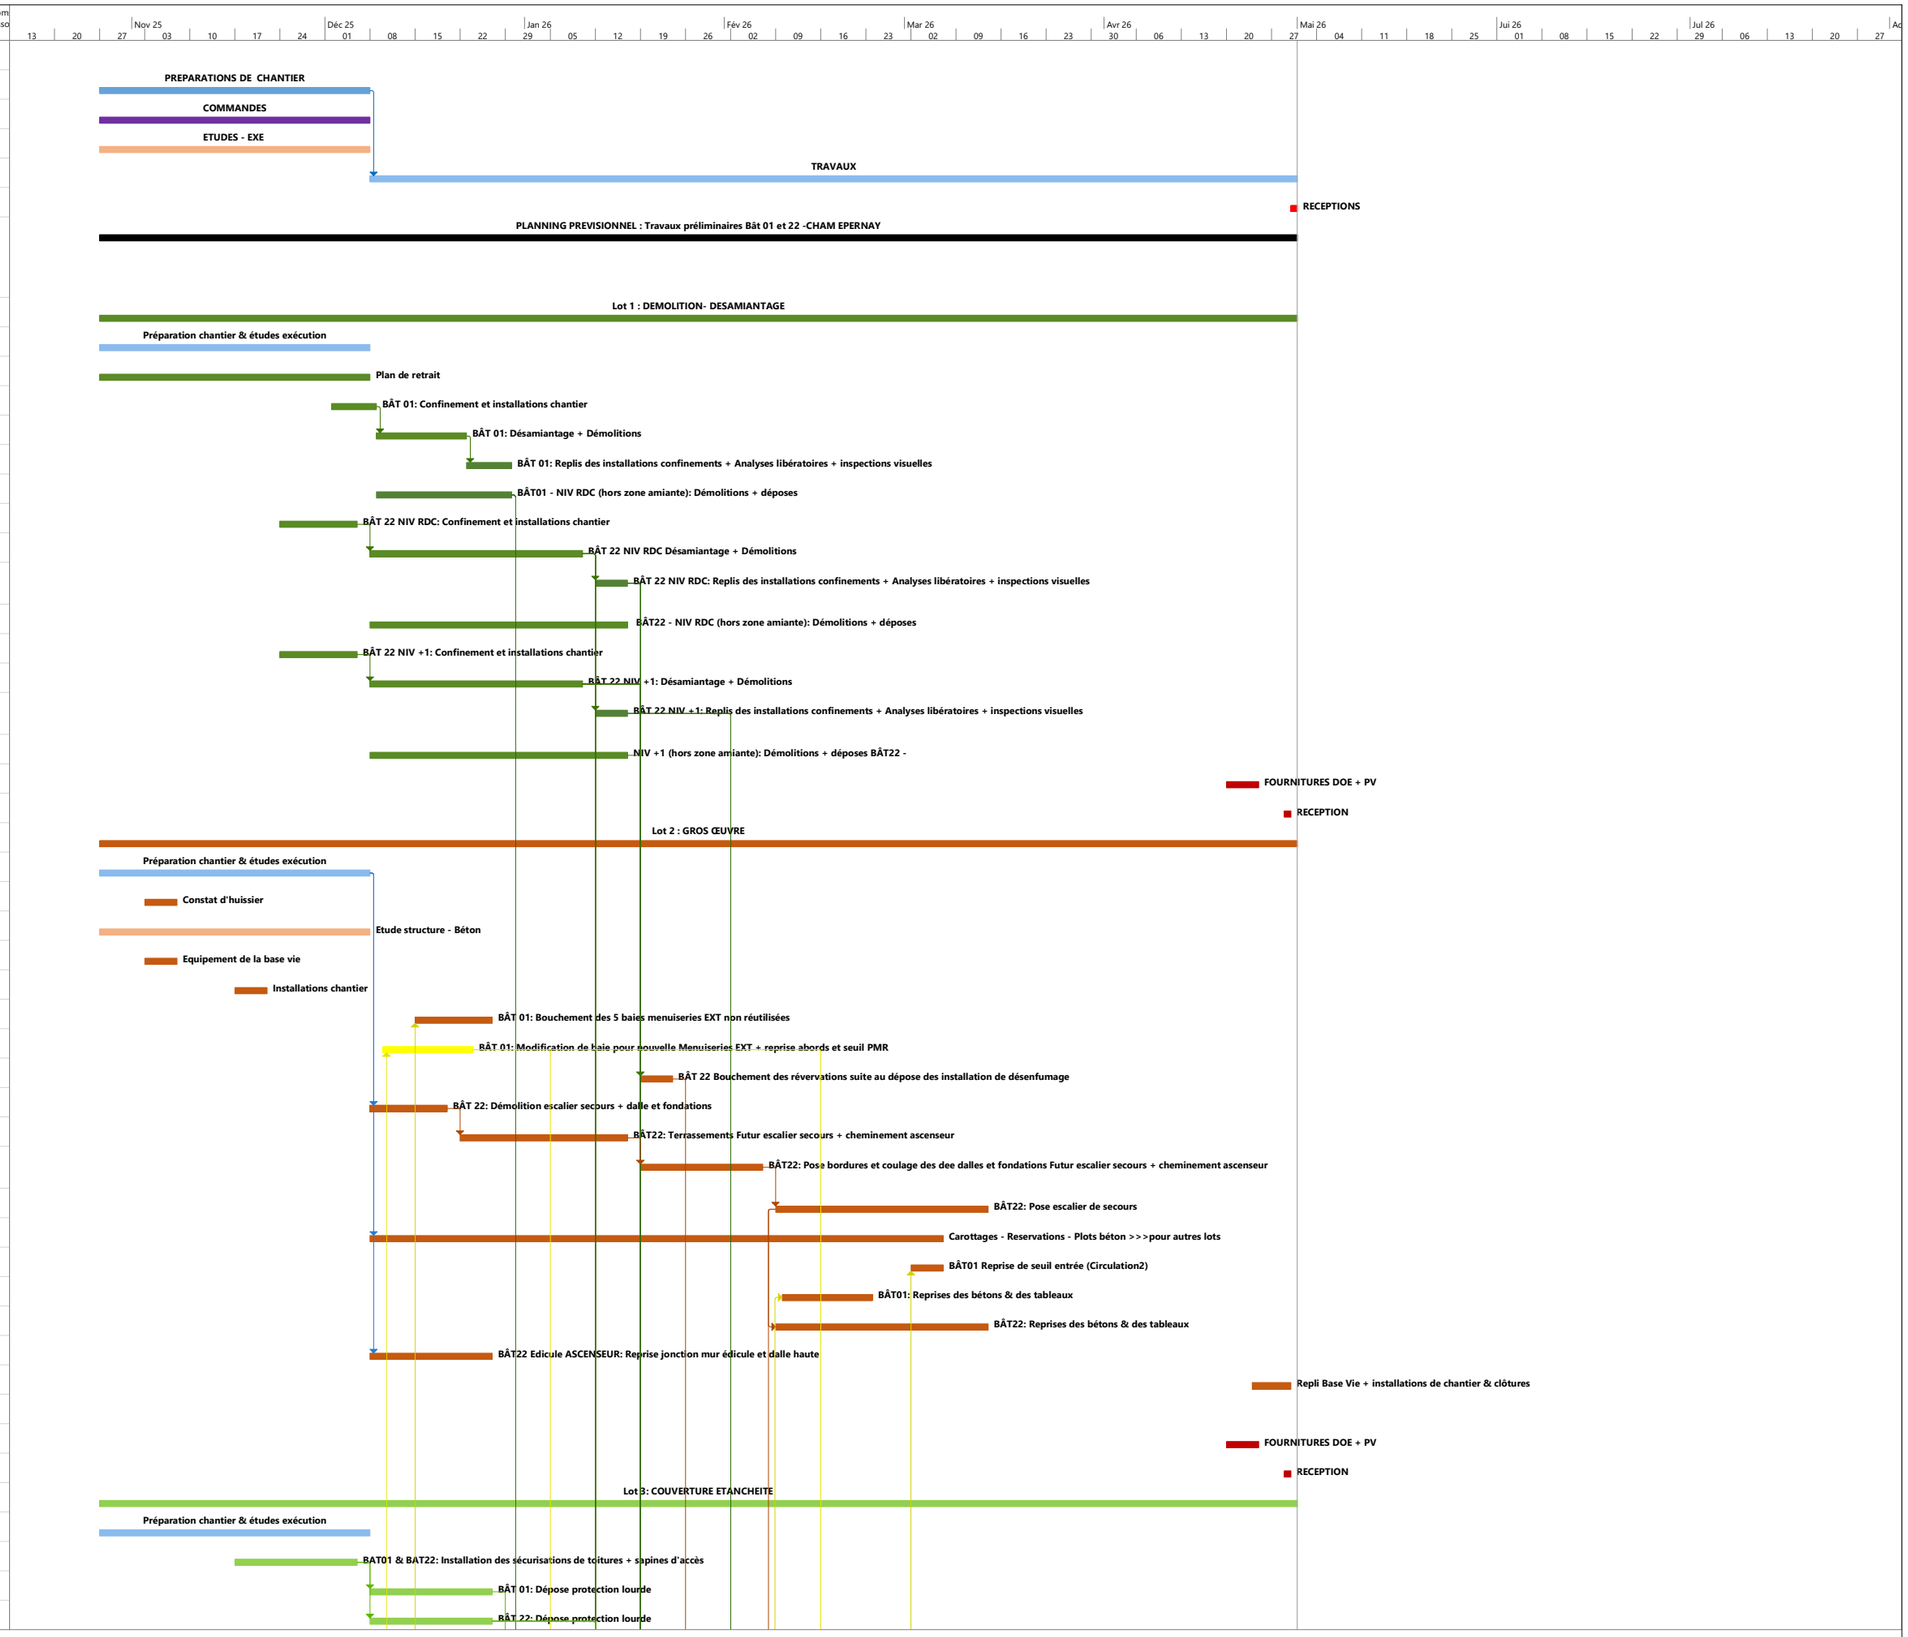

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéce	Nom ressou
52		BÂT 01: Réfection étanchéité + Création EP	30 jrs	Lun 29/12/25	Ven 06/02/26	50	
53		BAT01 : Replis des sécurisations de toitures + sapines d'accès	5 jrs	Lun 09/02/26	Ven 13/02/26	52	
54		BÂT 22 Toiture NON ACCESSIBLE: Réfection étanchéité + Points singuliers	65 jrs	Lun 12/01/26	Ven 10/04/26	51	
55		BÂT 22 Toiture EDICULE ASCENSEUR: Réfection étanchéité + Points singuliers	65 jrs	Lun 12/01/26	Ven 10/04/26	51	
56		BÂT 22 Toiture AUVENT ENTRE: Réfection étanchéité + Points singuliers	65 jrs	Lun 12/01/26	Ven 10/04/26	51	
57		BÂT 22 Toiture LOCAL DECHETS Réfection toiture + Points singuliers	65 jrs	Lun 12/01/26	Ven 10/04/26	51	
58		BÂT22 : Garde corps lestés	10 jrs	Lun 30/03/26	Ven 10/04/26	54FF	
59		BAT22: Replis des sécurisations de toitures + sapines d'accès	10 jrs	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	58	
60		Nettoyage de chantier	2 jrs	Lun 27/04/26	Mar 28/04/26	59	
61		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
62		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
63		**Lot 4 : MENUISERIE INERIEURE - CLOISONS- DOUBLAGES - PLAFONDS - AGENCEMENTS**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
64		Préparation chantier & études exécution	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
65		Installation des cylindres chantier Bât 01 & Bât 22	5 jrs	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25		
66		Installation cloisons et SAS de confinement Niv-2	5 jrs	Lun 30/09/24	Ven 04/10/24		
67		BÂT01 : Dépose partielle des faux plafonds pour adaptation cloisons (EP0100003C – EP0100003- EP0100003A)	5 jrs	Mar 02/12/25	Lun 08/12/25		
68		BÂT 01:Démolition partielle de cloisons (EP0100003C – EP0100003)	5 jrs	Lun 24/11/25	Ven 28/11/25		
69		BÂT 01: Reprise de cloison & doublages suite aux bouchements de baies	5 jrs	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26	32	
70		BÂT 01: Création de cloisons + doublage + pose menuiseries (Bureaux 1 -2-3 / Circulation /Secrétariat EP0100003)	30 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/02/26	14	
71		BÂT 01: Création de cloisons + doublage + pose menuiseries (Zone humide WC)	10 jrs	Mar 30/12/25	Lun 12/01/26	14	
72		BÂT01: Pose ossatures faux plafonds 600x600	10 jrs	Mar 24/02/26	Lun 09/03/26	70	
73		BÂT01: Blanchiment faux plafonds 600x600	5 jrs	Mar 10/03/26	Lun 16/03/26	72	
74		BÂT01: Pose des agencements	5 jrs	Mar 17/03/26	Lun 23/03/26	73	
75		BÂT01: Pose signalétique	5 jrs	Mar 17/03/26	Lun 23/03/26	73	
76		BÂT22: Reprise de doublage suite aux bouchements de baies	5 jrs	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	33	
77		BÂT 22 RDC: Création de cloisons + doublage + pose menuiseries (Bureau OS EP22000109 / Circulation EP2200100 / Salle réunion EP2200106/Vestiaire H / Vestiaires F / Bureau EP2200009 / Bureau EP2200003)	20 jrs	Lun 19/01/26	Ven 13/02/26	17	
78		BÂT 22 R+1: Création de cloisons + doublage + pose menuiseries (Zone humide Sanitaires H EP2200118 / Douche H EP2200116 / Sanitaires F EP2200104 / Douche H EP2200102)	20 jrs	Lun 19/01/26	Ven 13/02/26	17	
79		BÂT22 RDC: Pose portes CF 2 vantaux Circulation EP2200100	20 jrs	Lun 19/01/26	Ven 13/02/26	17	
80		BÂT22 RDC: Pose ossatures faux plafonds 600x600	20 jrs	Lun 26/01/26	Ven 20/02/26	77DD	
81		BÂT22 RDC : Blanchiment faux plafonds 600x600	10 jrs	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	80	
82		BÂT 22 R+1: Pose protections murales	15 jrs?	Lun 16/02/26	Ven 06/03/26	77	
83		BÂT22 RDC:Adaptations portes- quincailleries de porte Boitiers de serrures + Béquilles et rosaces + Butées de porte	15 jrs?	Mar 17/02/26	Lun 09/03/26	77	
84		BÂT 22 R+1: Création de cloisons + doublage + pose menuiseries (Bureau EP2210116 / Bureau EP2210002 / Bureau EP2210105 / Bureau EP2210009)	20 jrs	Lun 02/02/26	Ven 27/02/26	21	
85		BÂT 22 R+1: Création de cloisons + doublage + pose menuiseries (Zone humide Sanitaires H EP2210119/ Sanitaires EP2210117/ Sanitaires F EP2200106 / Sanitaires EP2200104)	20 jrs	Lun 02/02/26	Ven 27/02/26	21	
86		BÂT 22 R+1: Pose protections murales	15 jrs	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26	84	
87		BÂT22 R+1:Adaptations portes- quincailleries de porte Boitiers de serrures + Béquilles et rosaces + Butées de porte	15 jrs	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26	84	
88		BÂT22 R+1: Pose ossatures faux plafonds 600x600	20 jrs	Mar 10/02/26	Lun 09/03/26	84DD	
89		BÂT22 R+1 : Blanchiment faux plafonds 600x600	10 jrs?	Mar 10/03/26	Lun 23/03/26	88	
90		BÂT22 RDC & R+1: Pose des agencements	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	84	
91		BÂT22 RDC & R+1: Pose signalétique	10 jrs	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26	84	
92		BÂT22 R-1: Encoffrement coupe feu EP220011008A Niv -1 Futur DATA CENTER	5 jrs	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25	64	
93		Dépose des cylindres de chantier	2 jrs	Lun 27/04/26	Mar 28/04/26		
94		Nettoyage de chantier	10 jrs	Mar 24/03/26	Lun 06/04/26	89	
95		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
96		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
97		**Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE - METALLERIE**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
98		Préparation chantier & études exécution	30 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
99		BÂT01: Dépose des 5 Menuiseries pour bouchement de baies	5 jrs	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25	98	
100		BÂT01: Dépose de la Menuiserie pour modification de baie	2 jrs	Lun 08/12/25	Mar 09/12/25		

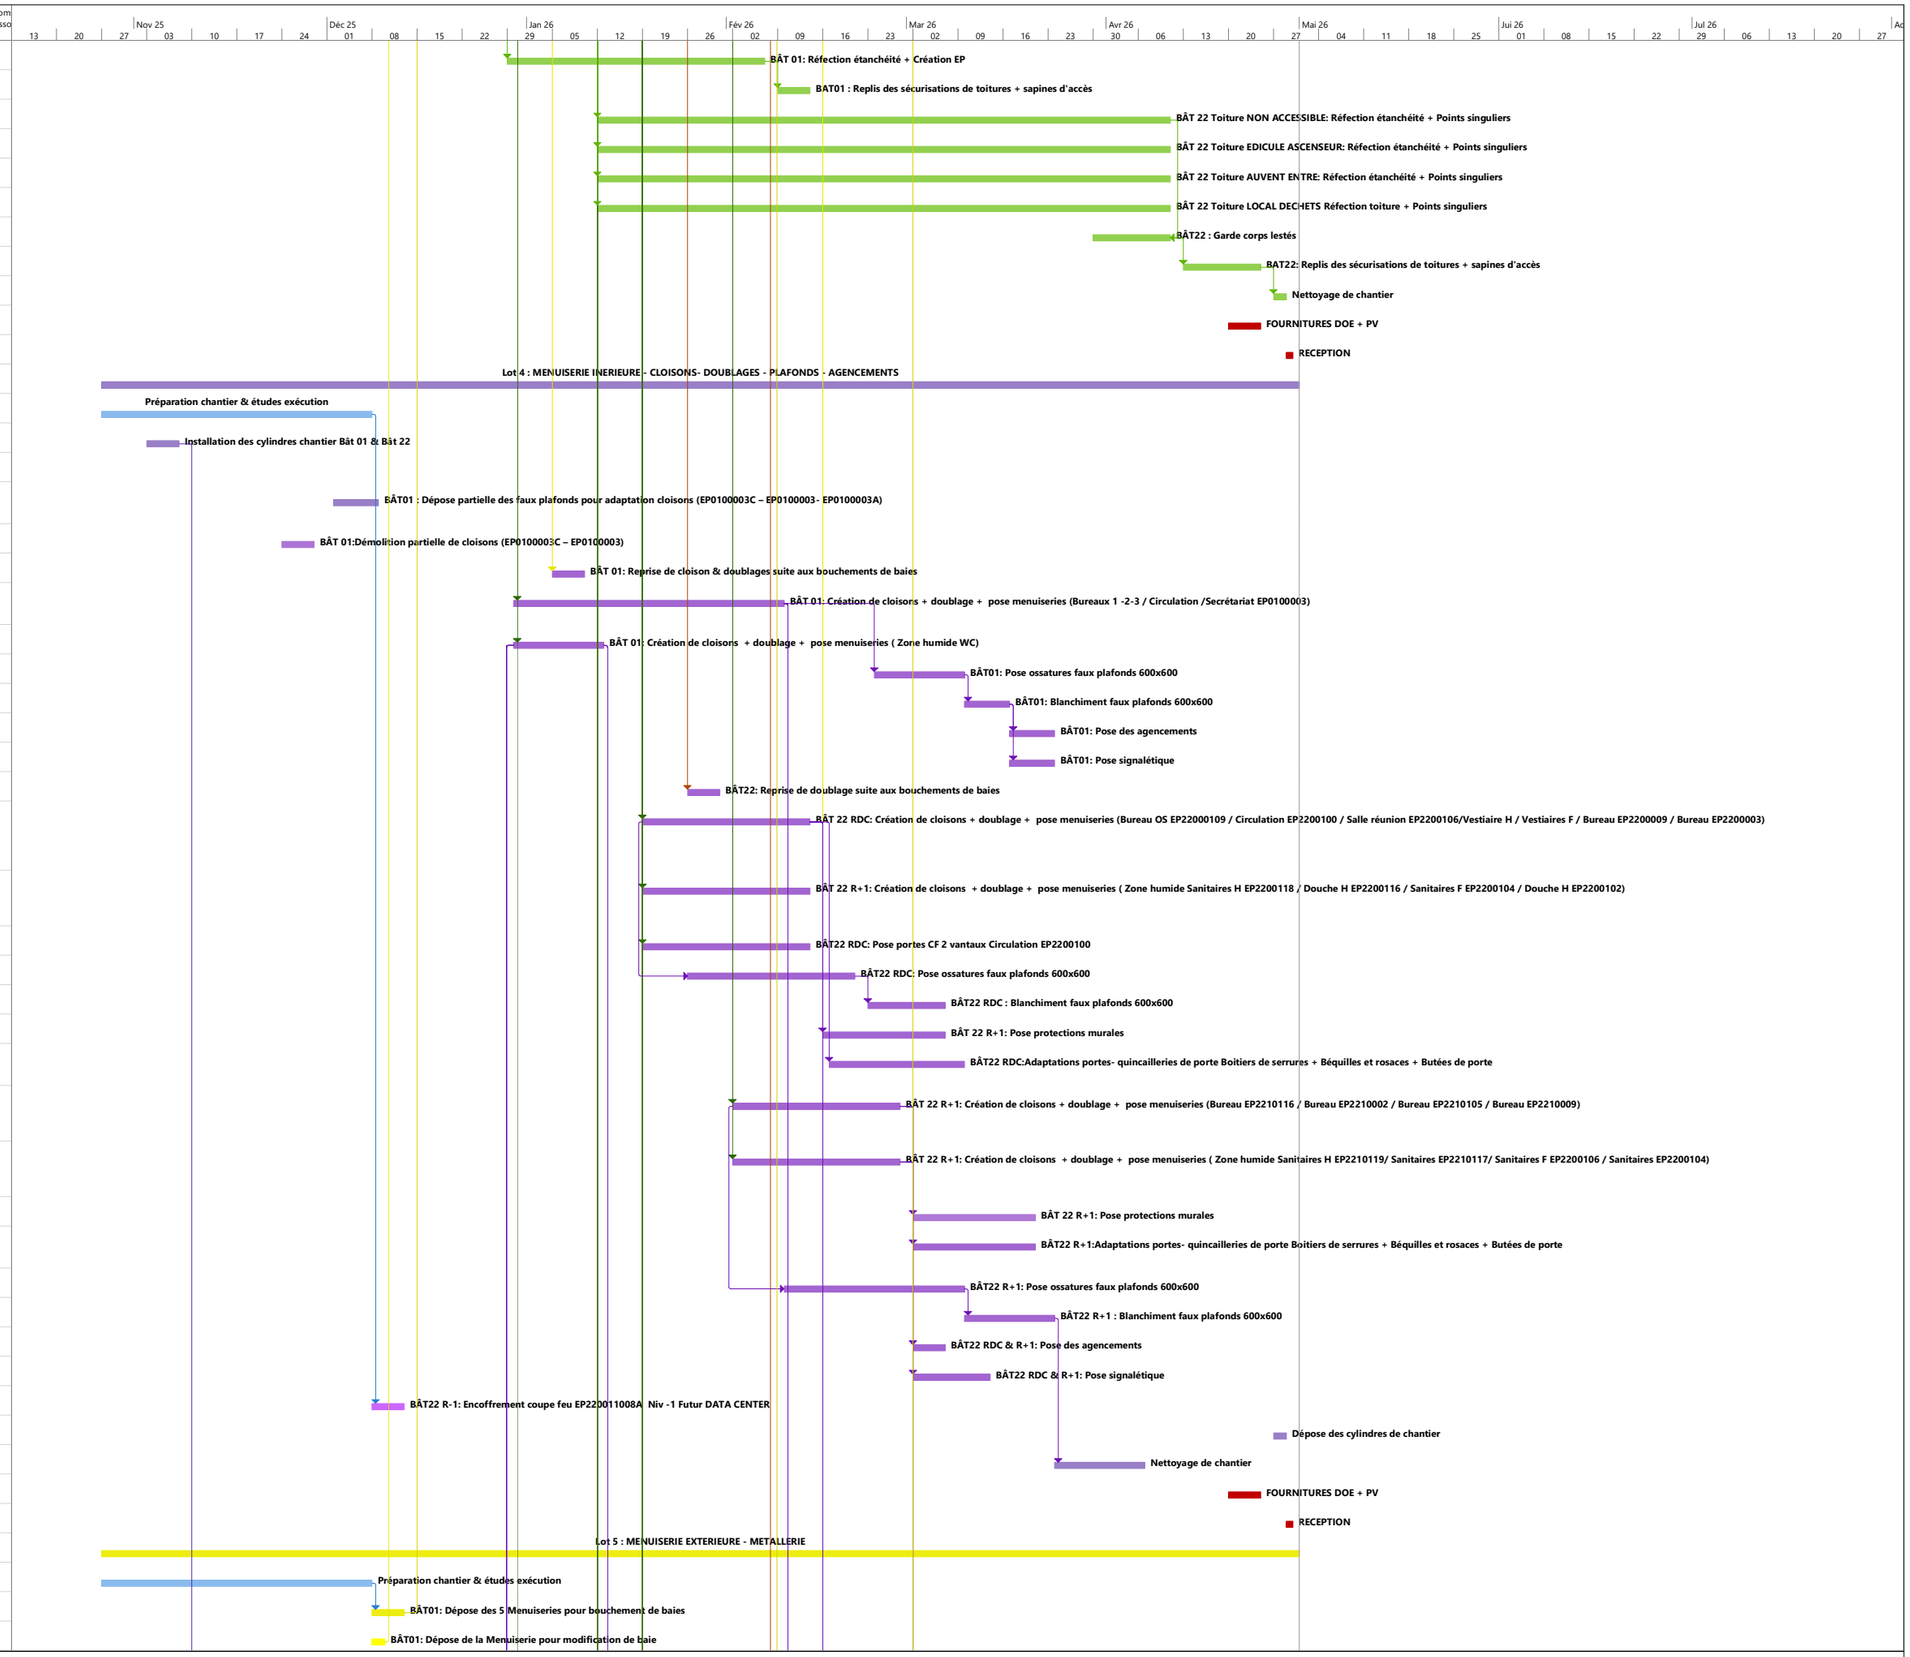

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéce	Nom ressou
101		BÂT01: Pose fenêtres 2 vantaux (Secrétariat EP0100003 (x2) – Bureau EP0100003C (x1) - Attente (x1) – Bureau 1 (x2) - Bureau 2 (x2))	10 jrs	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26	70	
102		BÂT01 : Pose des volets roulants	10 jrs	Mar 24/02/26	Lun 09/03/26	101	
103		BÂT01: pose des sécurisation de fenêtres	11 jrs?	Mar 10/03/26	Mar 24/03/26	102	
104		BÂT01: Pose bloc porte 1 vantail + 1 impost vitre horizontal fixe + butées de porte + cylindre (IS Circulation 2)	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	32	
105		BÂT01: Pose bloc porte 2 vantaux (100+40) + 1 impost vitre horizontal fixe + butées de porte + cylindre (Attente)	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	32	
106		BÂT01: Pose chassis vitré intérieur (Secrétariat)	10 jrs	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26	70	
107		BÂT22 RDC & R+1: Pose Blocs portes 1 vantail (IS Circulation EP2200100 & IS Circulation	25 jrs?	Lun 09/02/26	Ven 13/03/26	37DD	
108		BÂT22 RDC: Révision menuiserie extérieure (Porte entrée)	10 jrs	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26	107	
109		Nettoyage de chantier	3 jrs	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26	108	
110		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
111		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
112		**Lot 6 : ELECTRICITE CFO & cfa - SSI**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
113		Préparation chantier & études exécution	30 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
114		BÂT01 & BÂT22: Installations chantier: Coffrets + Eclairages de chantier	3 jrs	Lun 17/11/25	Mer 19/11/25		
115		BÂT01 & BÂT22: Consignations électriques CFO, cfa & SSI (toutes zones travaux)	3 jrs	Lun 17/11/25	Mer 19/11/25		
116		BÂT 01:Déposes circuits CFO & Cfa & SSI- Démolition partielle de cloisons (EP0100003C –	5 jrs	Jeu 20/11/25	Mer 26/11/25	115	
117		BÂT22 RDC:Déposes circuits CFO & Cfa & SSI- Démolition partielle de cloisons (EP0100003C – EP0100003)	12 jrs	Jeu 20/11/25	Ven 05/12/25	115	
118		BÂT22 R+1:Déposes circuits CFO & Cfa & SSI- Démolition partielle de cloisons (EP0100003C – EP0100003)	12 jrs	Jeu 20/11/25	Ven 05/12/25	115	
119		BÂT01: Création alimentation électrique VMC	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
120		BÂT01: Mise en œuvre baie informatique	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
121		BÂT22 RDC & R+1: Adaptation des armoires électriques	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26		
122		BÂT01:Création et modifications des circuits lumineux intérieur et extérieur	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
123		BÂT01:Création et modifications des circuits PC + PT + PTI)	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
124		BÂT01:Création et modifications des circuits RJ45 + PTI	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
125		BÂT01: Pose et câblage: DM-BAES-DI-IA-Flashs lumineux	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
126		BÂT01 Pose des luminaire 600x600 + Down Light toutes zones	50 jrs	Mar 30/12/25	Lun 09/03/26	71DD	
127		BÂT01: Reprogramation SSI	3 jrs	Mar 10/03/26	Jeu 12/03/26	125	
128		BÂT01: Recette informatique	3 jrs	Mar 10/03/26	Jeu 12/03/26	120	
129		BÂT01: Mise à jour plans + schémas électriques + Etiquettes	15 jrs	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26	121	
130		BÂT22 RDC & R+1: Mise en œuvre nouvelle baie informatique & déplacement baie	65 jrs	Lun 12/01/26	Ven 10/04/26	16	
131		BÂT22 RDC & R+1: Mise en œuvre nouveau SSI & dépose SSI existant	65 jrs	Lun 12/01/26	Ven 10/04/26	16	
132		BÂT22 RDC & R+1: Adaptation des armoires électriques	50 jrs	Lun 12/01/26	Ven 20/03/26	16	
133		BÂT22 RDC & R+1: Création et modifications des circuits lumineux intérieur et extérieur	50 jrs	Lun 12/01/26	Ven 20/03/26	16	
134		BÂT22 RDC & R+1: Création et modifications des circuits PC + PT + PTI)	50 jrs	Lun 12/01/26	Ven 20/03/26	16	
135		BÂT22 RDC & R+1: Création et modifications des circuits RJ45 + PTI	50 jrs	Lun 12/01/26	Ven 20/03/26	16	
136		BÂT22 RDC & R+1: Pose et câblage: DM-BAES-DI-IA-Flashs lumineux	50 jrs	Lun 12/01/26	Ven 20/03/26	16	
137		BÂT22 RDC & R+1: Pose des luminaire 600x600 + Down Light toutes zones	50 jrs	Lun 12/01/26	Ven 20/03/26	16	
138		BÂT22: Reprogramation SSI	10 jrs	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	131	
139		BÂT22: Recette informatique	5 jrs	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26	130	
140		BÂT22: Mise à jour plans + schémas électriques + Etiquettes	15 jrs	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26	132	
141		BÂT01 & BÂT22: Replis coffrets et éclairages de chantier	4 jrs	Ven 24/04/26	Mer 29/04/26		
142		Nettoyage de chantier	4 jrs	Ven 24/04/26	Mer 29/04/26		
143		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
144		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
145		**Lot 6 : PLOMBERIE / CVC**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
146		Préparation chantier & études exécution	30 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
147		Neutralisation des réseaux EF – ECS – EU- Réseau de ventilation + Chauffage	10 jrs	Lun 10/11/25	Ven 21/11/25		
148		Déposes des réseaux EF – ECS – EU- Réseau de ventilation + Chauffage NON REUTILISES	10 jrs	Lun 10/11/25	Ven 21/11/25	65	
149		BÂT01 & BÂT22: Déposes des équipement sanitaires (wc et douches)	10 jrs	Lun 24/11/25	Dim 07/12/25		
150		BÂT01 Dépose des ventillo convecteurs	10 jrs	Lun 24/11/25	Dim 07/12/25		
151		BÂT22 RDC & R+1: Dépose des radiateurs pour mise en peinture et repose	10 jrs	Lun 24/11/25	Dim 07/12/25		

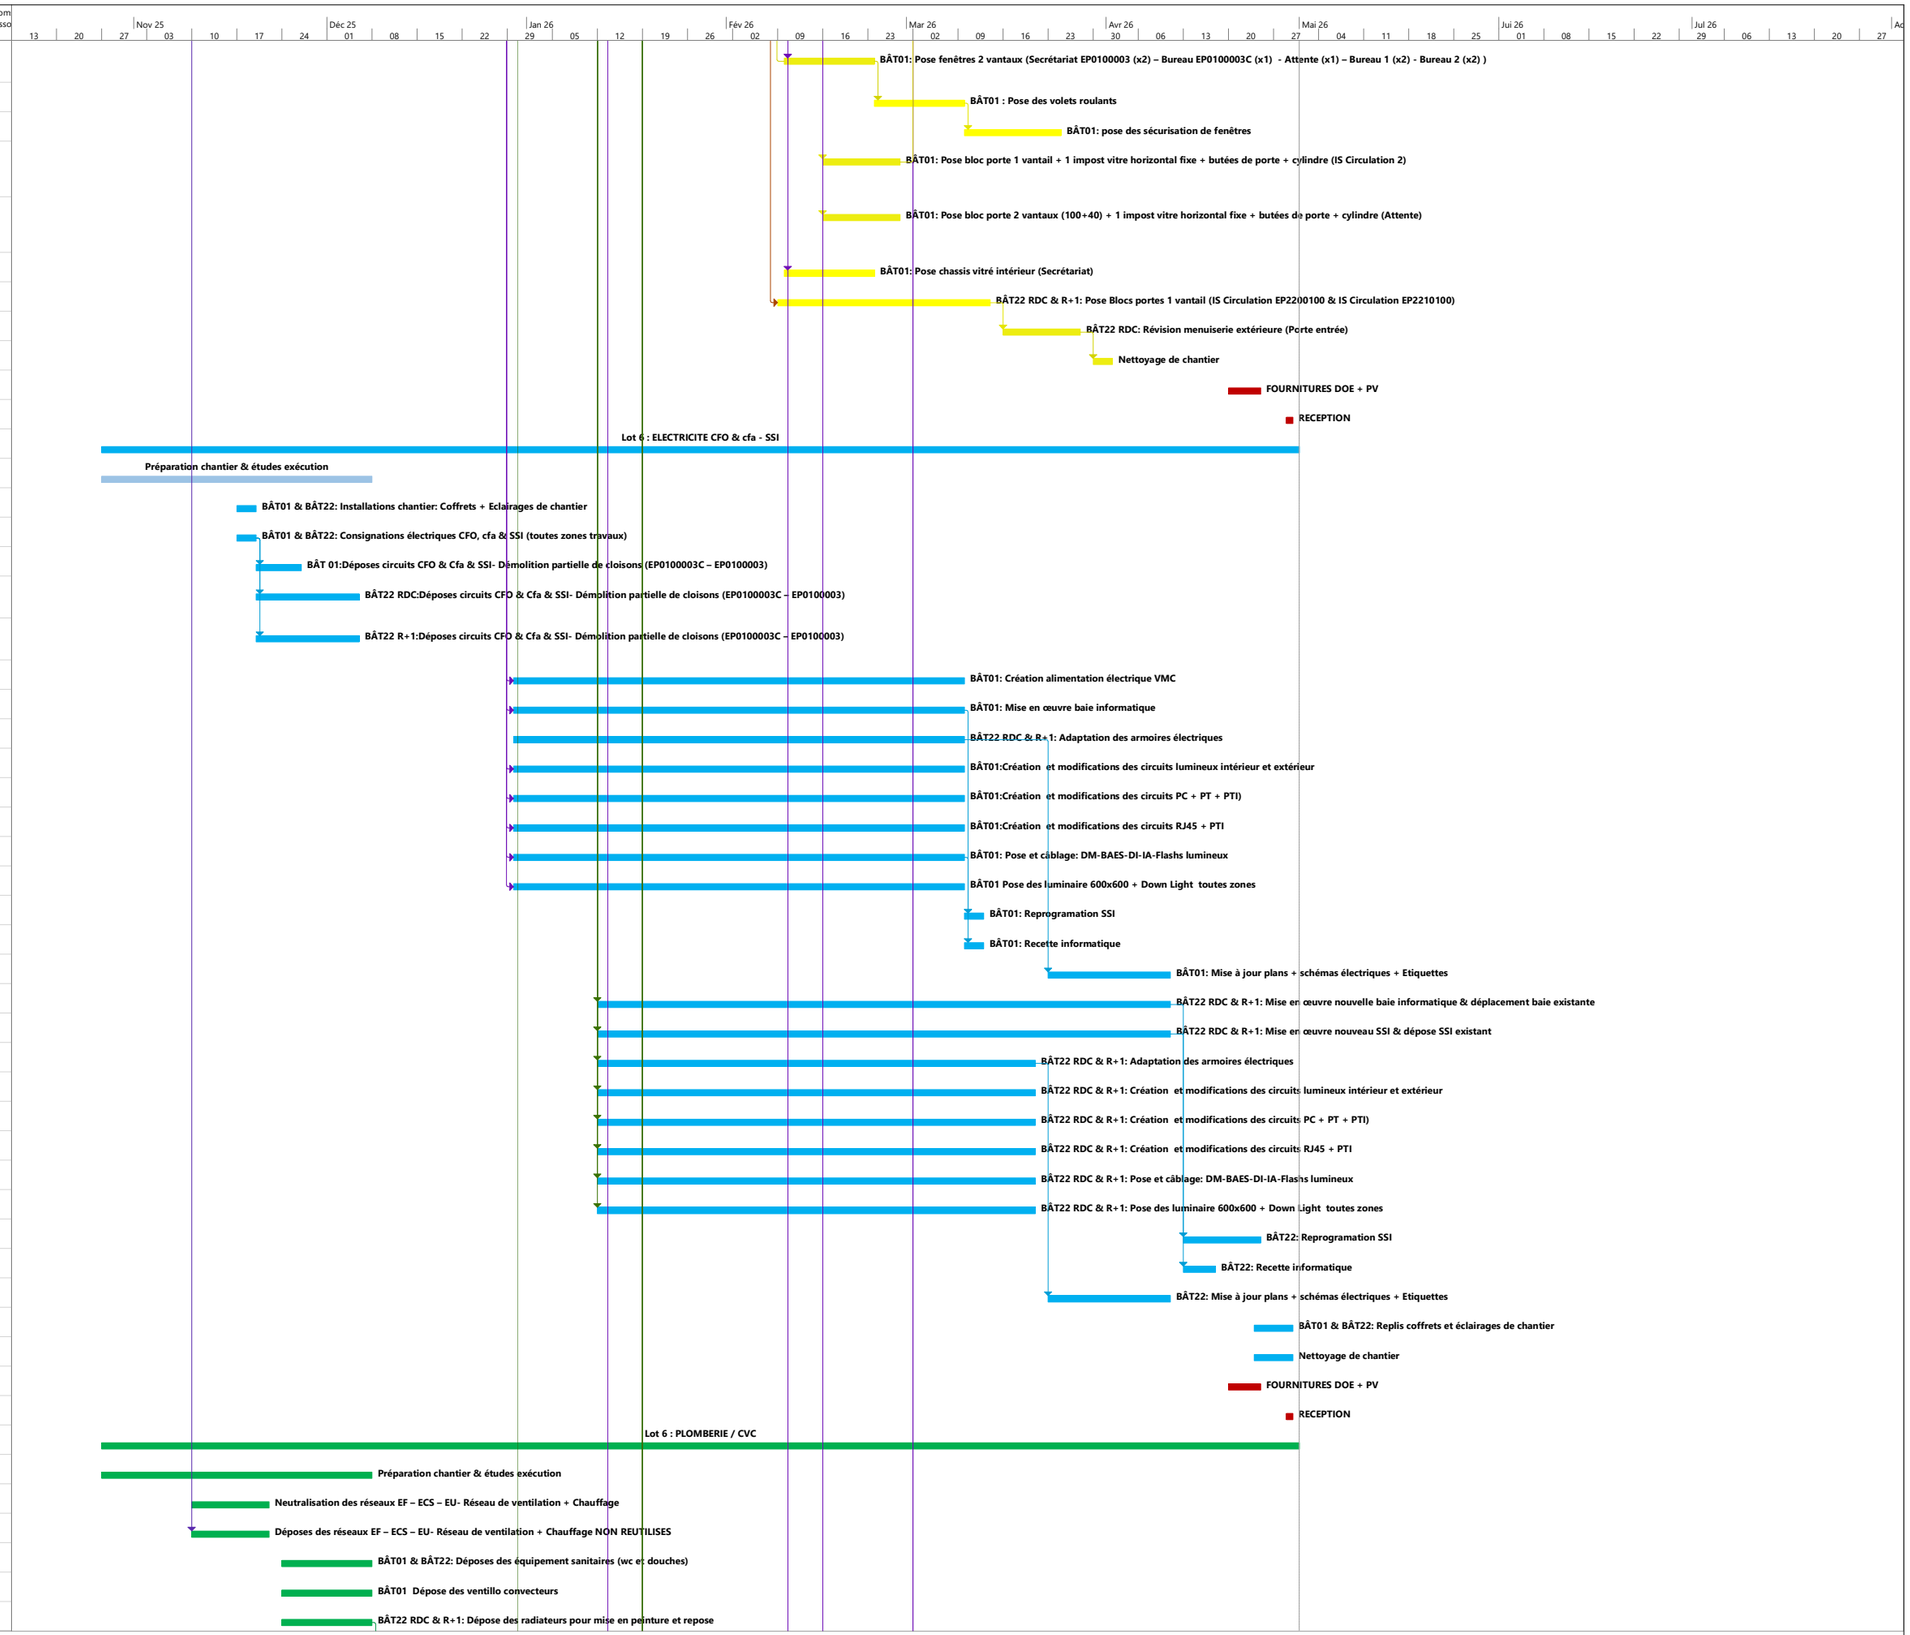

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéc	Nom ressou
152		BÂT01: Déposes du groupe et des unités climatisation	10 jrs	Lun 24/11/25	Dim 07/12/25		
153		BÂT01: Mise en œuvre caisson VMC	5 jrs	Mar 30/12/25	Lun 05/01/26	14	
154		BÂT01 : Créations et adaptations des réseaux radiateurs	15 jrs	Mar 10/02/26	Lun 02/03/26	70	
155		BÂT01 : Pose et repose radiateurs	5 jrs	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	154	
156		BÂT01 : Réalisation des réseaux EF-ECS-EU (WC PMR)	15 jrs	Mar 13/01/26	Lun 02/02/26	71	
157		BÂT01: Réalisation des réseaux EF-ECS-EU	10 jrs	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26	70	
158		BÂT01: Equipement sanitaire PMR	5 jrs	Mar 03/02/26	Lun 09/02/26	156	
159		Bât22 RDC & R+1: Adaptation des réseaux de ventilation et suppression des antennes NON REUTILISEES	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	77	
160		Bât22 RDC & R+1: Créations et adaptations des réseaux radiateurs	10 jrs	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	77	
161		Bât22 RDC & R+1: Pose et repose radiateurs	15 jrs	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26	160	
162		Bât22 RDC & R+1: Créations et adaptations des réseaux radiateurs	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
163		Bât22 RDC & R+1: Réalisation des réseaux EF-ECS-EU (DES SANITAIRES & DOUCHES)	20 jrs	Lun 16/02/26	Ven 13/03/26	77	
164		Bât22 RDC & R+1: Réalisation des réseaux EF-ECS-EU	15 jrs	Lun 16/02/26	Ven 06/03/26	77	
165		Bât22 RDC & R+1: Equipement sanitaire DES SANITAIRES & DOUCHES	10 jrs	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	196	
166		Bât22 RDC Raccordement paillasse (EP2200007)	5 jrs	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	164	
167		Nettoyage de chantier	30 jrs	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
168		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
169		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		
170		**Lot 8 : REVETEMENTS SOLS & PAROIS - PEINTURE**	134 jrs	Lun 27/10/25	Jeu 30/04/26		
171		Préparation chantier & études exécution	30 jrs?	Lun 27/10/25	Dim 07/12/25		
172		Protection d'ouvrage avant peinture	2 jrs	Lun 02/09/24	Mar 03/09/24		
173		Bât01 & BÂT22:/ Mise en peinture radiateur	35 jrs	Lun 08/12/25	Ven 23/01/26	151	
174		BÂT01: Préparation des murs supports neufs et pose toile de verre	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	70	
175		BÂT01: Préparation des murs supports existant avec pose toile de verre sur revêtement mural existant	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	70	
176		BÂT01: Mise en peinture des murs après pose de la toile de verre	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	70	
177		BÂT01: Mise en peinture des murs avec préparation sans pose de toile de verre	10 jrs	Mar 17/02/26	Lun 02/03/26	176	
178		BÂT01 Peinture métaux et bois	10 jrs	Mar 17/02/26	Lun 02/03/26	176	
179		BÂT01: Préparation de sol + ragréage	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	70	
180		BÂT01: Pose sol PVC (Salle de préparation)	5 jrs	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	179	
181		BÂT01: Préparation du sol zones humides	5 jrs	Mar 13/01/26	Lun 19/01/26	71	
182		BÂT01: Pose des carrelages & plinthes à gorges	5 jrs	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	181	
183		BÂT01: Préparation des murs zones humides	5 jrs	Mar 13/01/26	Lun 19/01/26	71	
184		BÂT01: Pose faïences + miroirs	10 jrs	Mar 27/01/26	Lun 09/02/26	182	
185		Nettoyage de chantier	4 jrs	Ven 24/04/26	Mer 29/04/26		
186		BÂT22 RDC & R+1: Préparation des murs supports neufs et pose toile de verre	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	20	
187		BÂT22 RDC & R+1: Préparation des murs supports existant avec pose toile de verre sur revêtement mural existant	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	20	
188		BÂT22 RDC & R+1: Mise en peinture des murs après pose de la toile de verre	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	20	
189		BÂT22 RDC & R+1: Mise en peinture des murs avec préparation sans pose de toile de verre	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	20	
190		BÂT22 RDC & R+1 Peinture métaux et bois	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	20	
191		BÂT22 RDC & R+1: Préparation de sol + ragréage	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	20	
192		BÂT22 RDC & R+1: Pose sol PVC (Salle de préparation)	55 jrs	Lun 19/01/26	Ven 03/04/26	191DD	
193		BÂT22 RDC & R+1: Préparation du sol zones humides	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	85	
194		BÂT22 RDC & R+1: Pose des carrelages & plinthes à gorges	10 jrs	Lun 09/03/26	Ven 20/03/26	193	
195		BÂT22 RDC & R+1: Préparation des murs zones humides	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	85	
196		BÂT22 RDC & R+1: Pose faïences + miroirs	15 jrs	Lun 23/03/26	Ven 10/04/26	194	
197		BÂT22 RDC & R+1 Nettoyage de chantier	4 jrs	Ven 24/04/26	Mer 29/04/26		
198		BÂT 01 & 22 nettoyage zones travaux avant réception	3 jrs	Lun 27/04/26	Mer 29/04/26		
199		FOURNITURES DOE + PV	5 jrs	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26		
200		RECEPTION	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26		

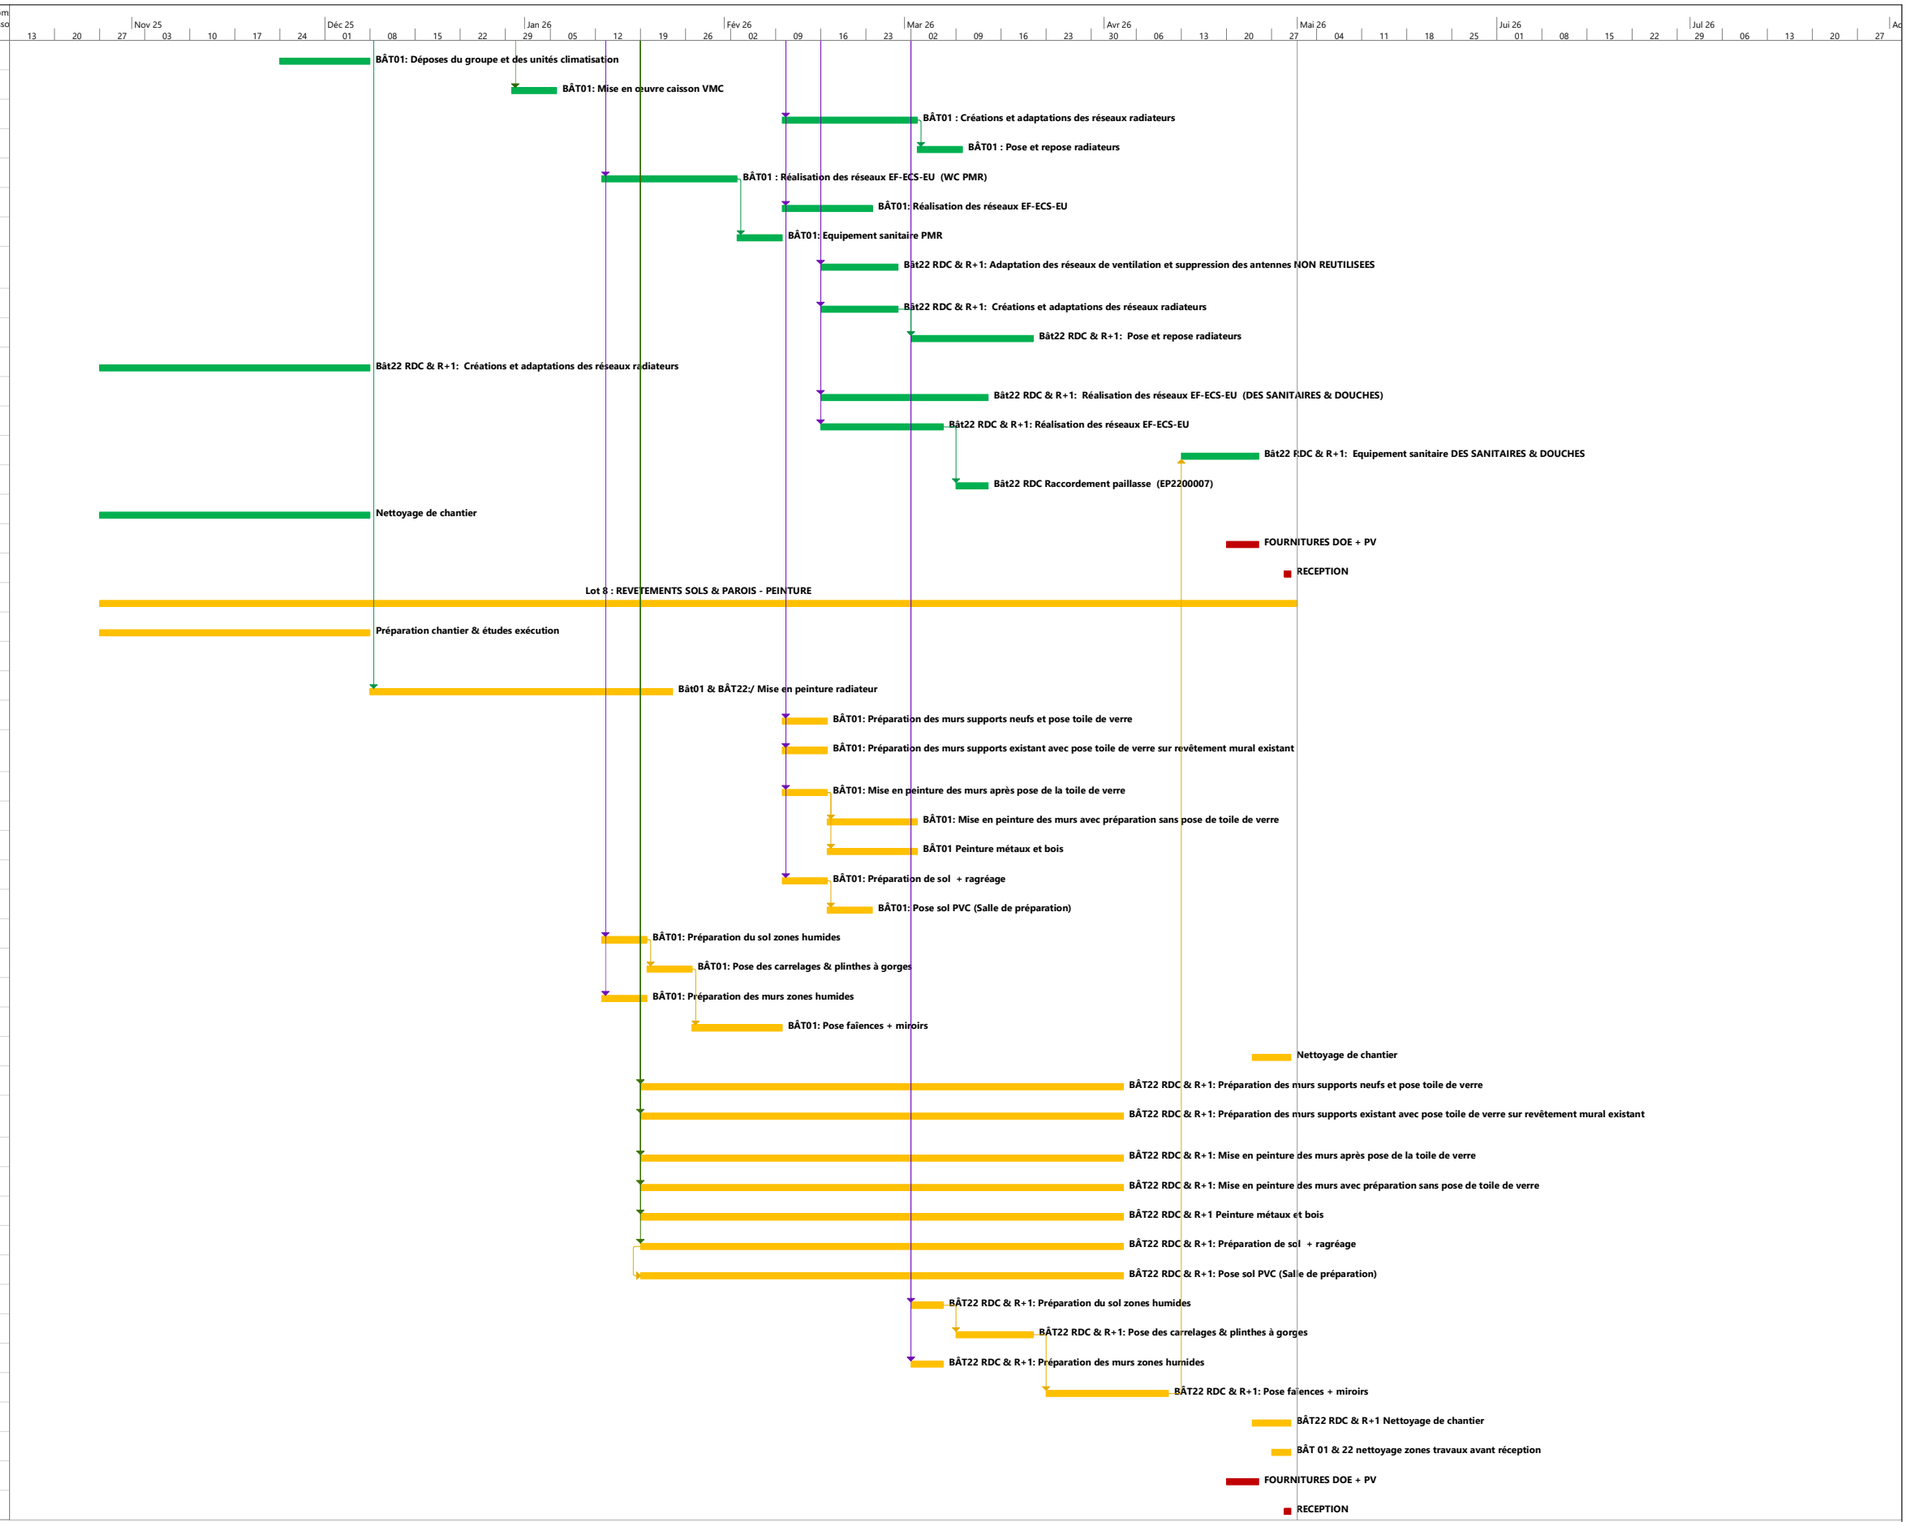

Aoû 26					Sep 26					Oct 26					Nov 26					Déc 26					Jan 27					Fév 27					Mar 27					Avr 27					Mai 27					Jui 27					Jul 27					Aoû 27
27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02

Aoû 26					Sep 26					Oct 26					Nov 26					Déc 26					Jan 27					Fév 27					Mar 27					Avr 27					Mai 27					Jui 27					Jul 27					Aoû 27
27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02

Aoû 26					Sep 26					Oct 26					Nov 26					Déc 26					Jan 27					Fév 27					Mar 27					Avr 27					Mai 27					Jui 27					Jul 27					Aoû 27
27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02

Aoû 26					Sep 26					Oct 26					Nov 26					Déc 26					Jan 27					Fév 27					Mar 27					Avr 27					Mai 27					Jui 27					Jul 27					Aoû 27
27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02
