RECTORAT DE STRASBOURG

IMPLANTATION DE SERVICES ACADEMIQUES DANS LES LOCAUX DE L'INSPE

Planning prévisionnel des travaux **MAJ** en date du 23 avril 2025
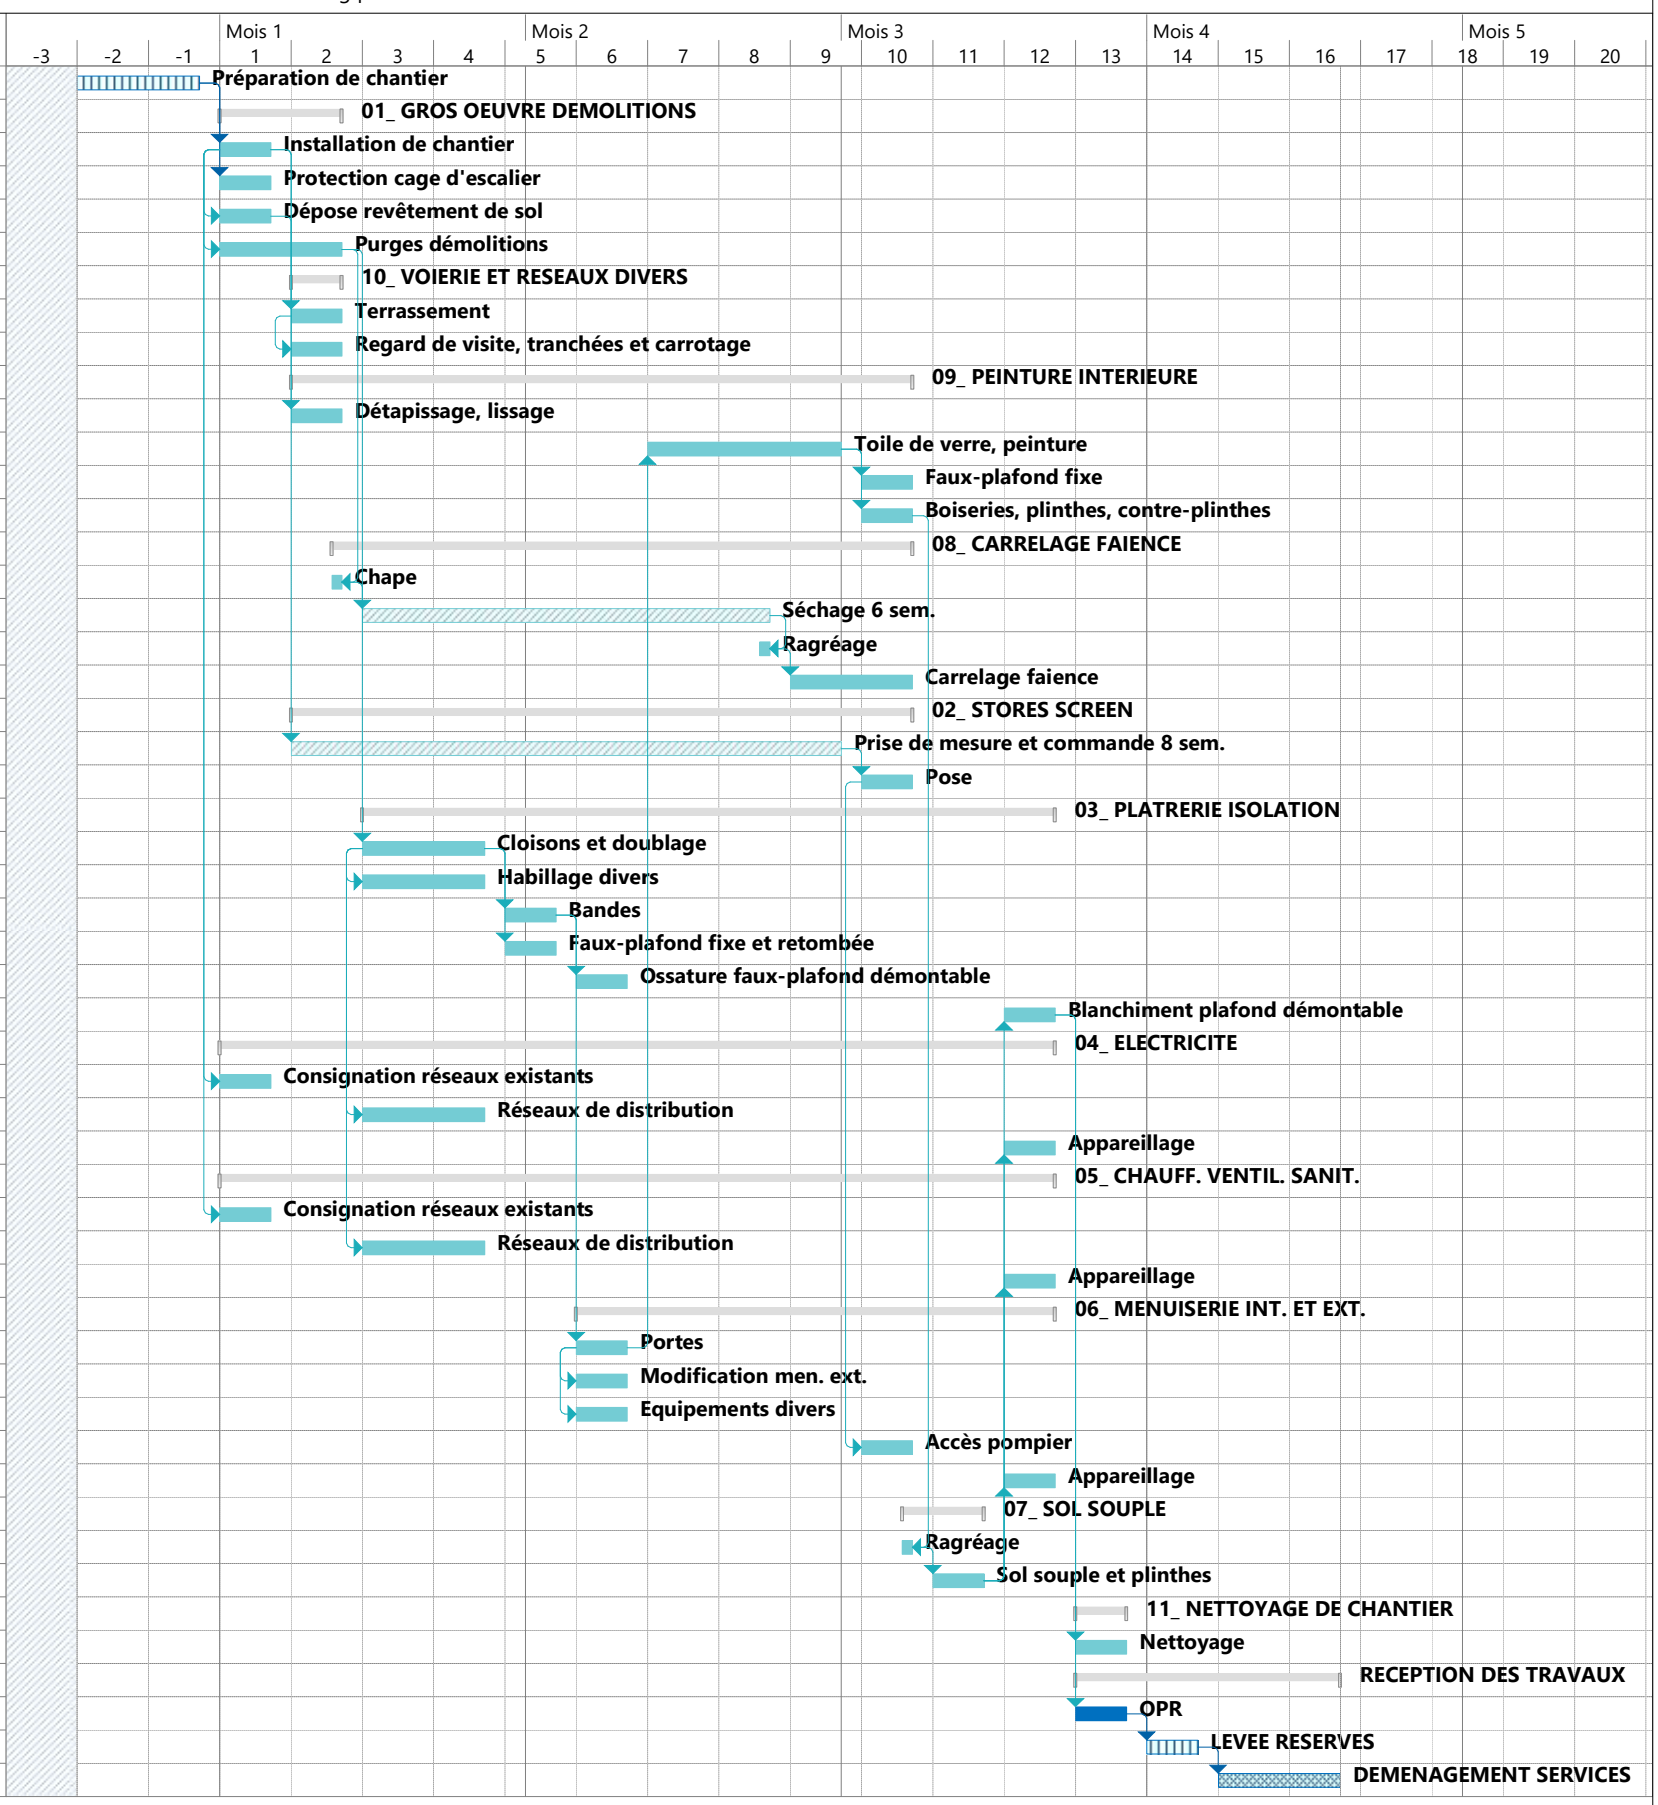
N°	Nom de la tâche
1	Préparation de chantier
2	**01_ GROS OEUVRE DEMOLITIONS**
3	Installation de chantier
4	Protection cage d'escalier
5	Dépose revêtement de sol
6	Purges démolitions
7	**10_ VOIERIE ET RESEAUX DIVERS**
8	Terrassement
9	Regard de visite, tranchées et carrotage
10	**09_ PEINTURE INTERIEURE**
11	Détapissage, lissage
12	Toile de verre, peinture
13	Faux-plafond fixe
14	Boiseries, plinthes, contre-plinthes
15	**08_ CARRELAGE FAIENCE**
16	Chape
17	Séchage 6 sem.
18	Ragréage
19	Carrelage faience
20	**02_ STORES SCREEN**
21	Prise de mesure et commande 8 sem.
22	Pose
23	**03_ PLATRERIE ISOLATION**
24	Cloisons et doublage
25	Habillage divers
26	Bandes
27	Faux-plafond fixe et retombée
28	Ossature faux-plafond démontable
29	Blanchiment plafond démontable
30	**04_ ELECTRICITE**
31	Consignation réseaux existants
32	Réseaux de distribution
33	Appareillage
34	**05_ CHAUFF. VENTIL. SANIT.**
35	Consignation réseaux existants
36	Réseaux de distribution
37	Appareillage
38	**06_ MENUISERIE INT. ET EXT.**
39	Portes
40	Modification men. ext.
41	Equipements divers
42	Accès pompier
43	Appareillage
44	**07_ SOL SOUPLE**
45	Ragréage
46	Sol souple et plinthes
47	**11_ NETTOYAGE DE CHANTIER**
48	Nettoyage
49	**RECEPTION DES TRAVAUX**
50	OPR
51	LEVEE RESERVES
52	DEMENAGEMENT SERVICES
