N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Pré-étude**	**208 jours**	**Jeu 24/10/24**	**Lun 11/08/25**
23		**Consultation**	**61 jours**	**Lun 14/07/25**	**Lun 06/10/25**
24		**Préparation consultation**	**16 jours**	**Lun 14/07/25**	**Lun 04/08/25**
28		Consultation des entreprises	35 jours	Mar 05/08/25	Lun 22/09/25
29		Analyse des offres	5 jours	Mar 23/09/25	Lun 29/09/25
30		Passation des marchés	10 jours	Mar 23/09/25	Lun 06/10/25
31		**Travaux**	**21 jours**	**Mar 14/10/25**	**Mar 11/11/25**
32		Kick-Off Travaux	1 jour	Mar 14/10/25	Mar 14/10/25
33		Mois de préparation de chantier	20 jours	Mer 15/10/25	Mar 11/11/25
34		**Aménagements**	**71 jours**	**Mer 15/10/25**	**Mer 21/01/26**
88		Aménagements - OPR	2 jours	Ven 19/12/25	Lun 22/12/25
89		Aménagements - Mise à disposition p263 pour installation équipements	0 jour	Jeu 18/12/25	Jeu 18/12/25
90		**CFO/CFA**	**65 jours**	**Mer 15/10/25**	**Mar 13/01/26**
114		CFO/CFA - OPR	2 jours	Mer 31/12/25	Jeu 01/01/26
115		CFO/CFA - Raccordement possible	0 jour	Ven 26/12/25	Ven 26/12/25
116		**Fluides/Gaz**	**112 jours**	**Mer 15/10/25**	**Jeu 19/03/26**
173		Fluides/Gaz - Approvisionnement	30 jours	Ven 31/10/25	Jeu 11/12/25
174		Fluides/Gaz - OPR	5 jours	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26
175		Fluides/Gaz - Gaz Dispo sur équipement	0 jour	Jeu 09/04/26	Jeu 09/04/26
176		**CVC**	**79 jours**	**Mer 15/10/25**	**Lun 02/02/26**
275		CVC - OPR	2 jours	Mar 20/01/26	Mer 21/01/26
276		CVC - VEX 263 DISPO	0 jour	Lun 29/12/25	Lun 29/12/25
277		**Qualification**	**25 jours**	**Ven 06/03/26**	**Jeu 09/04/26**
278		Contrôle réglementaires	15 jours	Ven 06/03/26	Jeu 26/03/26
279		Tests matrices - lot Fluides/gaz et CVC	10 jours	Ven 27/03/26	Jeu 09/04/26
280		**ALE/ALD**	**222 jours**	**Mer 15/10/25**	**Jeu 20/08/26**
281		SENTECH/CEA - Livraison ALE ALD	0 jour	Mer 15/10/25	Mer 15/10/25
282		SENTECH - Qualif	90 jours	Ven 17/04/26	Jeu 20/08/26
283		ATB	5,13 jours	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25
284		Fermeture CEA	7,13 jours	Mer 24/12/25	Jeu 01/01/26

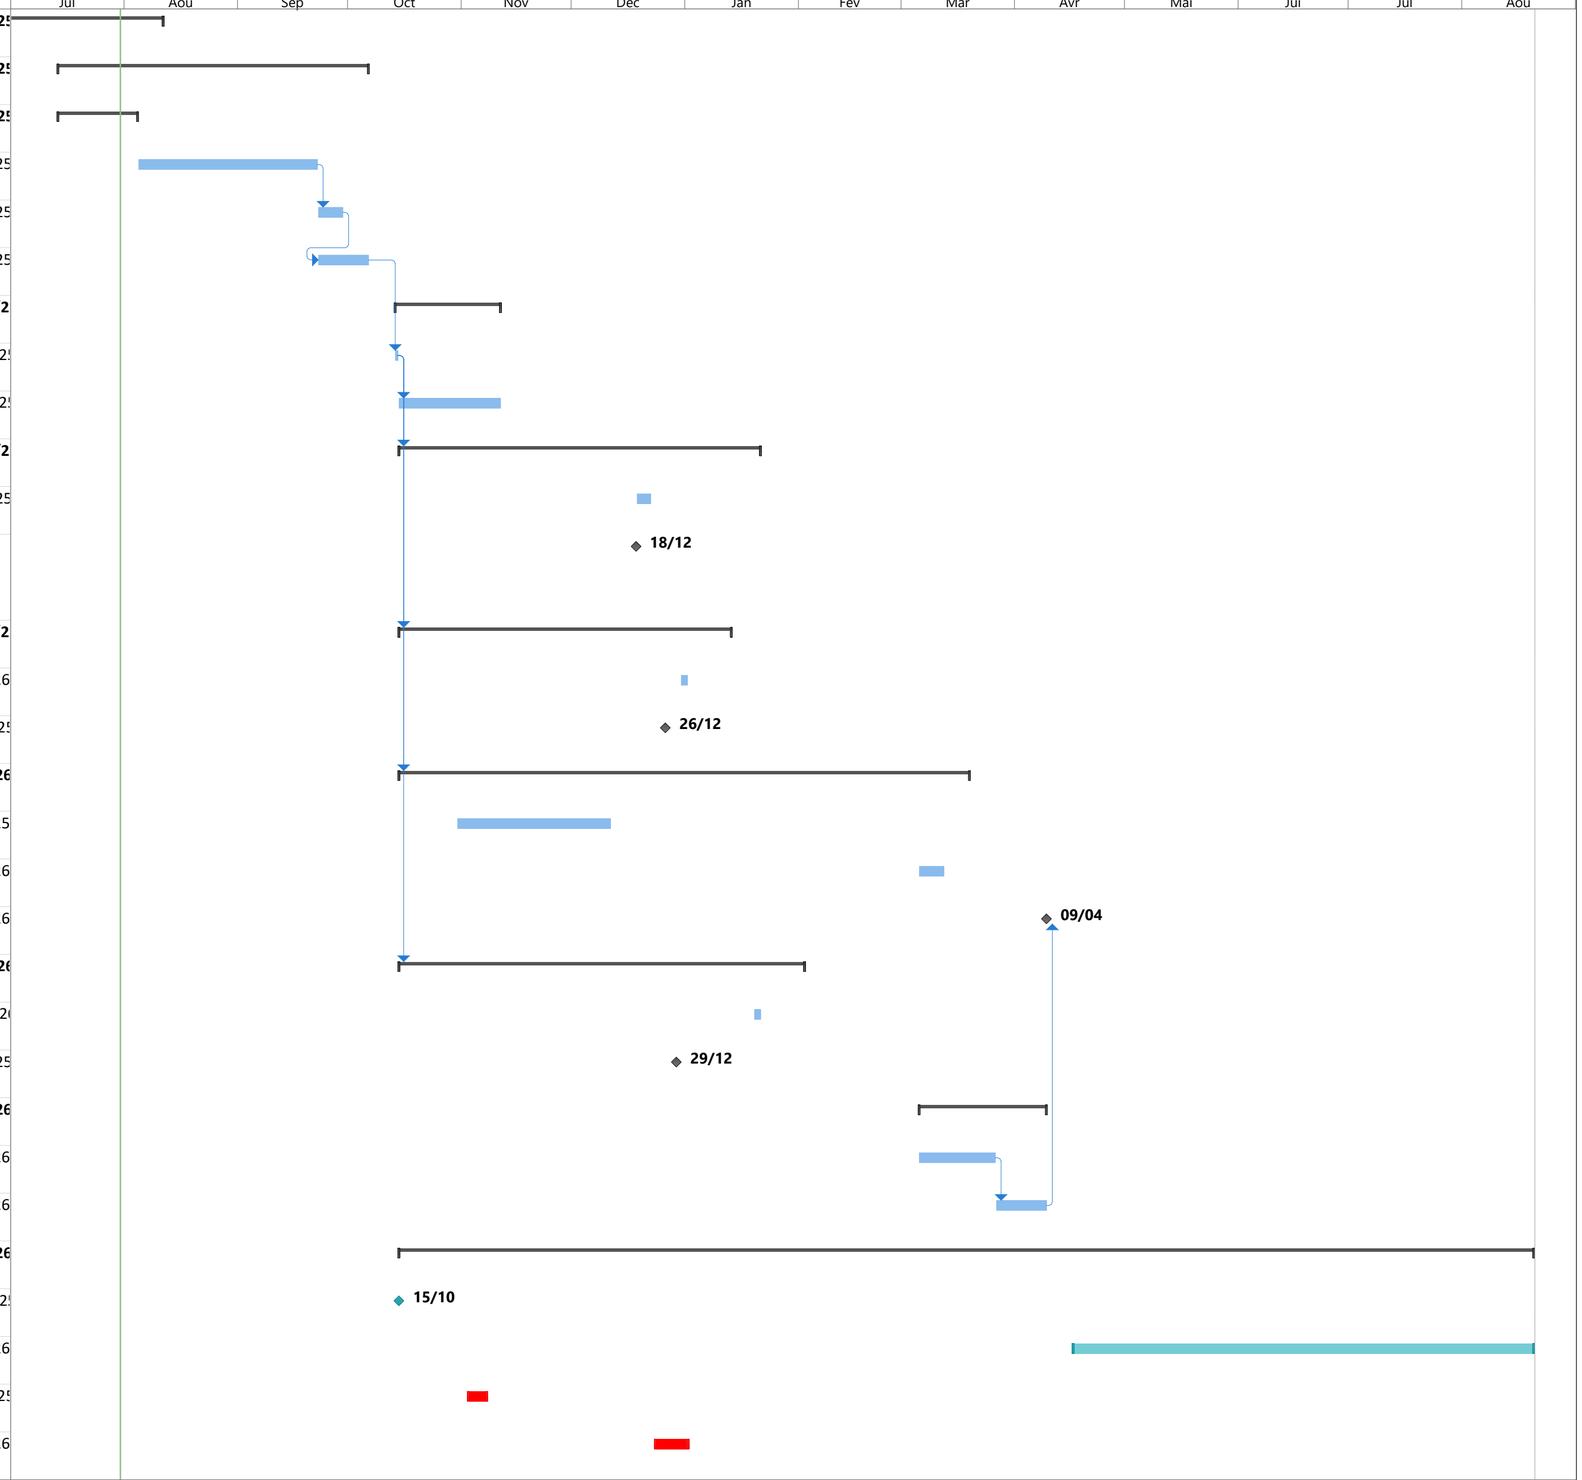

Projet : Project1
Date : Jeu 31/07/25

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	
