Diagramme de Gantt
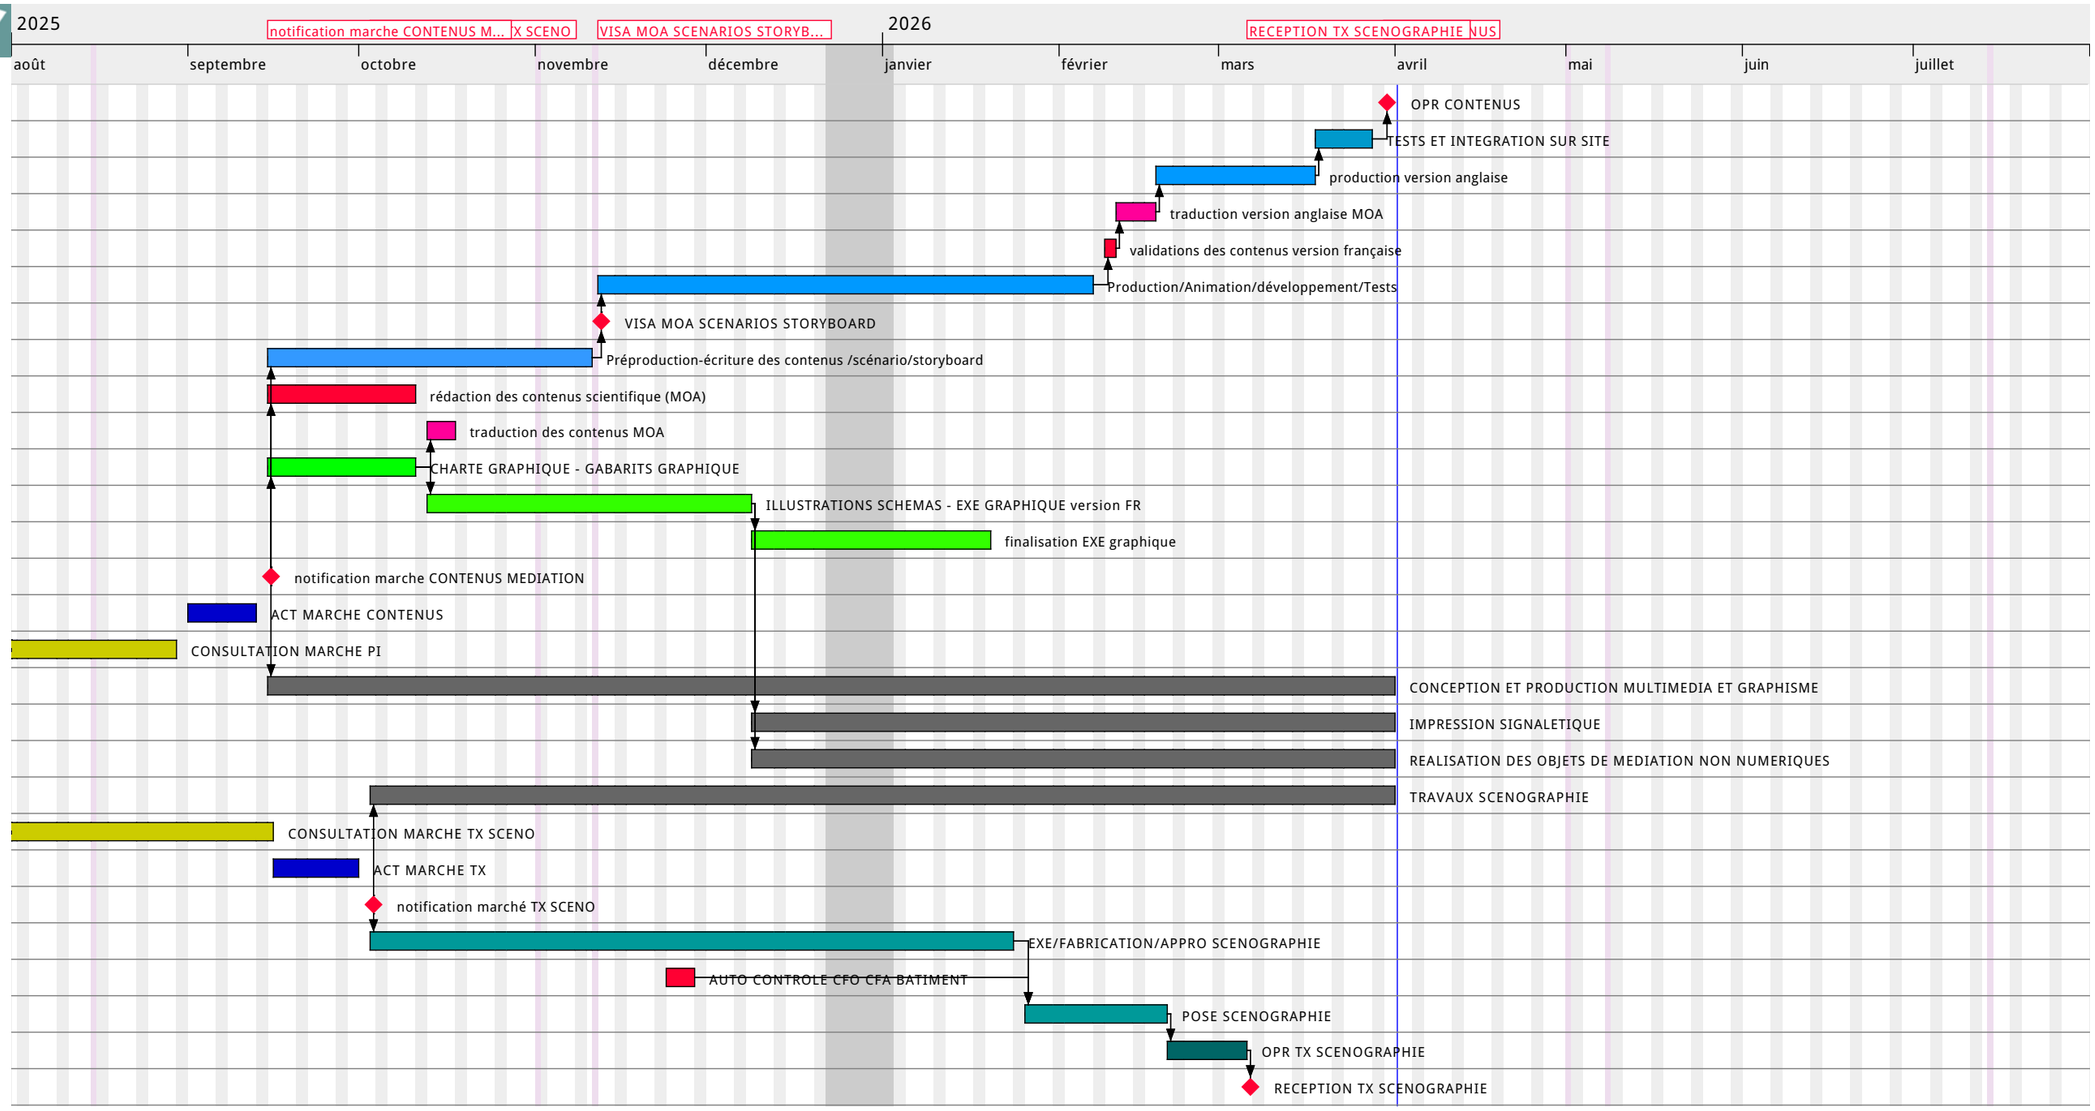
Nom	Date de début	Date de fin
OPR CONTENUS	30/03/2026	30/03/2026
TESTS ET INTEGR...	18/03/2026	27/03/2026
production vers...	18/02/2026	17/03/2026
traduction vers...	11/02/2026	17/02/2026
validations des...	09/02/2026	10/02/2026
Production/Anim...	12/11/2025	06/02/2026
VISA MOA SCENAR...	12/11/2025	12/11/2025
Préproduction-é...	15/09/2025	10/11/2025
rédaction des c...	15/09/2025	10/10/2025
traduction des ...	13/10/2025	17/10/2025
CHARTE GRAPHIQU...	15/09/2025	10/10/2025
ILLUSTRATIONS S...	13/10/2025	08/12/2025
finalisation EX...	09/12/2025	19/01/2026
notification ma...	15/09/2025	15/09/2025
ACT MARCHE CONT...	01/09/2025	12/09/2025
CONSULTATION MA...	18/07/2025	29/08/2025
CONCEPTION ET P...	15/09/2025	31/03/2026
IMPRESSION SIGN...	09/12/2025	31/03/2026
REALISATION DES...	09/12/2025	31/03/2026
TRAVAUX SCENOGR...	03/10/2025	31/03/2026
CONSULTATION MA...	31/07/2025	15/09/2025
ACT MARCHE TX	16/09/2025	30/09/2025
notification ma...	03/10/2025	03/10/2025
EXE/FABRICATION...	03/10/2025	23/01/2026
AUTO CONTROLE C...	24/11/2025	28/11/2025
POSE SCENOGRAPHIE	26/01/2026	19/02/2026
OPR TX SCENOGRAPHIE	20/02/2026	05/03/2026
RECEPTION TX SC...	06/03/2026	06/03/2026
