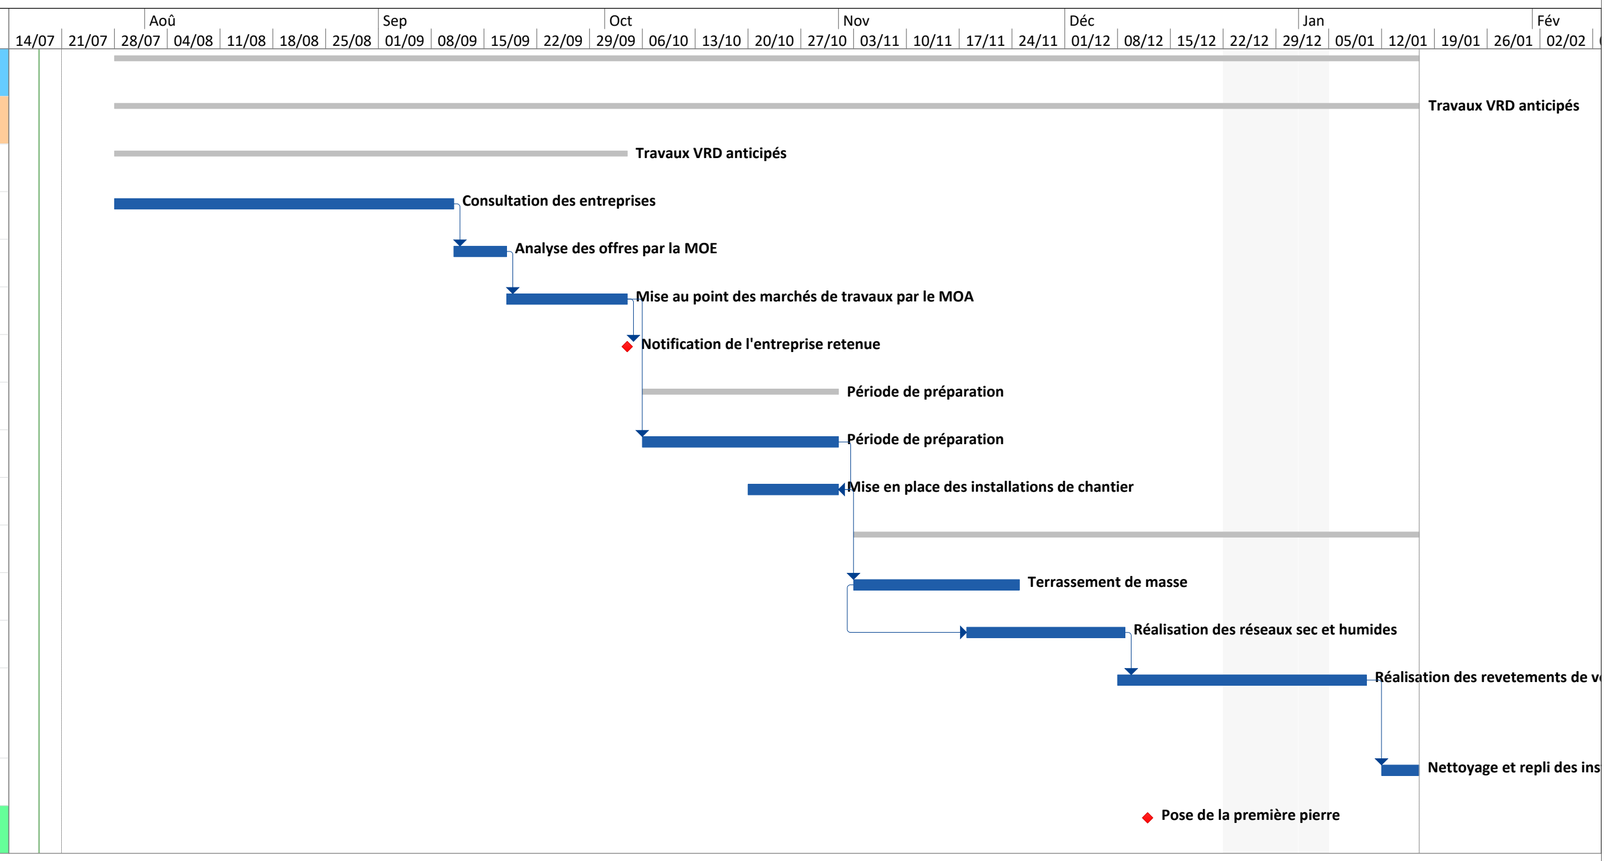N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Projet Hopital Commun Sud-Aveyron**	**114 jrs**	**Lun 28/07/25**	**Ven 16/01/26**
2	**Travaux VRD anticipés**	**114 jrs**	**Lun 28/07/25**	**Ven 16/01/26**
3	**Marchés de travaux**	**50 jrs**	**Lun 28/07/25**	**Ven 03/10/25**
4	Consultation des entreprises	33 jrs	Lun 28/07/25	Mer 10/09/25
5	Analyse des offres par la MOE	5 jrs	Jeu 11/09/25	Mer 17/09/25
6	Mise au point des marchés de travaux par le MOA	12 jrs	Jeu 18/09/25	Ven 03/10/25
7	Notification de l'entreprise retenue	0 jr	Ven 03/10/25	Ven 03/10/25
8	**Période de préparation**	**20 jrs**	**Lun 06/10/25**	**Ven 31/10/25**
9	Période de préparation	20 jrs	Lun 06/10/25	Ven 31/10/25
10	Mise en place des installations de chantier	10 jrs	Lun 20/10/25	Ven 31/10/25
11	**Travaux**	**44 jrs**	**Lun 03/11/25**	**Ven 16/01/26**
12	Terrassement de masse	15 jrs	Lun 03/11/25	Lun 24/11/25
13	Réalisation des réseaux sec et humides	15 jrs	Mar 18/11/25	Lun 08/12/25
14	Réalisation des revetements de voiries (tri-couche y compris pose des bordures et caniveaux	15 jrs	Lun 08/12/25	Ven 09/01/26
15	Nettoyage et repli des installations de chantier	5 jrs	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26
16	**Pose de la première pierre**	**0 jr**	**Ven 12/12/25**	**Ven 12/12/25**
