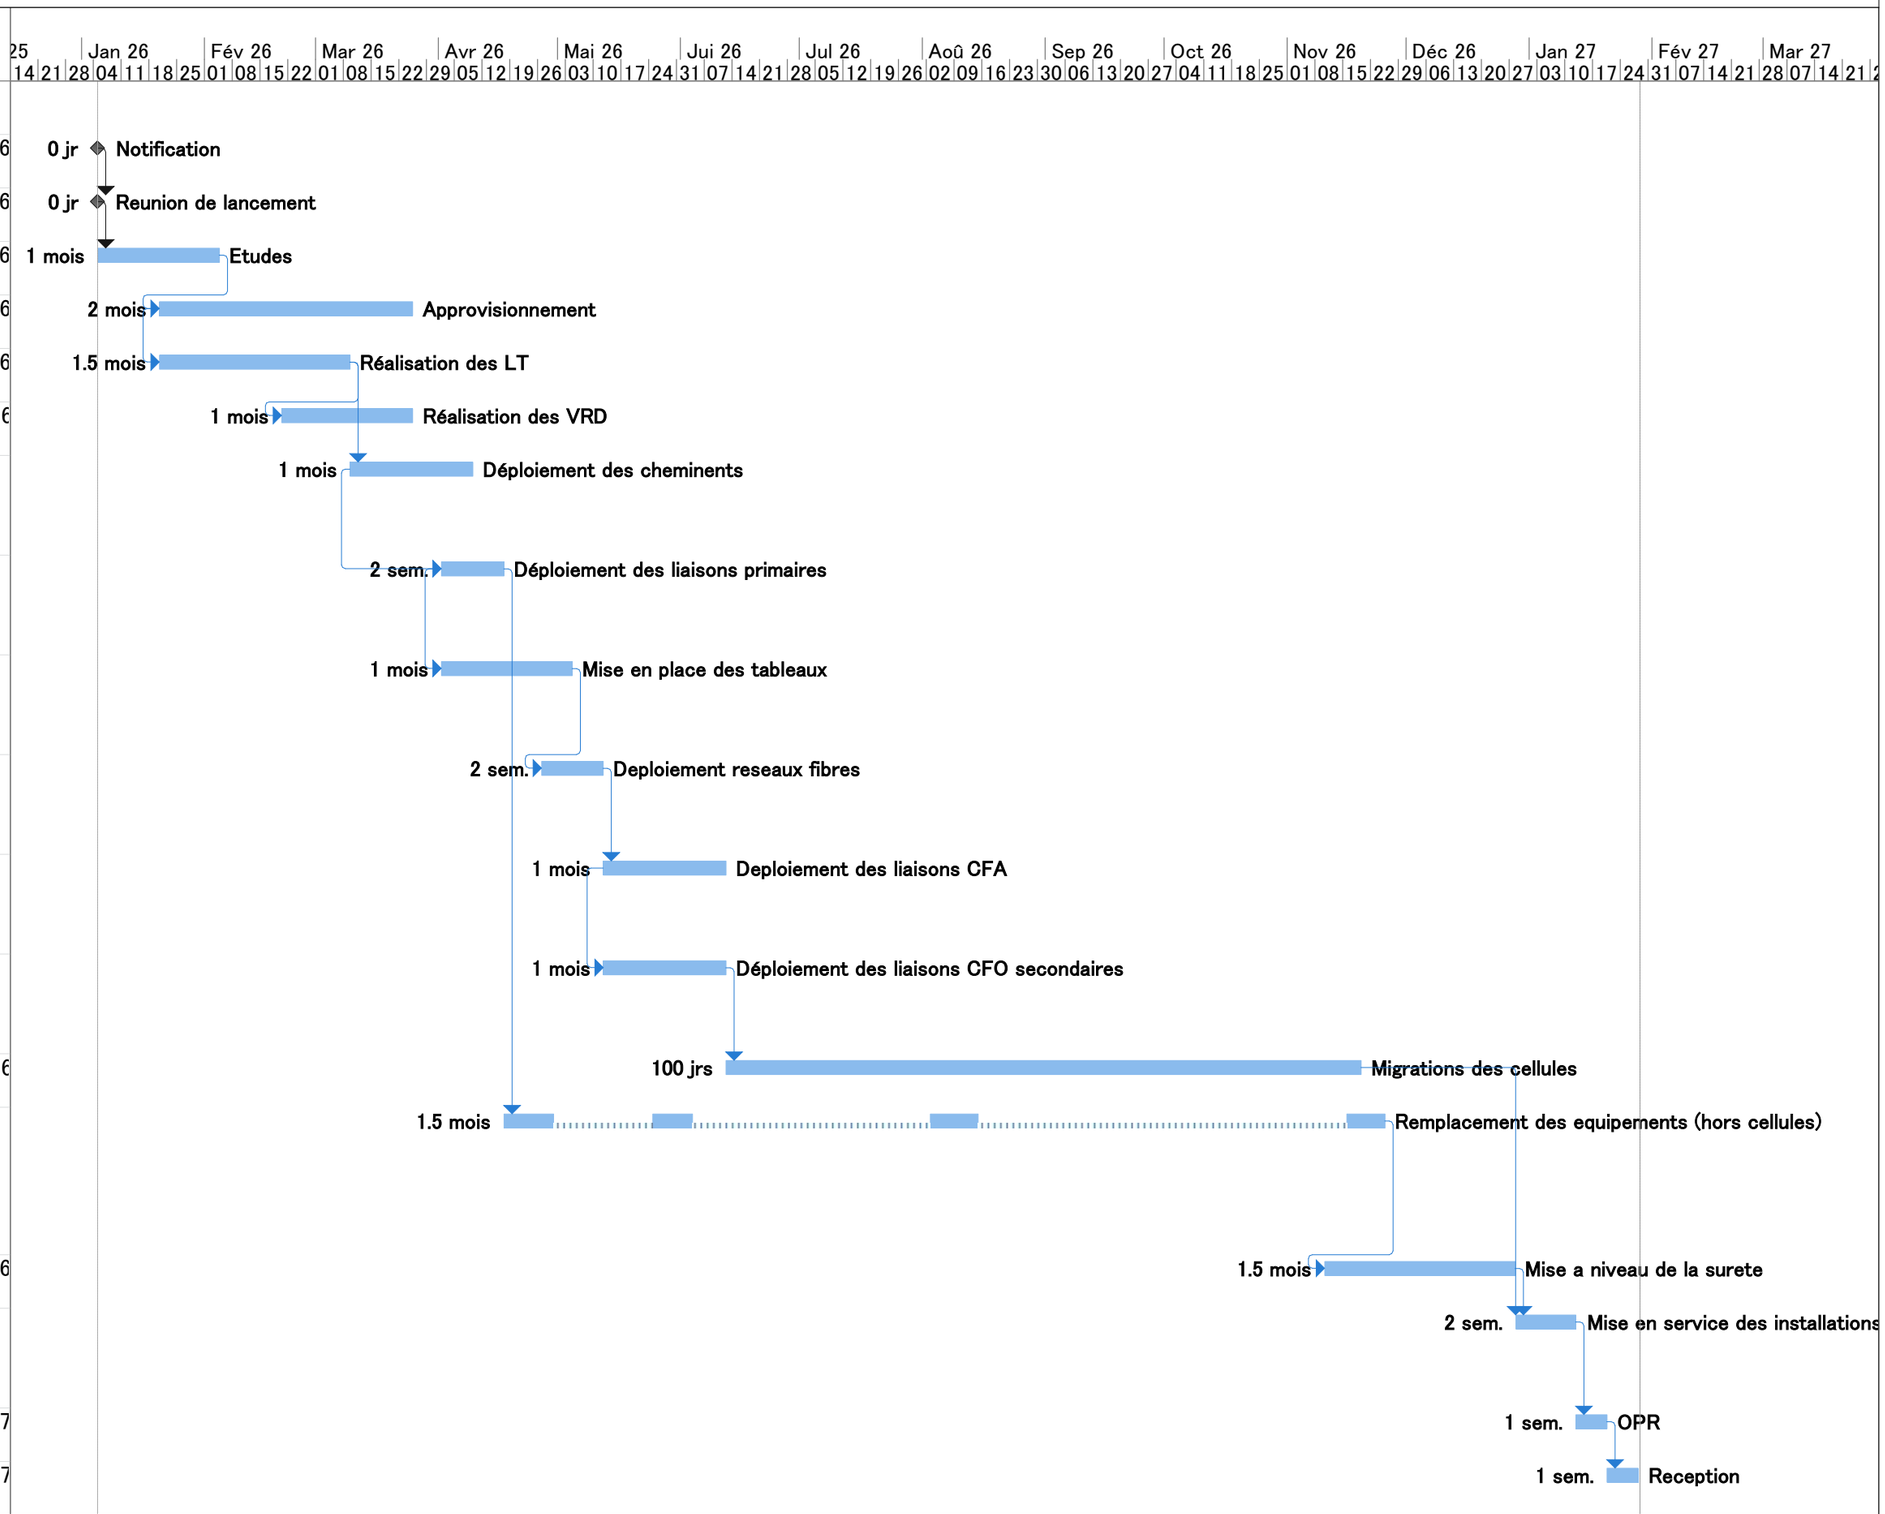N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1			
2	Notification	0 jr	Lun 05/01/26
3	Reunion de lancement	0 jr	Lun 05/01/26
4	Etudes	1 mois	Lun 05/01/26
5	Approvisionnement	2 mois	Mar 20/01/26
6	Réalisation des LT	1.5 mois	Mar 20/01/26
7	Réalisation des VRD	1 mois	Ven 20/02/26
8	Déploiement des cheminents	1 mois	Lun 09/03/26
9	Déploiement des liaisons primaires	2 sem.	Mer 01/04/26
10	Mise en place des tableaux	1 mois	Mer 01/04/26
11	Deploiement reseaux fibres	2 sem.	Lun 27/04/26
12	Deploiement des liaisons CFA	1 mois	Mar 12/05/26
13	Déploiement des liaisons CFO secondaires	1 mois	Mar 12/05/26
14	Migrations des cellules	100 jrs	Ven 12/06/26
15	Remplacement des equipements (hors cellules)	1.5 mois	Ven 17/04/26
16	Mise a niveau de la sur	1.5 mois	Mar 10/11/26
17	Mise en service des installations	2 sem.	Lun 28/12/26
18	OPR	1 sem.	Mar 12/01/27
19	Reception	1 sem.	Mer 20/01/27
