Projet de déménagement des services des la DEETS sur le site de Providence
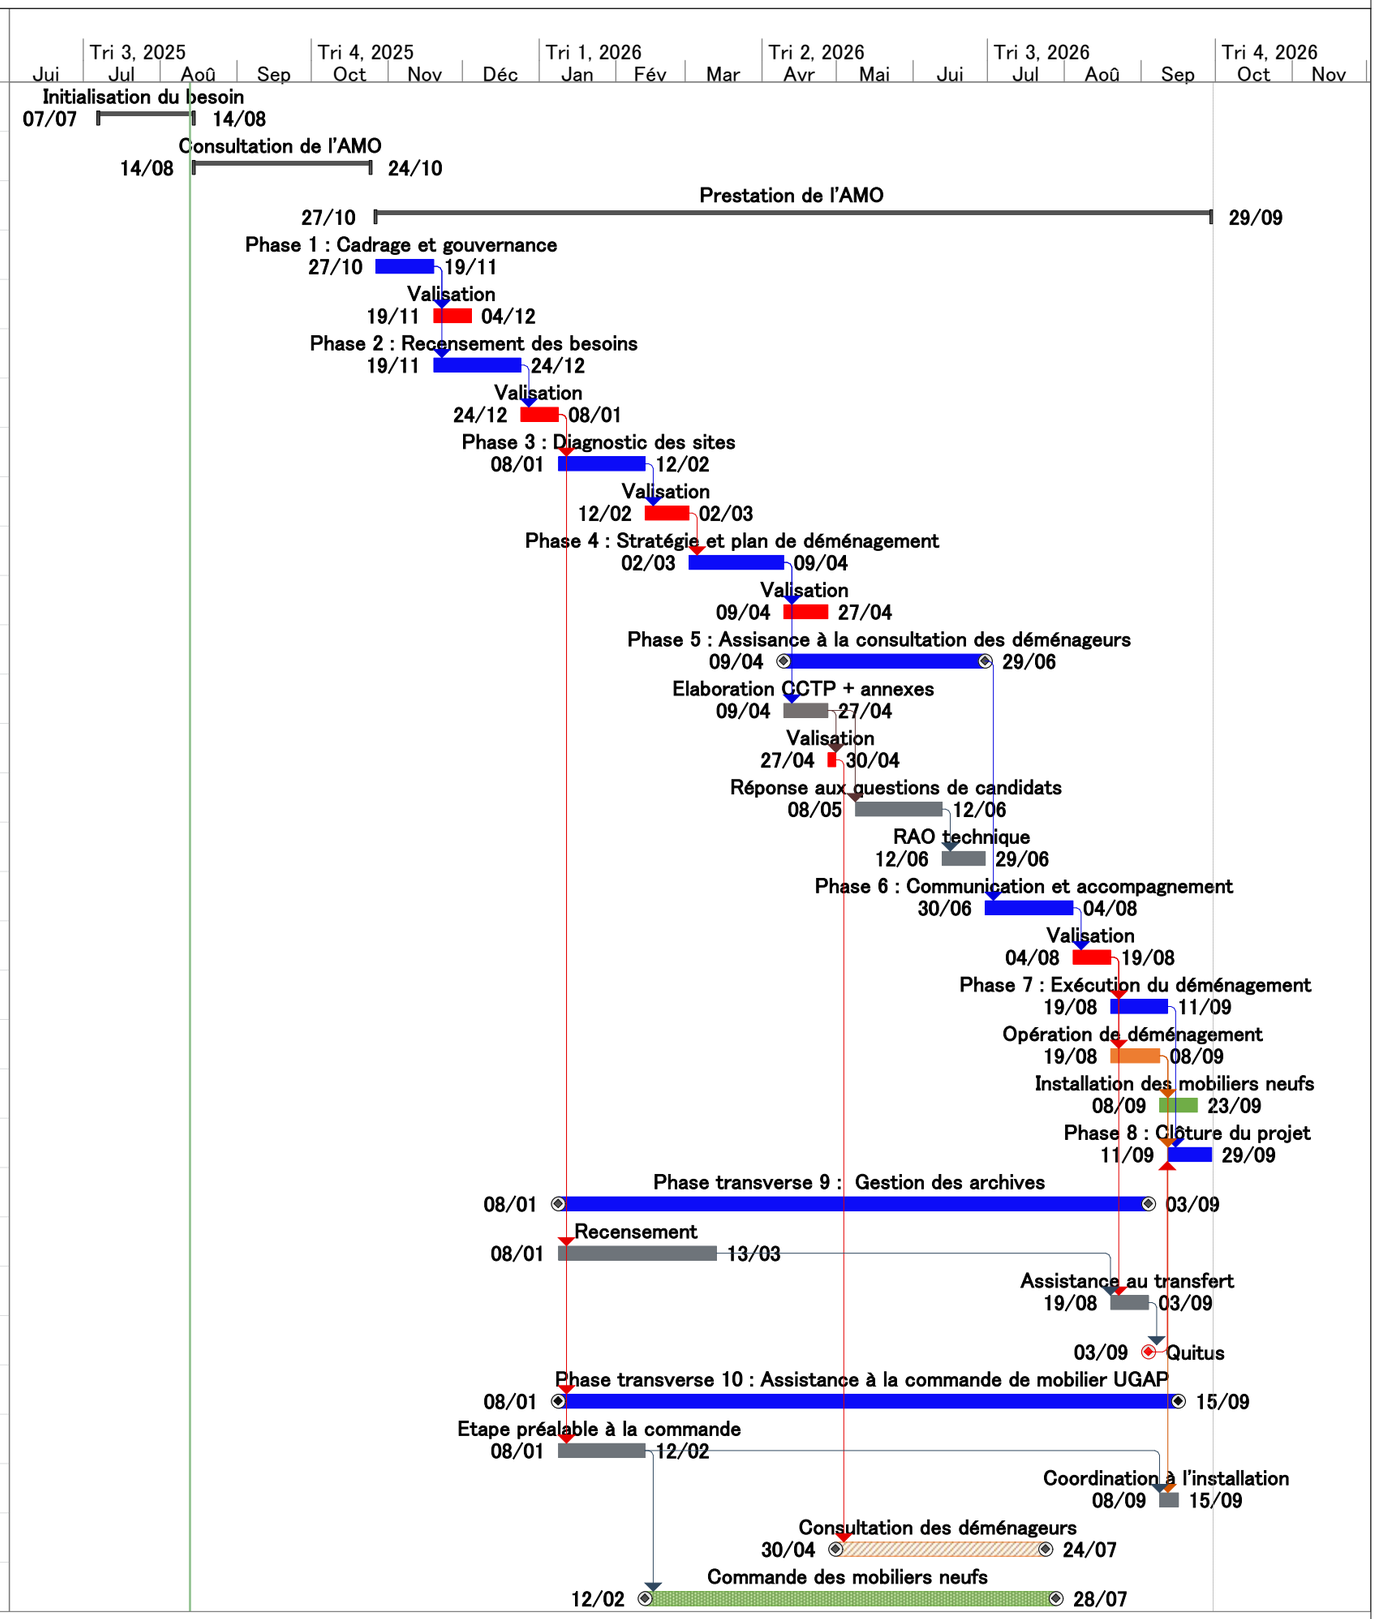
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Initialisation du besoin**	**25 jours**	**Lun 07/07/25**	**Jeu 14/08/25**
6	**Consultation de l'AMO**	**45 jours**	**Jeu 14/08/25**	**Ven 24/10/25**
15	**Prestation de l'AMO**	**211 jours**	**Lun 27/10/25**	**Mar 29/09/26**
16	Phase 1 : Cadrage et gouvernance	15 jours	Lun 27/10/25	Mer 19/11/25
17	Valisation	10 jours	Mer 19/11/25	Jeu 04/12/25
18	Phase 2 : Recensement des besoins	22 jours	Mer 19/11/25	Mer 24/12/25
19	Valisation	10 jours	Mer 24/12/25	Jeu 08/01/26
20	Phase 3 : Diagnostic des sites	22 jours	Jeu 08/01/26	Jeu 12/02/26
21	Valisation	10 jours	Jeu 12/02/26	Lun 02/03/26
22	Phase 4 : Stratégie et plan de déménagement	25 jours	Lun 02/03/26	Jeu 09/04/26
23	Valisation	10 jours	Jeu 09/04/26	Lun 27/04/26
24	Phase 5 : Assisance à la consultation des déménageurs	50 jours	Jeu 09/04/26	Lun 29/06/26
25	Elaboration CCTP + annexes	10 jours	Jeu 09/04/26	Lun 27/04/26
26	Valisation	3 jours	Lun 27/04/26	Jeu 30/04/26
27	Réponse aux questions de candidats	22 jours	Ven 08/05/26	Ven 12/06/26
28	RAO technique	10 jours	Ven 12/06/26	Lun 29/06/26
29	Phase 6 : Communication et accompagnement	22 jours	Mar 30/06/26	Mar 04/08/26
30	Valisation	10 jours	Mar 04/08/26	Mer 19/08/26
31	Phase 7 : Exécution du déménagement	15 jours	Mer 19/08/26	Ven 11/09/26
32	Opération de déménagement	12 jours	Mer 19/08/26	Mar 08/09/26
33	Installation des mobiliers neufs	10 jours	Mar 08/09/26	Mer 23/09/26
34	Phase 8 : Clôture du projet	10 jours	Ven 11/09/26	Mar 29/09/26
35	Phase transverse 9 : Gestion des archives	149 jours	Jeu 08/01/26	Jeu 03/09/26
36	Recensement	40 jours	Jeu 08/01/26	Ven 13/03/26
37	Assistance au transfert	10 jours	Mer 19/08/26	Jeu 03/09/26
38	Quitus	0 jour	Jeu 03/09/26	Jeu 03/09/26
39	Phase transverse 10 : Assistance à la commande de mobilier UGAP	156 jours	Jeu 08/01/26	Mar 15/09/26
40	Etape préalable à la commande	22 jours	Jeu 08/01/26	Jeu 12/02/26
41	Coordination à l'installation	5 jours	Mar 08/09/26	Mar 15/09/26
42	Consultation des déménageurs	53,13 jours	Jeu 30/04/26	Ven 24/07/26
52	Commande des mobiliers neufs	103 jours	Jeu 12/02/26	Mar 28/07/26
