N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**CONSULTATION MARCHE MGS**	**210 jours**	**Lun 26/05/25**	**Lun 20/04/26**
2	Rédaction des pièces marchés	5 sm	Lun 26/05/25	Ven 27/06/25
3	Echanges et relecture	2 sm	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
4	Lancement AAPC	0 jour	Ven 11/07/25	Ven 11/07/25
5	**Phase candidatures**	**6 sm**	**Lun 14/07/25**	**Lun 22/09/25**
6	Analyse candidatures	3 sm	Mar 23/09/25	Lun 13/10/25
7	Jury Sélection des équipes adminses à remettre une offre	1 jour	Mar 14/10/25	Mar 14/10/25
8	Notification des candidats	10 jours	Mer 15/10/25	Mar 28/10/25
9	Visite de site des candidats	1 jour	Mer 29/10/25	Mer 29/10/25
10	**Phase offres initiales**	**51 jours**	**Mer 29/10/25**	**Mer 14/01/26**
11	Elaboration offres initiales	6 sm	Mer 29/10/25	Mar 09/12/25
12	Analyse offres initiales	4 sm	Mer 10/12/25	Mar 13/01/26
13	Jury Offres initiales	1 jour	Mer 14/01/26	Mer 14/01/26
14	**Phase négociation**	**30 jours**	**Jeu 15/01/26**	**Mer 25/02/26**
15	Envoi documents négociation	2 sm	Jeu 15/01/26	Mer 28/01/26
16	Négociations	4 sm	Jeu 29/01/26	Mer 25/02/26
17	**Phase offres finales**	**21 jours**	**Jeu 26/02/26**	**Jeu 26/03/26**
18	Elaboration offres finales	2 sm	Jeu 26/02/26	Mer 11/03/26
19	Analyse offres finales	2 sm	Jeu 12/03/26	Mer 25/03/26
20	Jury Offres finales	1 jour	Jeu 26/03/26	Jeu 26/03/26
21	Mise au point du marché	0 sm	Jeu 26/03/26	Jeu 26/03/26
22	Etape administrative	1 sm	Ven 27/03/26	Jeu 02/04/26
23	Envoi des courriers + attente	11 jours	Ven 03/04/26	Ven 17/04/26
24	Notification du lauréat	1 jour	Lun 20/04/26	Lun 20/04/26
25	**CONCEPTION**	**151 jours**	**Mar 21/04/26**	**Mar 17/11/26**
26	**Phase APD**	**40 jours**	**Mar 21/04/26**	**Lun 15/06/26**
27	Elaboration APD	4 sm	Mar 21/04/26	Lun 18/05/26
28	Analyse et validation APD	4 sm	Mar 19/05/26	Lun 15/06/26
29	**Phase PRO**	**65 jours**	**Mar 16/06/26**	**Lun 14/09/26**
30	Elaboration PRO	6 sm	Mar 16/06/26	Lun 27/07/26
31	Analyse et validation PRO	4 sm	Mar 28/07/26	Lun 24/08/26
32	Reprise et échange sur dossier PRO	3 sm	Mar 25/08/26	Lun 14/09/26
33	**Dossiers administratifs**	**141 jours**	**Mar 05/05/26**	**Mar 17/11/26**
34	**Permis de démolir**	**91 jours**	**Mar 05/05/26**	**Mar 08/09/26**
35	Elaboration PD	2 sm	Mar 05/05/26	Lun 18/05/26
36	Dépôt PD	1 jour	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26
37	Instruction PD	2 mois	Mer 20/05/26	Mar 14/07/26
38	Délai recours	2 mois	Mer 15/07/26	Mar 08/09/26
39	**Permis de construire (ERT)**	**141 jours**	**Mar 05/05/26**	**Mar 17/11/26**
40	Elaboration PC	2 sm	Mar 05/05/26	Lun 18/05/26
41	Analyse et validation PC	2 sm	Mar 19/05/26	Lun 01/06/26
42	Dépôt PC	1 jour	Mar 02/06/26	Mar 02/06/26
43	Instruction PC	3 mois	Mer 03/06/26	Mar 25/08/26
44	Délai recours	3 mois	Mer 26/08/26	Mar 17/11/26
45	**TRAVAUX**	**420 jours**	**Mer 09/09/26**	**Mar 18/04/28**
46	Amiante	1 mois	Mer 09/09/26	Mar 06/10/26
47	Démolition (3 mois)	3 mois	Mer 07/10/26	Mar 29/12/26
48	Construction neuve (16 mois)	16 mois	Mer 30/12/26	Mar 21/03/28
49	Réception	4 sm	Mer 22/03/28	Mar 18/04/28

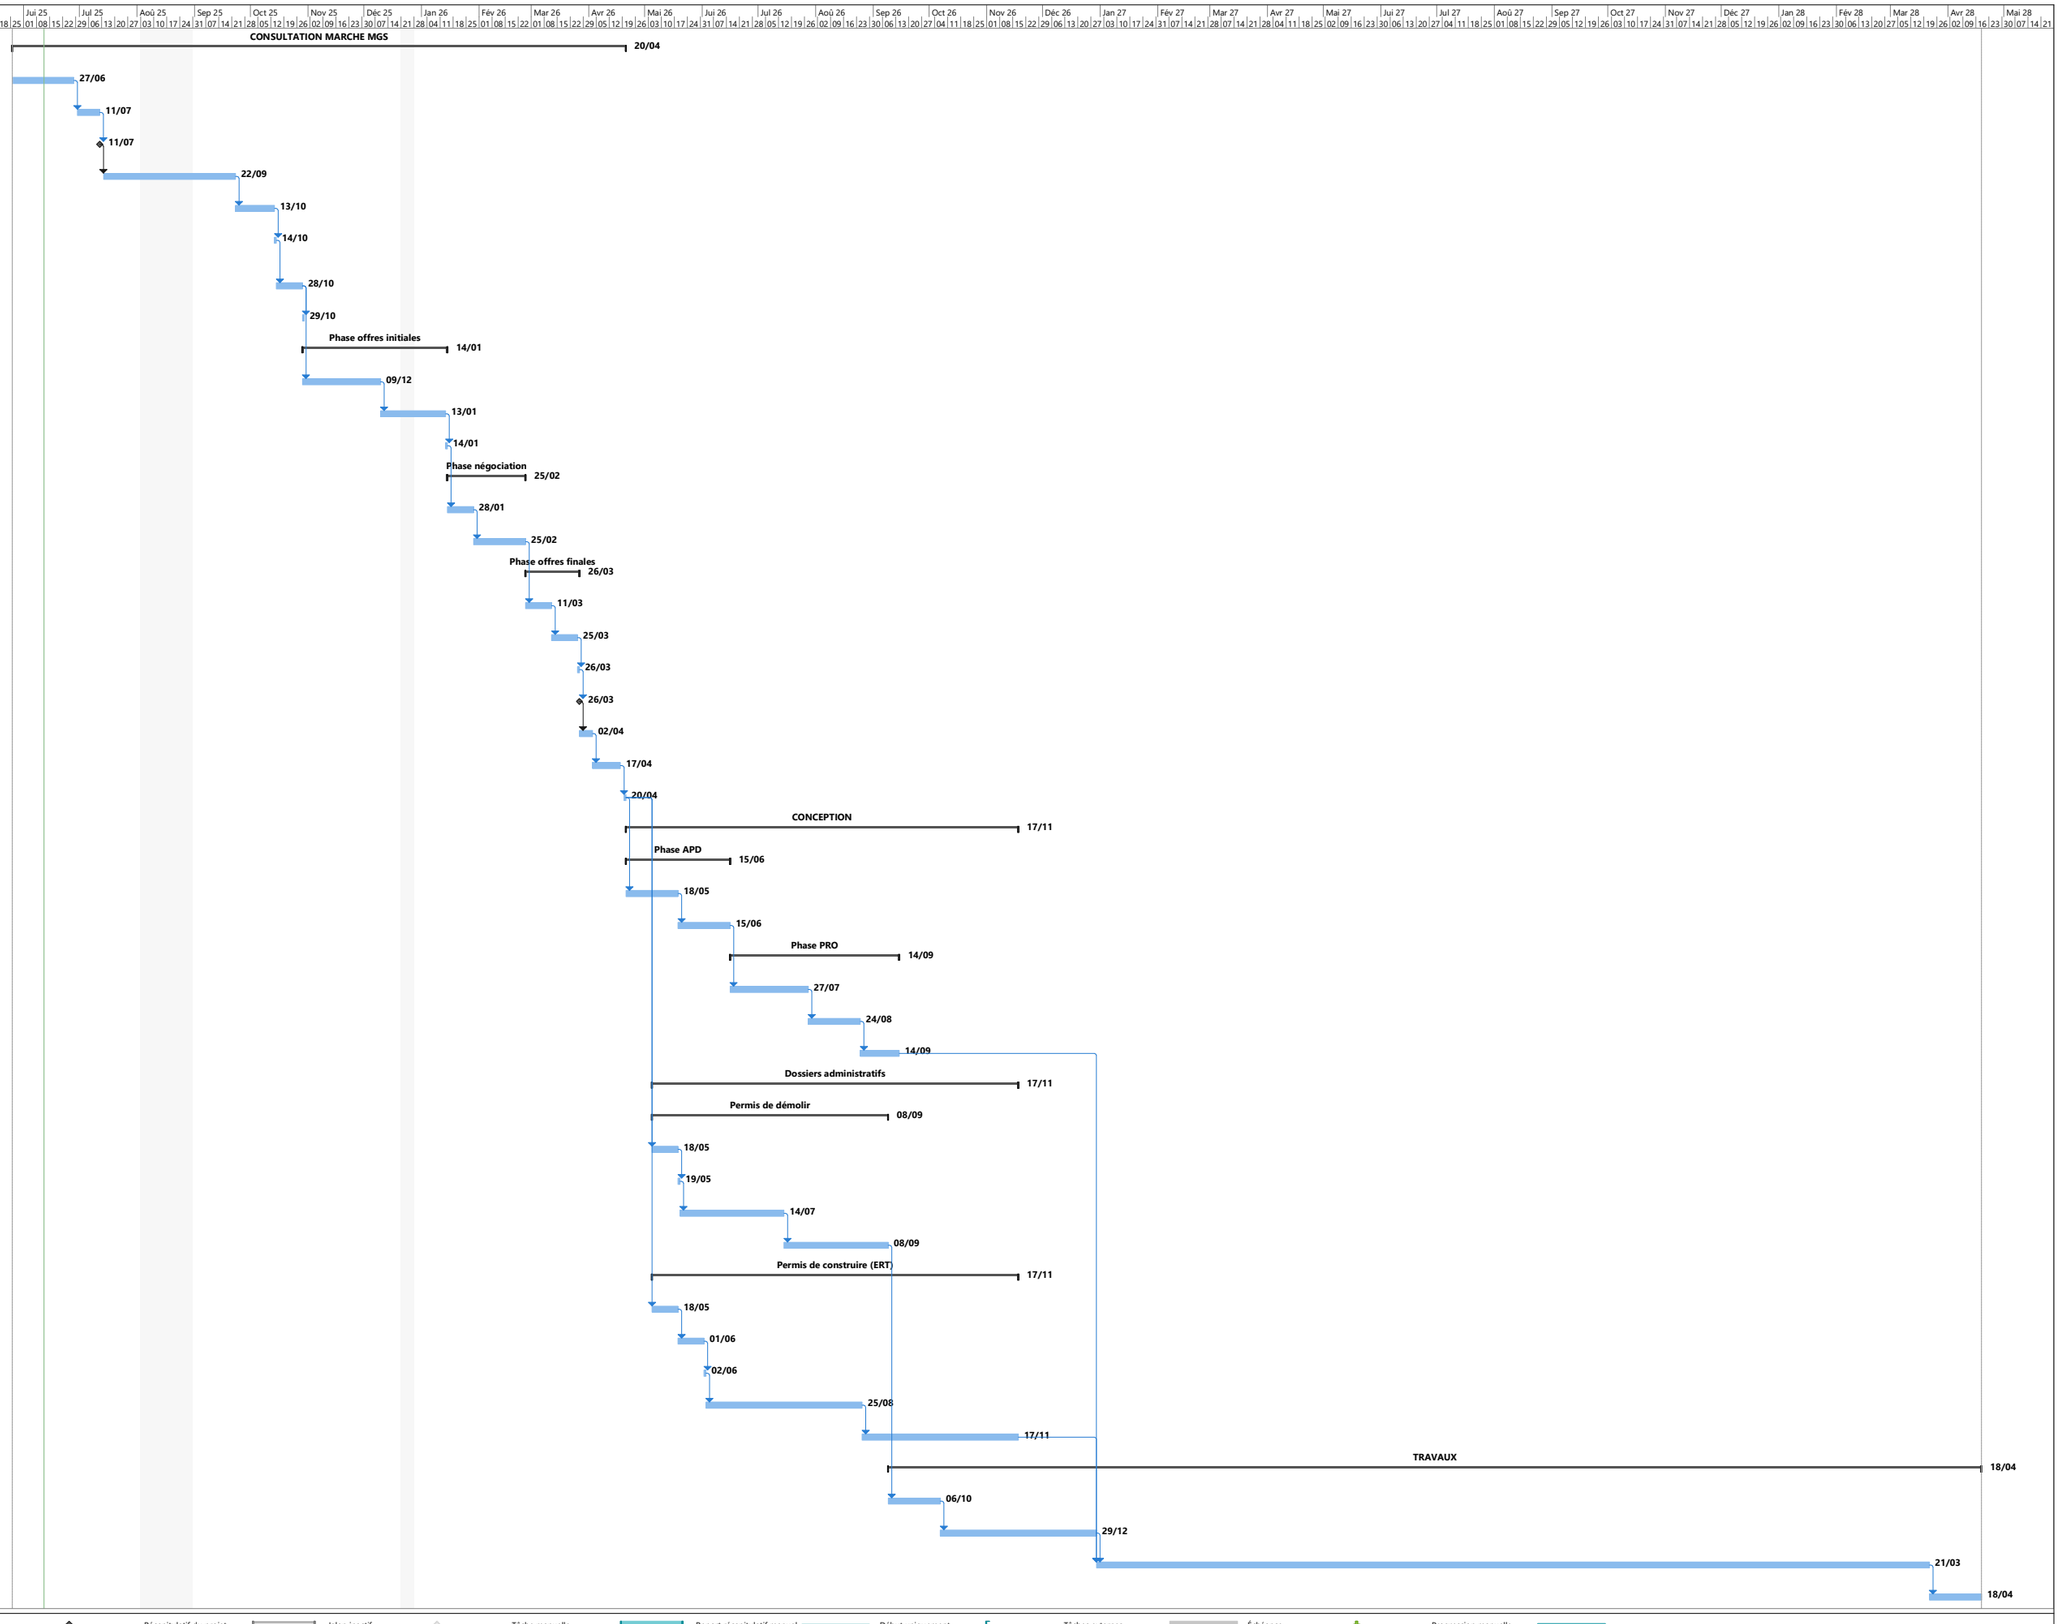

Projet : AVIGNON - Planning p
Date : Jeu 12/06/25

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Jalon inactif · Tâche manuelle · Report récapitulatif manuel · Début uniquement · Tâches externes · Échéance · Progression manuelle
Fractionnement · Récapitulative · Tâche inactive · Récapitulatif inactif · Durée uniquement · Récapitulatif manuel · Fin uniquement · Jalons externes · Avancement
