Direction des Finances Publiques de Normandie et de la Seine Maritime
Réaménagement des "Accueils" de l'Hôtel des Finances Publiques - LE HAVRE

Lun 29/09/25

Planning DCE

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	Préparation de chantier	Lun 01/12/25	Mer 24/12/25
2	Etablissement du plan de retrait amiante - 2 sem.	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
3	Instruction du plan de retrait amiante - 1 mois	Lun 15/12/25	Jeu 15/01/26
4	Fabrication des banques - Espace accueil d'orientation - 2 sem.	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26
5	Réalisation des travaux T.C.E. - Espace accueil d'orientation - 3 sem.	Lun 19/01/26	Ven 06/02/26
6	Pose des banques - Espace accueil d'orientation - 2 jours	Jeu 05/02/26	Ven 06/02/26
7	Fabrication des banques - Espace accueil trésorerie - 2 sem.	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26
8	Réalisation des travaux - Espace accueil trésorerie - 3 sem.	Lun 02/02/26	Ven 20/02/26
9	Pose des banques - Espace accueil trésorerie - 2 jours	Jeu 19/02/26	Ven 20/02/26
10	**Réalisation des travaux - Espace accueil SIP**	**Lun 05/01/26**	**Ven 27/03/26**
11	Déposes des cloisonnements et électricité - 3 sem.	Lun 05/01/26	Ven 23/01/26
12	Désamiantage - 4 sem.	Lun 26/01/26	Ven 20/02/26
13	Mesures libératoires - 3 jours	Lun 23/02/26	Mer 25/02/26
14	Réalisation de l'estrade - 4 jours	Jeu 26/02/26	Mar 03/03/26
15	Ragréage - 2 jours	Mer 04/03/26	Jeu 05/03/26
16	Pose du sol souple - 1 sem.	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26
17	Travaux électricité neuf	Jeu 26/02/26	Ven 27/03/26
18	Repose des cloisons - 3 sem.	Lun 09/03/26	Ven 27/03/26
19	Réception	Lun 30/03/26	Lun 30/03/26

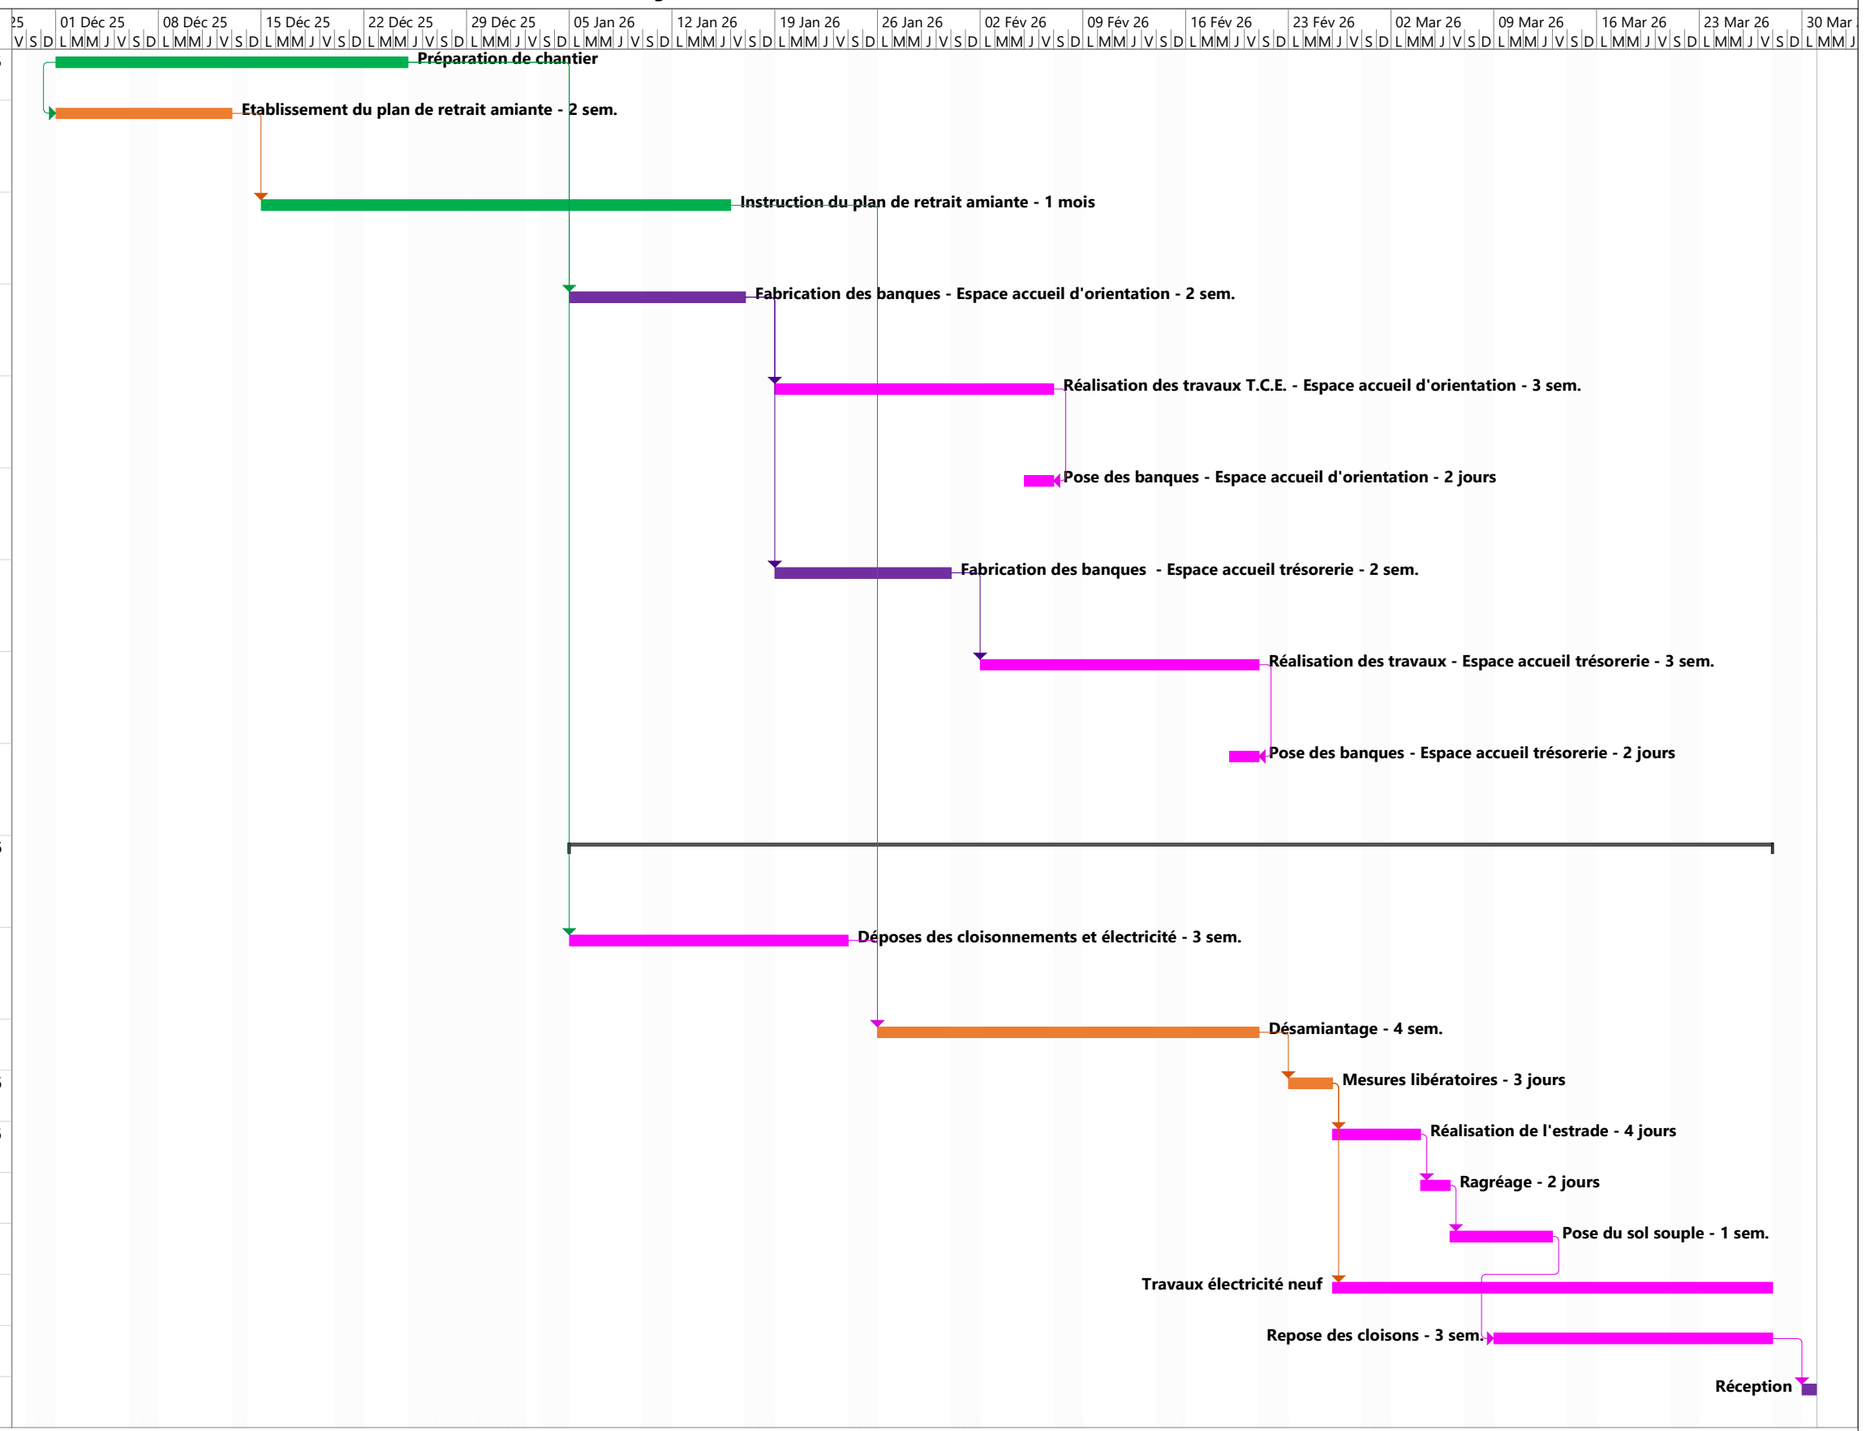

Fait par ACE INGENIERIE
