CTI SOPHIA-ANTIPOLIS
PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX PHASE DCE

RÉFECTION CFO/CFA/SSI ET SANITAIRES
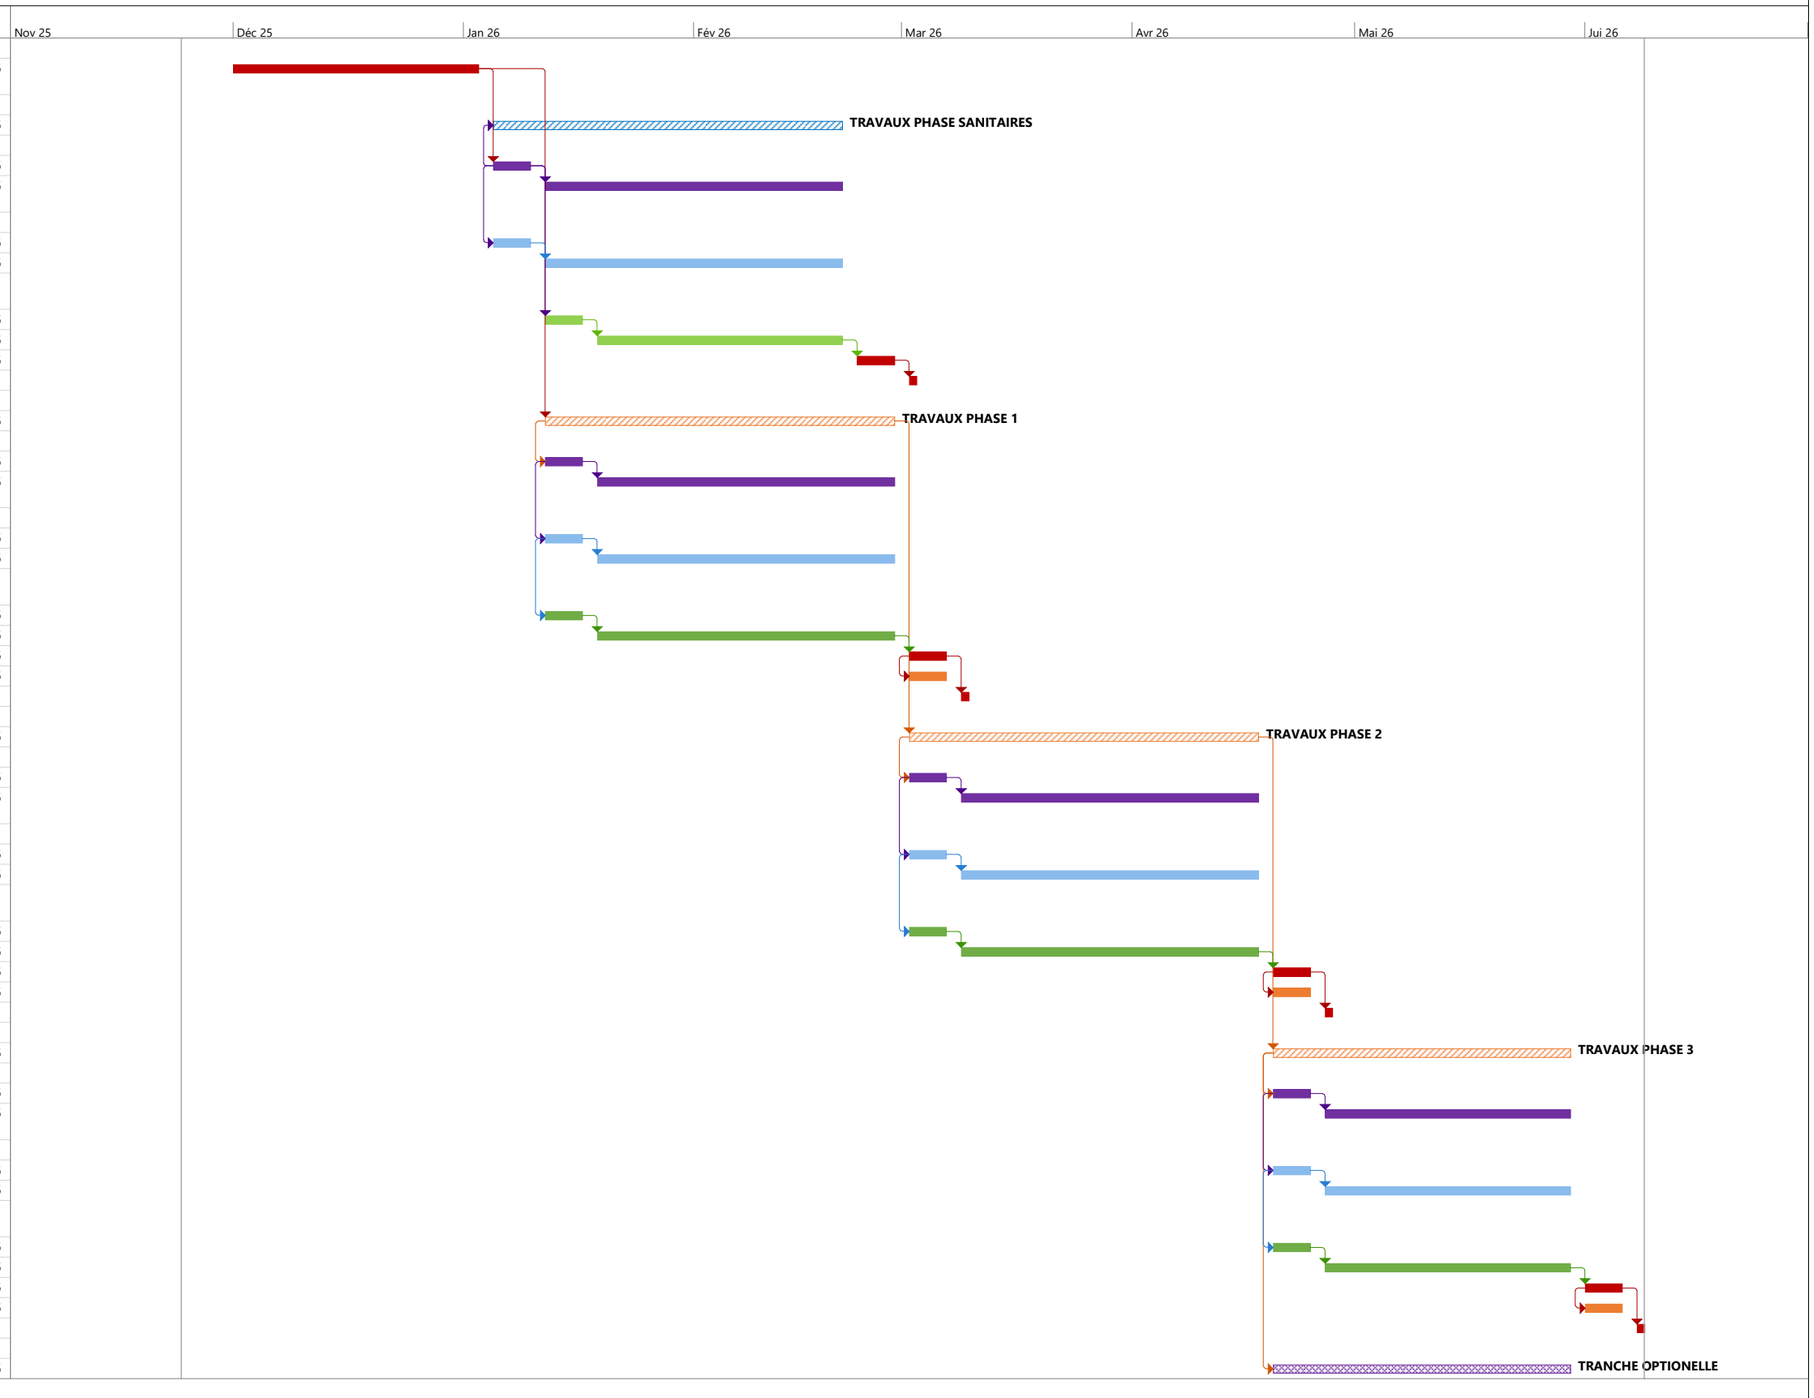
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1					
2		**Notification et période de préparation**	25 jours	Lun 01/12/25	Ven 02/01/26
3					
4		**TRAVAUX PHASE SANITAIRES**	35 jours	Lun 05/01/26	Ven 20/02/26
5		**Lot 01 - Electricité**			
6		Travaux de dépose	5 jours	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26
7		Distributions électriques - Equipements	30 jours	Lun 12/01/26	Ven 20/02/26
8		**Lot 02 - CVC / Plomberie**			
9		Consignation réseaux	5 jours	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26
10		Distributions réseaux - Equipements	30 jours	Lun 12/01/26	Ven 20/02/26
11		**Lot 03 - Maçonnerie – VRD - Cloisons – Menuiseries – Sols – Peinture**			
12		Travaux de dépose	5 jours	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26
13		Travaux TCE	25 jours	Lun 19/01/26	Ven 20/02/26
14		**O.P.R zones sanitaires**	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26
15		**Réception zones sanitaires**	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26
16					
17		**TRAVAUX PHASE 1**	35 jours	Lun 12/01/26	Ven 27/02/26
18		**Lot 01 - Electricité**			
19		Travaux de dépose	5 jours	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26
20		Distributions électriques - Equipements	30 jours	Lun 19/01/26	Ven 27/02/26
21		**Lot 02 - CVC / Plomberie**			
22		Travaux de dépose	5 jours	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26
23		Distributions réseaux - Equipements	30 jours	Lun 19/01/26	Ven 27/02/26
24		**Lot 03 - Maçonnerie – VRD - Cloisons – Menuiseries – Sols – Peinture**			
25		Travaux de dépose	5 jours	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26
26		Travaux TCE	30 jours	Lun 19/01/26	Ven 27/02/26
27		**O.P.R Phase 1**	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
28		**Déménagement MOA**	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
29		**Réception Phase 1**	1 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
30					
31		**TRAVAUX PHASE 2**	35 jours	Lun 02/03/26	Ven 17/04/26
32		**Lot 01 - Electricité**			
33		Travaux de dépose	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
34		Distributions électriques - Equipements	30 jours	Lun 09/03/26	Ven 17/04/26
35		**Lot 02 - CVC / Plomberie**			
36		Travaux de dépose	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
37		Distributions réseaux - Equipements	30 jours	Lun 09/03/26	Ven 17/04/26
38		**Lot 03 - Maçonnerie – VRD - Cloisons – Menuiseries – Sols – Peinture**			
39		Travaux de dépose	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
40		Travaux TCE	30 jours	Lun 09/03/26	Ven 17/04/26
41		**O.P.R Phase 2**	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
42		**Déménagement MOA**	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
43		**Réception Phase 2**	1 jour	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26
44					
45		**TRAVAUX PHASE 3**	30 jours	Lun 20/04/26	Ven 29/05/26
46		**Lot 01 - Electricité**			
47		Travaux de dépose	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
48		Distributions électriques - Equipements	25 jours	Lun 27/04/26	Ven 29/05/26
49		**Lot 02 - CVC / Plomberie**			
50		Travaux de dépose	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
51		Distributions réseaux - Equipements	25 jours	Lun 27/04/26	Ven 29/05/26
52		**Lot 03 - Maçonnerie – VRD - Cloisons – Menuiseries – Sols – Peinture**			
53		Travaux de dépose	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
54		Travaux TCE	25 jours	Lun 27/04/26	Ven 29/05/26
55		**O.P.R Phase 3**	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
56		**Déménagement MOA**	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
57		**Réception Phase 3**	1 jour	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26
58					
59		**TRANCHE OPTIONELLE**	30 jours	Lun 20/04/26	Ven 29/05/26
