Marché 2025-123M_Annexe 3 : PLANNING PREVISIONNEL		Ouverture	mercredi 14 avril 2027
Exposition "Amazones"	Hall Napoléon	Fermeture	lundi 12 juillet 2027
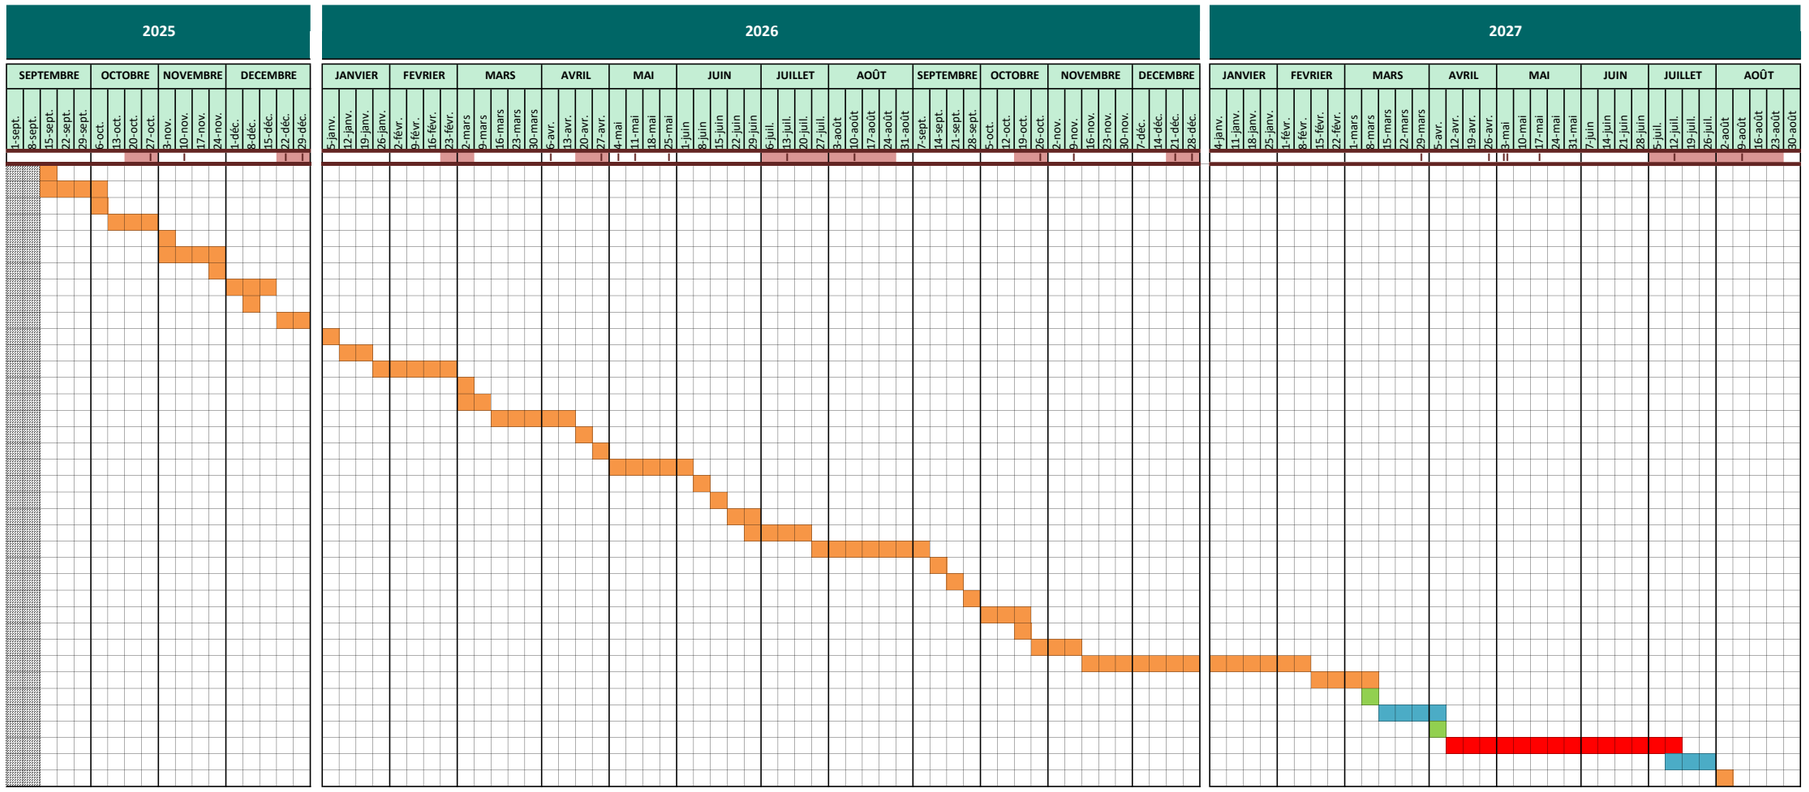
ACTION	DATE DE DEBUT	DUREE (nb jours ouvrés, fériés inclus)	ECHEANCE
			Vacances scolaires et jours fériés
Marché MOE / AAPC MOE scéno (phase 1)	jeudi 18 septembre 2025	1	jeudi 18 septembre 2025
Marché MOE / Préparation candidatures	jeudi 18 septembre 2025	17	vendredi 10 octobre 2025
Marché MOE / DLRO Phase 1	vendredi 10 octobre 2025	1	vendredi 10 octobre 2025
Marché MOE / Analyse et valid. phase 1	lundi 13 octobre 2025	15	vendredi 31 octobre 2025
Marché MOE / Publication phase offre	lundi 3 novembre 2025	1	lundi 3 novembre 2025
Marché MOE / Préparation Esquisse	lundi 3 novembre 2025	20	vendredi 28 novembre 2025
Marché MOE / DLRO Phase 2	vendredi 28 novembre 2025	1	vendredi 28 novembre 2025
Marché MOE / Analyse offres avant négo	lundi 1 décembre 2025	15	vendredi 19 décembre 2025
Marché MOE / Audition Esquisse	lundi 8 décembre 2025	5	vendredi 12 décembre 2025
Marché MOE / Négociation offres	lundi 22 décembre 2025	10	vendredi 2 janvier 2026
Marché MOE / analyse et validation offfre	lundi 5 janvier 2026	5	vendredi 9 janvier 2026
Marché MOE / Notification MOE	lundi 12 janvier 2026	10	vendredi 23 janvier 2026
APS / Préparation	lundi 26 janvier 2026	25	vendredi 27 février 2026
APS / Présentation DG	lundi 2 mars 2026	5	vendredi 6 mars 2026
APS / Réunion technique et validation	lundi 2 mars 2026	10	vendredi 13 mars 2026
APD / Préparation	lundi 16 mars 2026	25	vendredi 17 avril 2026
APD / Présentation DG	lundi 20 avril 2026	5	vendredi 24 avril 2026
APD / Réunion technique et validation	lundi 27 avril 2026	4	jeudi 30 avril 2026
PRO / Préparation	lundi 4 mai 2026	25	vendredi 5 juin 2026
PRO / Présentation DG	lundi 8 juin 2026	5	vendredi 12 juin 2026
PRO / Réunion technique et validation	lundi 15 juin 2026	5	vendredi 19 juin 2026
DCE / Préparation pièces marché	lundi 22 juin 2026	10	vendredi 3 juillet 2026
DCE / Validation pièces marché	lundi 29 juin 2026	20	vendredi 24 juillet 2026
Marché trav. / AAPC	lundi 27 juillet 2026	35	vendredi 11 septembre 2026
Marché trav. / Analyse offres par MOE	lundi 14 septembre 2026	5	vendredi 18 septembre 2026
Marché trav. / Validation analyse	lundi 21 septembre 2026	5	vendredi 25 septembre 2026
Marché trav. / Négociations	lundi 28 septembre 2026	5	vendredi 2 octobre 2026
Mérché trav./ Validation négociations	lundi 5 octobre 2026	11	lundi 19 octobre 2026
CDAP marché travaux	jeudi 22 octobre 2026	1	jeudi 22 octobre 2026
Notification entreprises	lundi 26 octobre 2026	15	vendredi 13 novembre 2026
EXE et fabrications	lundi 16 novembre 2026	65	vendredi 12 février 2027
Chantier scéno	lundi 15 février 2027	20	vendredi 12 mars 2027
Pose signalétique GF	lundi 8 mars 2027	5	vendredi 12 mars 2027
Accrochage des œuvres	lundi 15 mars 2027	20	vendredi 9 avril 2027
Pose cartels	jeudi 8 avril 2027	2	vendredi 9 avril 2027
Ouverture au public	mercredi 14 avril 2027	64	lundi 12 juillet 2027
Décrochage des œuvres	mardi 13 juillet 2027	14	vendredi 30 juillet 2027
Démontage scéno	lundi 2 août 2027	5	vendredi 6 août 2027
