REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU CDFiP DE BESANCON CHAMARS - PLANNING PREVISIONNEL PHASE PRO
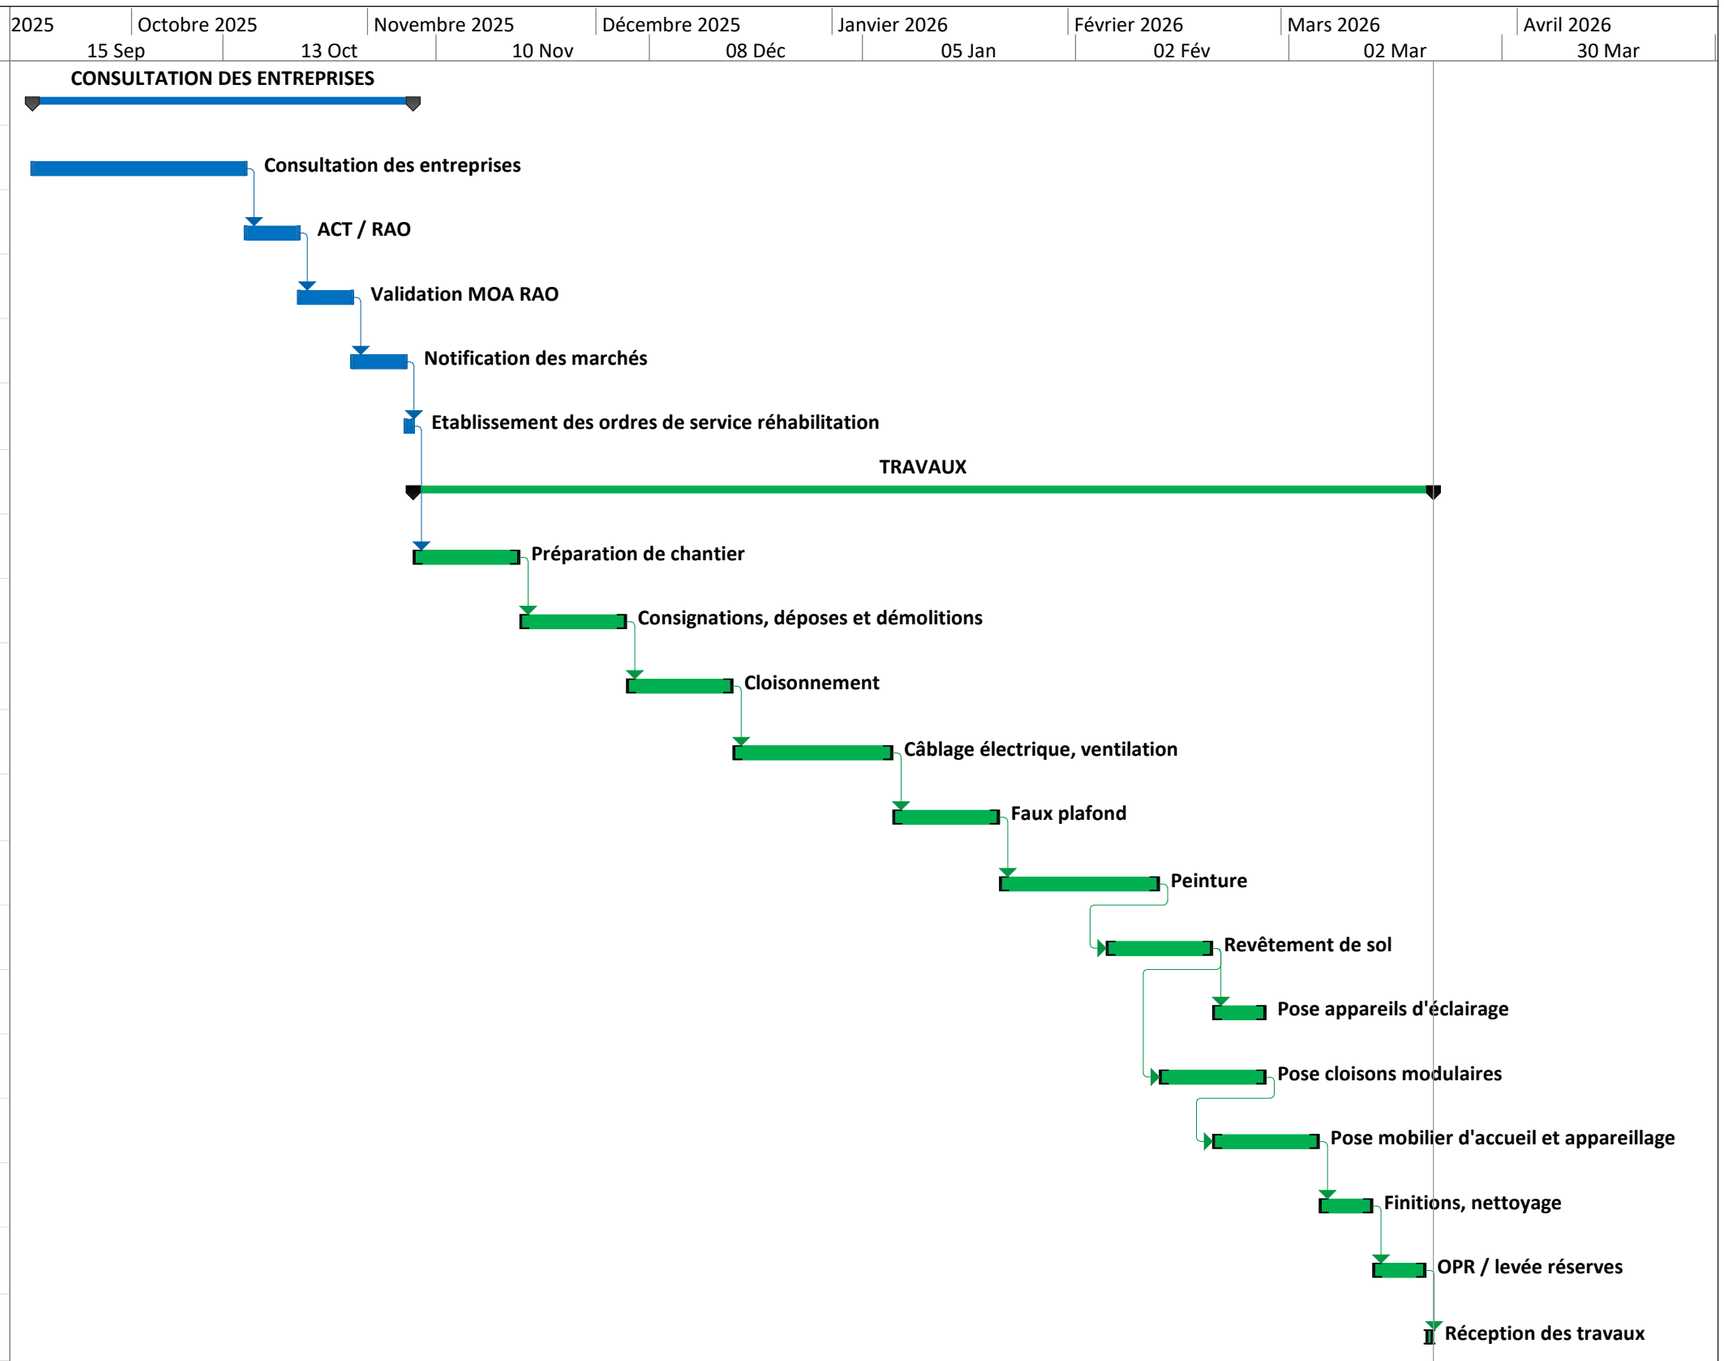
N°	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1	**Jeu 18/09/25**	**Jeu 06/11/25**	**36 jrs**	**CONSULTATION DES ENTREPRISES**
2	Jeu 18/09/25	Mer 15/10/25	20 jrs	Consultation des entreprises
3	Jeu 16/10/25	Mer 22/10/25	5 jrs	ACT / RAO
4	Jeu 23/10/25	Mer 29/10/25	5 jrs	Validation MOA RAO
5	Jeu 30/10/25	Mer 05/11/25	5 jrs	Notification des marchés
6	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25	1 jr	Etablissement des ordres de service réhabilitation
7	**Ven 07/11/25**	**Ven 20/03/26**	**96 jrs**	**TRAVAUX**
8	Ven 07/11/25	Jeu 20/11/25	10 jrs	Préparation de chantier
9	Ven 21/11/25	Jeu 04/12/25	10 jrs	Consignations, déposes et démolitions
10	Ven 05/12/25	Jeu 18/12/25	10 jrs	Cloisonnement
11	Ven 19/12/25	Jeu 08/01/26	15 jrs	Câblage électrique, ventilation
12	Ven 09/01/26	Jeu 22/01/26	10 jrs	Faux plafond
13	Ven 23/01/26	Jeu 12/02/26	15 jrs	Peinture
14	Ven 06/02/26	Jeu 19/02/26	10 jrs	Revêtement de sol
15	Ven 20/02/26	Jeu 26/02/26	5 jrs	Pose appareils d'éclairage
16	Ven 13/02/26	Jeu 26/02/26	10 jrs	Pose cloisons modulaires
17	Ven 20/02/26	Jeu 05/03/26	10 jrs	Pose mobilier d'accueil et appareillage
18	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26	5 jrs	Finitions, nettoyage
19	Ven 13/03/26	Jeu 19/03/26	5 jrs	OPR / levée réserves
20	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26	1 jr	Réception des travaux
21				
22
