Planning directeur scénario 1 - Construction nouveau St Exupéry

Le 29/05/2024
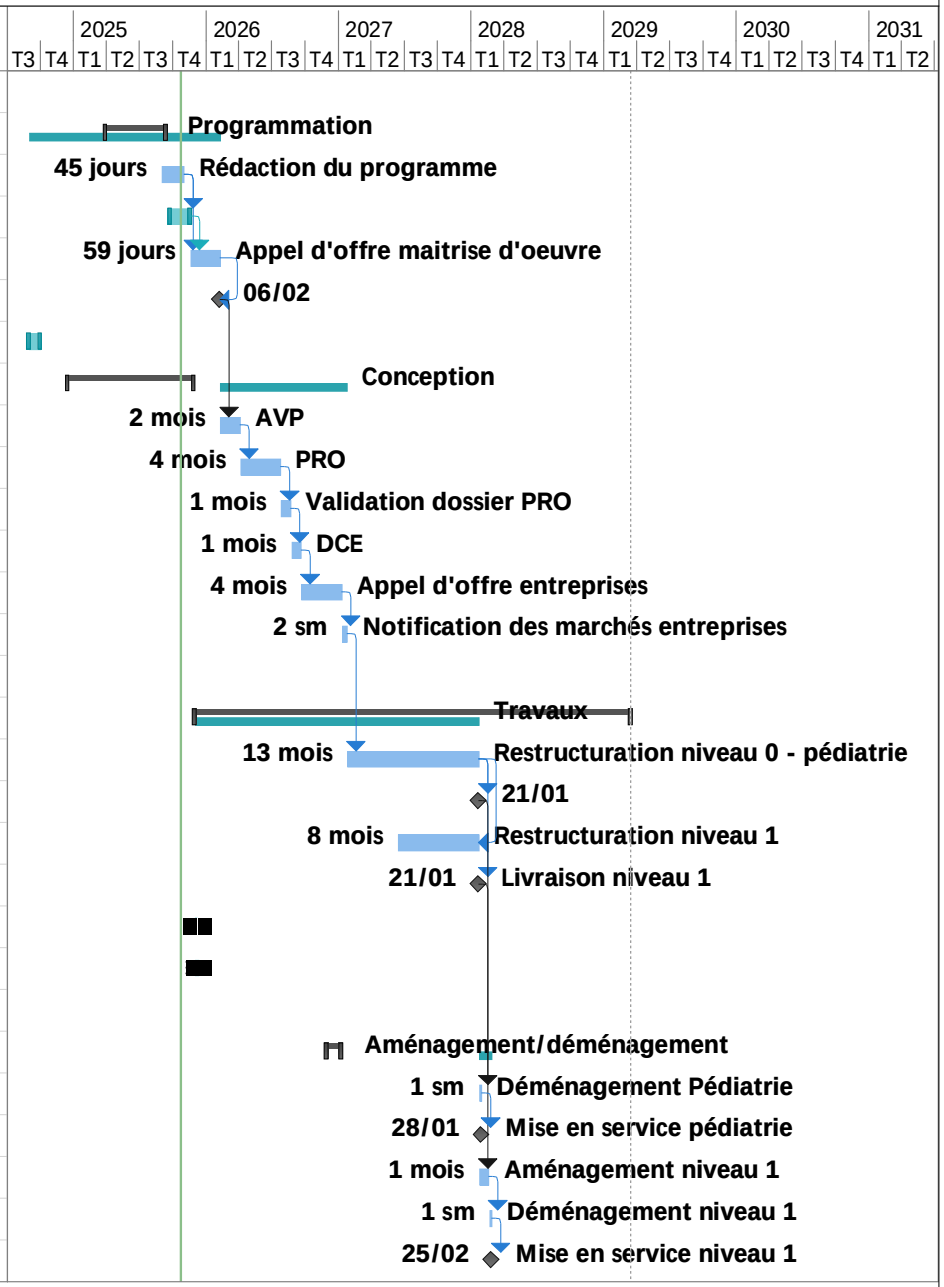
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	**Programmation**	**6 mois**	**Lun 31/03/25**	**Ven 12/09/25**
3	Rédaction du programme	45 jours	Lun 01/09/25	Ven 31/10/25
4	Rédaction marché MOE	39 jours	Mer 24/09/25	Lun 17/11/25
5	Appel d'offre maitrise d'oeuvre	59 jours	Mar 18/11/25	Ven 06/02/26
6	Notification MOE	0 jour	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26
7		22 jours	Dim 01/09/24	Lun 30/09/24
8	**Conception**	**12,5 mois**	**Lun 16/12/24**	**Ven 28/11/25**
9	AVP	2 mois	Lun 09/02/26	Ven 03/04/26
10	PRO	4 mois	Lun 06/04/26	Ven 24/07/26
11	Validation dossier PRO	1 mois	Lun 27/07/26	Ven 21/08/26
12	DCE	1 mois	Lun 24/08/26	Ven 18/09/26
13	Appel d'offre entreprises	4 mois	Lun 21/09/26	Ven 08/01/27
14	Notification des marchés entreprises	2 sm	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
15				
16	**Travaux**	**43 mois**	**Lun 01/12/25**	**Ven 16/03/29**
17	Restructuration niveau 0 - pédiatrie	13 mois	Lun 25/01/27	Ven 21/01/28
18	Livraison pédiatrie	0 jour	Ven 21/01/28	Ven 21/01/28
19	Restructuration niveau 1	8 mois	Lun 14/06/27	Ven 21/01/28
20	Livraison niveau 1	0 jour	Ven 21/01/28	Ven 21/01/28
21	Réhabilitation niveau 1 - services non déf.	4 jours		
22	Réhabilitation niveau 2 - services non déf.	8 jours		
23				
24	**Aménagement/déménagement**	**1,5 mois**	**Lun 30/11/26**	**Ven 08/01/27**
25	Déménagement Pédiatrie	1 sm	Lun 24/01/28	Ven 28/01/28
26	Mise en service pédiatrie	0 jour	Ven 28/01/28	Ven 28/01/28
27	Aménagement niveau 1	1 mois	Lun 24/01/28	Ven 18/02/28
28	Déménagement niveau 1	1 sm	Lun 21/02/28	Ven 25/02/28
29	Mise en service niveau 1	0 jour	Ven 25/02/28	Ven 25/02/28
