PLANNING MEDECINE NUCLEAIRE : PHASE 6

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	OPR	1 jour	Ven 24/09/27	Lun 27/09/27
2	LEVEE DE RESERVES	1 semaine	Lun 27/09/27	Lun 04/10/27
3	NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture	1 semaine	Lun 04/10/27	Lun 11/10/27
4	**LOT 02 - DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE**	**12,5 jours**	**Jeu 01/07/27**	**Lun 19/07/27**
5	Désamiantage	2,5 semaines	Jeu 01/07/27	Lun 19/07/27
6	**LOT 01 - GROS OEUVRE - DEMOLITION - FLOCAGE**	**20 jours**	**Lun 19/07/27**	**Lun 16/08/27**
7	Travaux de curage - purge	2 semaines	Lun 19/07/27	Lun 02/08/27
8	Démolitions + reprises structurelles	1 semaine	Lun 26/07/27	Lun 02/08/27
9	Création d'ouverture par sciage	2 jours	Lun 02/08/27	Mer 04/08/27
10	Percements des planchers B.A et renforcements structurels par chevêtres métalliques - Création de gaines béton	3 jours	Mer 04/08/27	Lun 09/08/27
11	Campagne de calfeutrementattente au sol	3 jours	Lun 09/08/27	Jeu 12/08/27
12	Obturation des anciennes réservations en élévation béton ou maçonné	2 jours	Jeu 12/08/27	Lun 16/08/27
13	**LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES**	**1 jour**	**Mer 04/08/27**	**Jeu 05/08/27**
14	Ensembles menuisés - Vantail soufflet	1 jour	Mer 04/08/27	Jeu 05/08/27
15	**LOT 06 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PANNEAUX INDUSTRIELS**	**48 jours**	**Lun 19/07/27**	**Jeu 23/09/27**
16	**PRESTATIONS DE PLATRERIE**	**30 jours**	**Lun 19/07/27**	**Lun 30/08/27**
17	Cloisons provisoires - Cantonnement de phase	2 jours	Lun 19/07/27	Mer 21/07/27
18	Doublages parois existantes	1 semaine	Mer 04/08/27	Mer 11/08/27
19	Cloisons courantes séparatives + Renforts	7 jours	Mer 11/08/27	Ven 20/08/27
20	Retombées - soffites - jouées en plâtre	1 jour	Ven 20/08/27	Lun 23/08/27
21	Prestations complémentaires	1 semaine	Lun 23/08/27	Lun 30/08/27
22	**PRESTATIONS DE FAUX PLAFONDS**	**12 jours**	**Mar 07/09/27**	**Jeu 23/09/27**
23	Faux plafond mixte	2 jours	Mar 07/09/27	Jeu 09/09/27
24	Plafonds suspendus dalles	1 semaine	Jeu 09/09/27	Jeu 16/09/27
25	Blanchiement des faux-plafonds	1 semaine	Jeu 16/09/27	Jeu 23/09/27
26	**LOT 07 - MENUISERIES INTERIEURES**	**14 jours**	**Ven 20/08/27**	**Jeu 09/09/27**
27	Révision de porte existante	1 semaine	Ven 20/08/27	Ven 27/08/27
28	Bloc porte intérieur courant	1 jour	Ven 20/08/27	Lun 23/08/27
29	Porte de gaine technique	1 jour	Lun 23/08/27	Mar 24/08/27
30	Protections murales + Mains courantes	2 jours	Mar 07/09/27	Jeu 09/09/27
31	Prestations complémentaires	11 jours	Lun 23/08/27	Mar 07/09/27
32	**LOT 09 - PEINTURE**	**24 jours**	**Lun 23/08/27**	**Ven 24/09/27**
33	Préparation des supports neufs et existants	1 semaine	Lun 23/08/27	Lun 30/08/27
34	Peinture	1 semaine	Mar 31/08/27	Mar 07/09/27
35	Peinture sur différents supports	3 jours	Mar 07/09/27	Ven 10/09/27
36	Accessoires	3 jours	Mar 07/09/27	Ven 10/09/27
37	Retouches peintures	3 jours	Lun 20/09/27	Jeu 23/09/27
38	Nettoyage 1 : Avant OPR	1 jour	Jeu 23/09/27	Ven 24/09/27
39	**LOT 10 - SOL PVC - MURS PVC**	**21,14 jours**	**Ven 20/08/27**	**Lun 20/09/27**
40	Préparation des supports	1 jour	Ven 20/08/27	Lun 23/08/27
41	Revêtement de sol PVC	1 semaine	Mar 07/09/27	Mar 14/09/27
42	Protection murale PVC - Ht 1,40m	4 jours	Mar 14/09/27	Lun 20/09/27
43	Prestations complémentaires	9,14 jours	Mar 07/09/27	Lun 20/09/27
44	**LOT 11 - ELECTRICITE - SSI**	**47 jours**	**Lun 19/07/27**	**Mer 22/09/27**
45	Neutralisation des réseaux	1 jour	Lun 19/07/27	Mar 20/07/27
46	Implantation - Passage des réseaux	10 jours	Mer 04/08/27	Mer 18/08/27
47	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Mer 15/09/27	Mer 22/09/27
48	**LOT 12 - CVC - PLOMBERIE**	**47 jours**	**Lun 19/07/27**	**Mer 22/09/27**
49	Neutralisation des réseaux	1 jour	Lun 19/07/27	Mar 20/07/27
50	Implantation - Passage des réseaux	10 jours	Mer 04/08/27	Mer 18/08/27
51	Paillasse humide	2 jours	Mar 07/09/27	Jeu 09/09/27
52	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Mer 15/09/27	Mer 22/09/27
53	**LOT 13 - FLUIDES MEDICAUX**	**35 jours**	**Mer 04/08/27**	**Mer 22/09/27**
54	Implantation - Passage des réseaux	10 jours	Mer 04/08/27	Mer 18/08/27
55	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Mer 15/09/27	Mer 22/09/27
56	OPR	1 jour?	Ven 24/09/27	Lun 27/09/27
57	LEVEE DE RESERVES	1 semaine	Lun 27/09/27	Lun 04/10/27
58	NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture	1 semaine	Lun 04/10/27	Lun 11/10/27

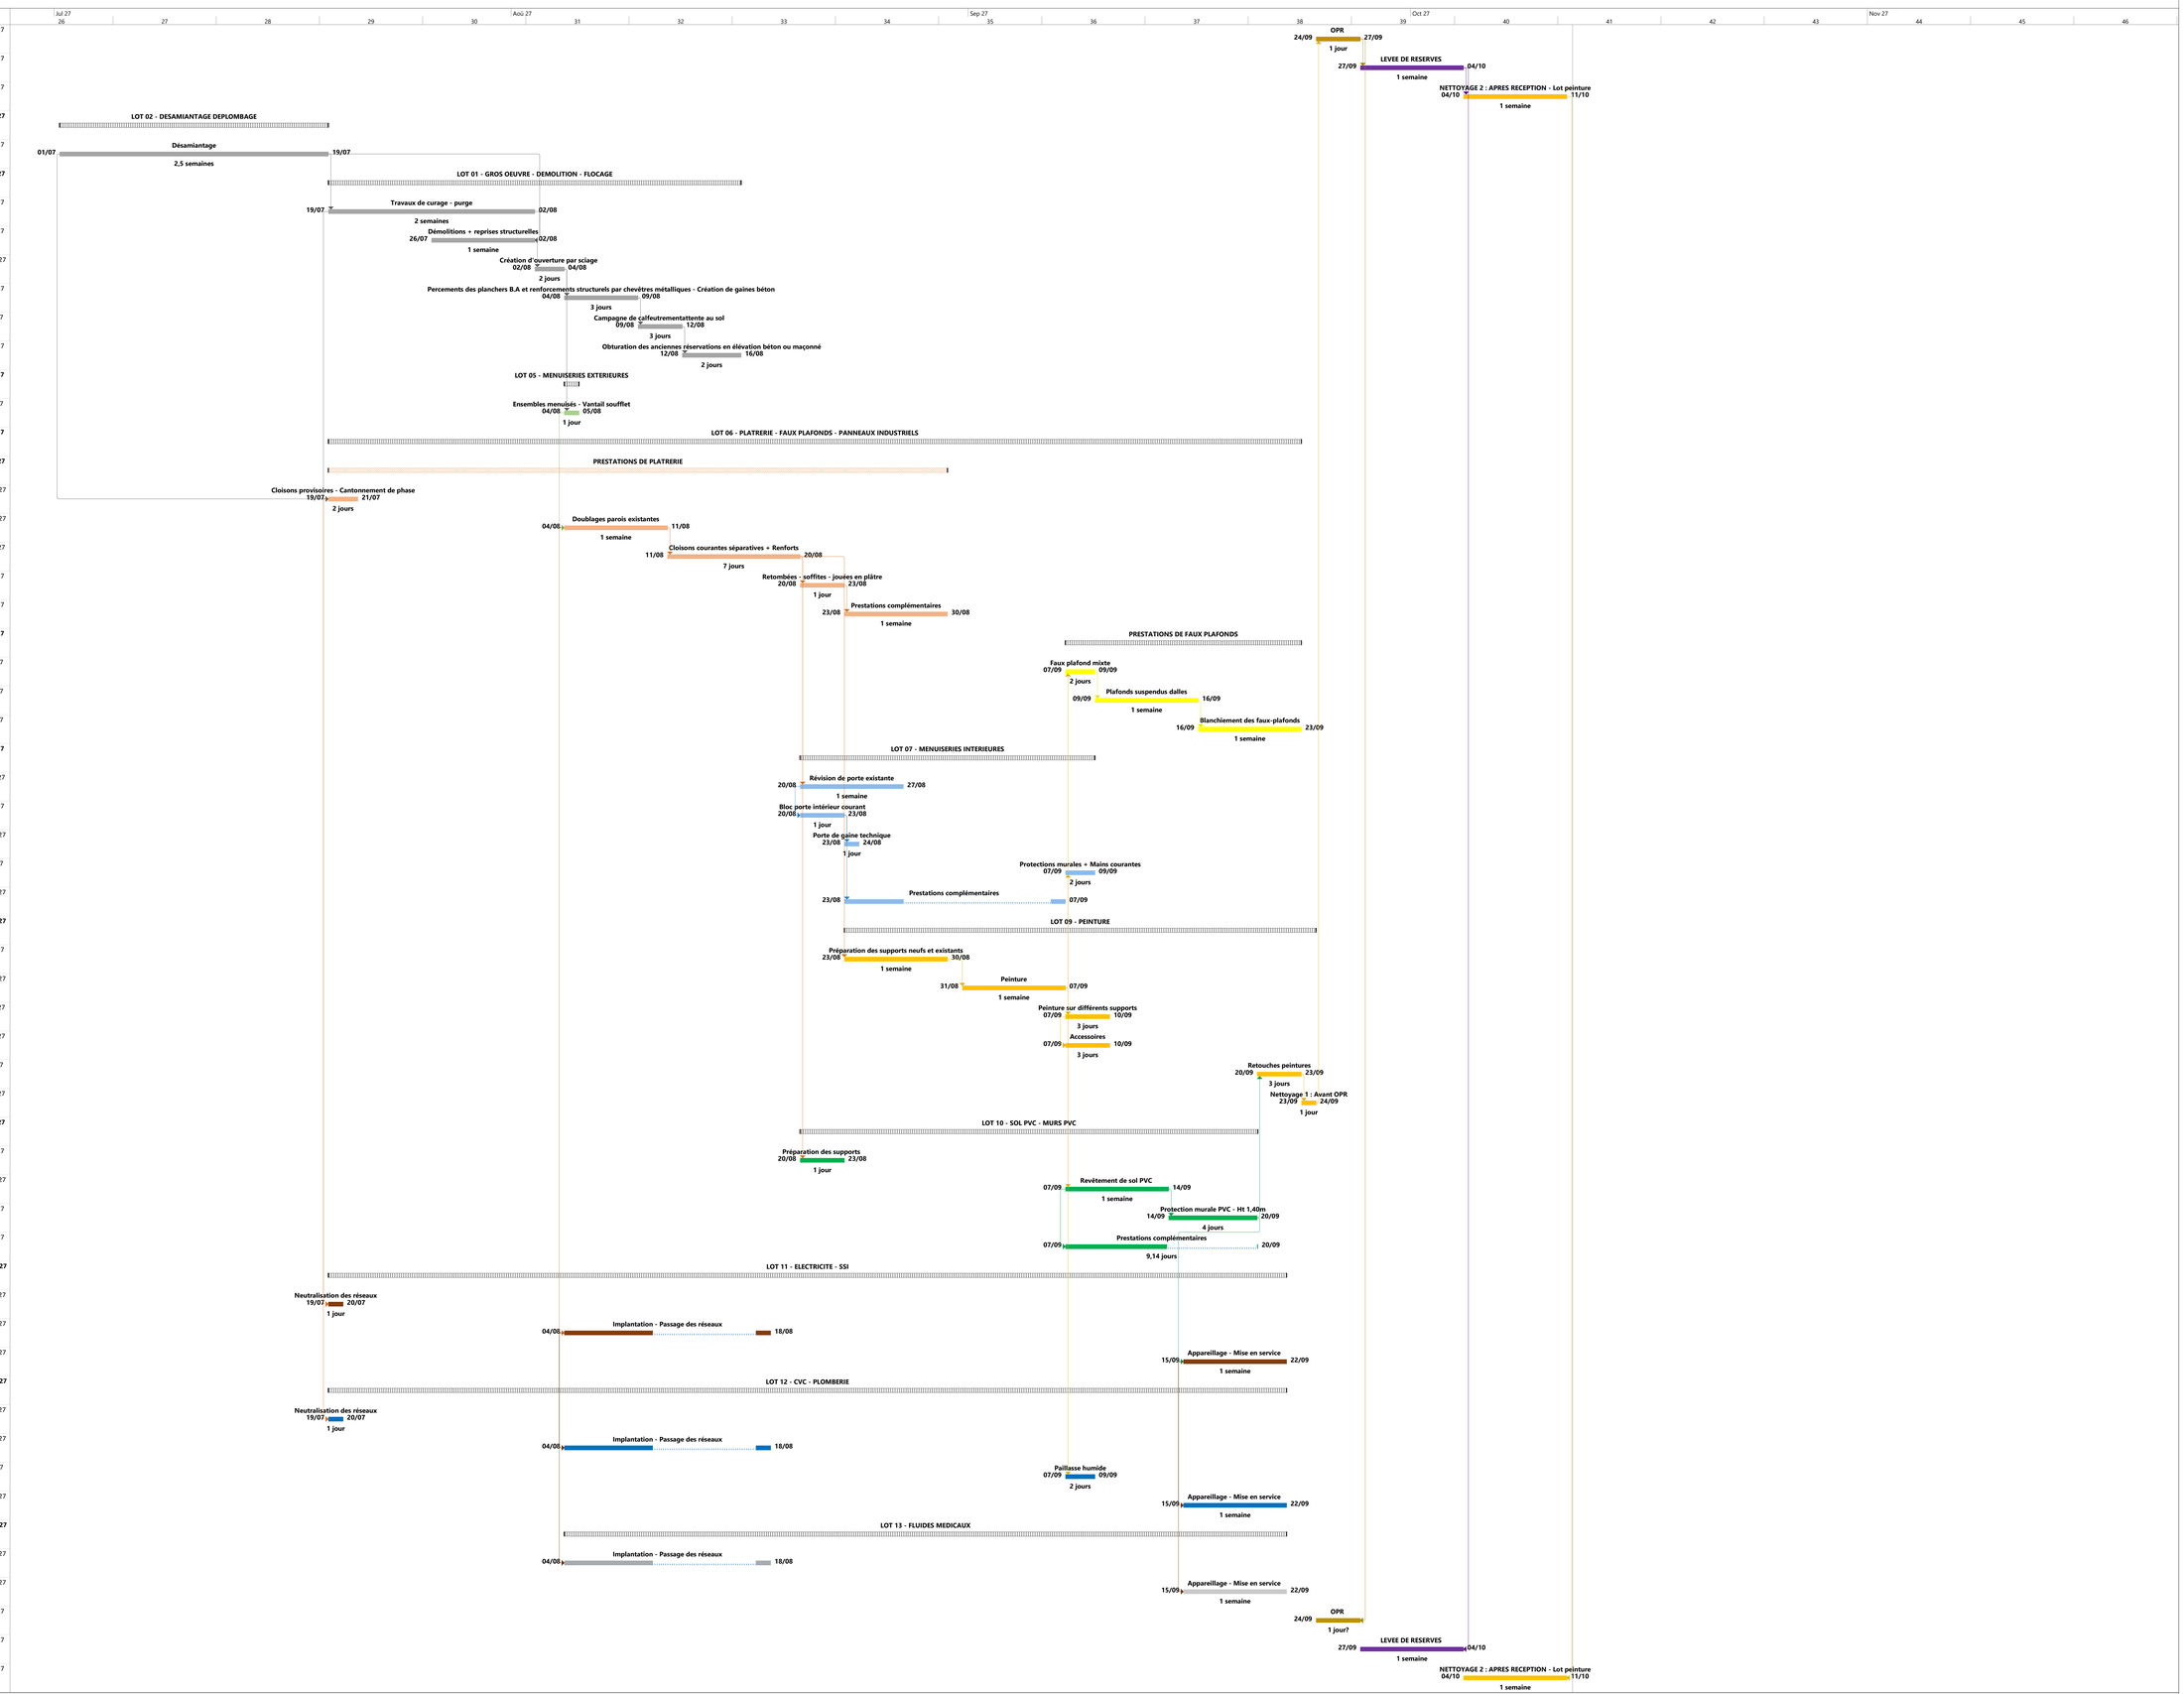

Projet : 2024-07-01 - PHASE 2
Date : Ven 13/06/25

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Jalon inactif · Tâche manuelle · Report récapitulatif manuel · Début uniquement · Tâches externes · Échéance · Progression manuelle
Fractionnement · Récapitulative · Tâche inactive · Récapitulatif inactif · Durée uniquement · Récapitulatif manuel · Fin uniquement · Jalons externes · Avancement
