C.N.R.S. - Remplacement du câblage informatique au C.R.P.G.

N°	Task Name	Durée	Début	Fin
1	AO	3 sm	Lun 03/11/25	Ven 21/11/25
2	Analyse d'offres	1 sm	Lun 24/11/25	Ven 28/11/25
3	Notification	1 sm	Lun 01/12/25	Ven 05/12/25
4	Préparation de chantier	2 sm	Lun 08/12/25	Ven 19/12/25
5	Visa	1 sm	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25
6	**Tirage de câbles**	**45 jours**	**Lun 05/01/26**	**Ven 06/03/26**
7	Sous sol	2 jours	Lun 05/01/26	Mar 06/01/26
8	RDC	9 jours	Mer 07/01/26	Lun 19/01/26
9	R+1	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26
10	R+2	6 jours	Mar 27/01/26	Mar 03/02/26
11	R+3	6 jours	Mer 04/02/26	Mer 11/02/26
12	R+4	4 jours	Jeu 12/02/26	Mar 17/02/26
13	recette informatique	3 jours	Mer 18/02/26	Ven 20/02/26
14	Dépose des anciennes installations	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26
15				
16	**Création du local informatique**	**33 jours**	**Lun 22/12/25**	**Mer 04/02/26**
17	Approvisionnement menuiserie	5 sm	Lun 22/12/25	Ven 23/01/26
18	Plâtrerie, peinture	4 jours	Lun 26/01/26	Jeu 29/01/26
19	Menuiserie	1 jour	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26
20	Electricité	1 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26
21	Ventilation	2 jours	Mar 03/02/26	Mer 04/02/26
22				
23	OPR	1 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
24	levée des réserves	2 sm	Mar 10/03/26	Lun 23/03/26
25	Réception des ouvrages	2 jours	Mar 24/03/26	Mer 25/03/26

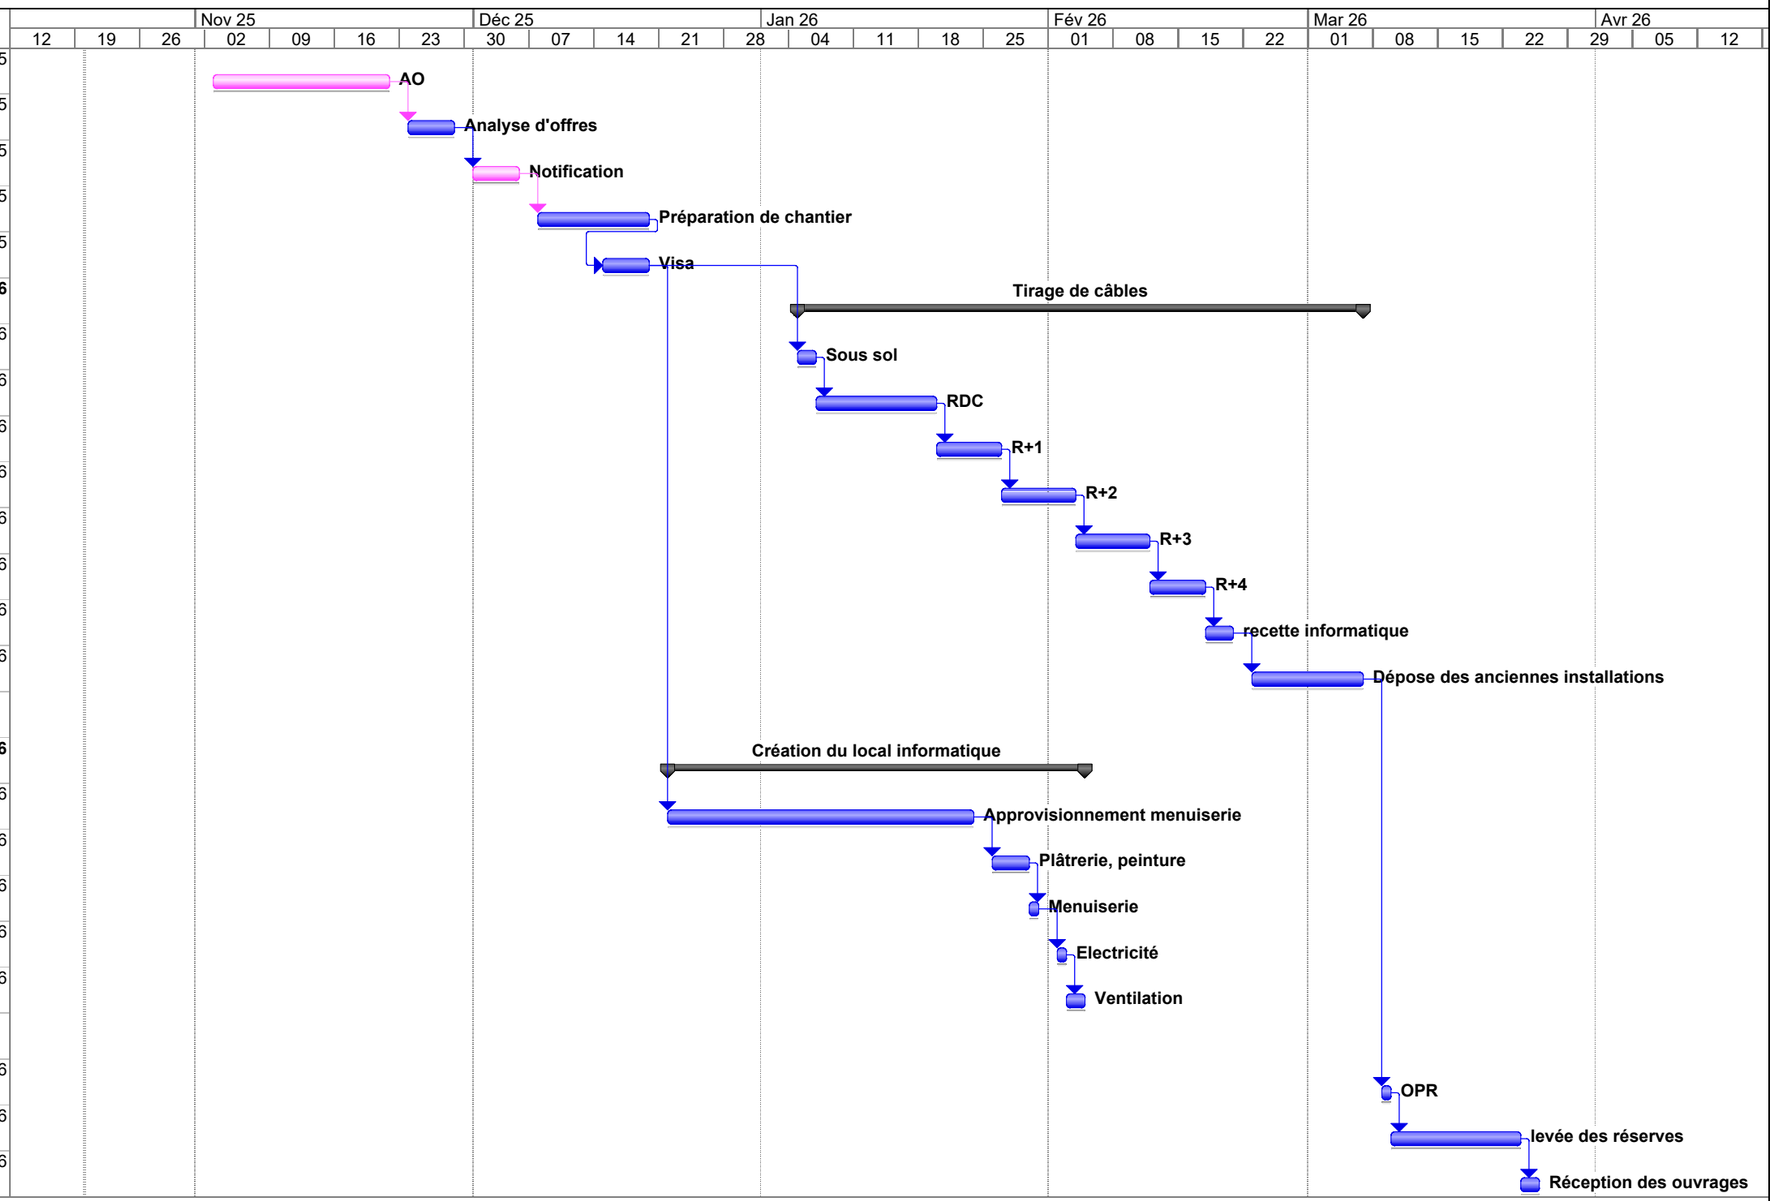

Project: CNRS remplacement câblage
Date: Lun 20/10/25

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
