Diagramme de Gantt
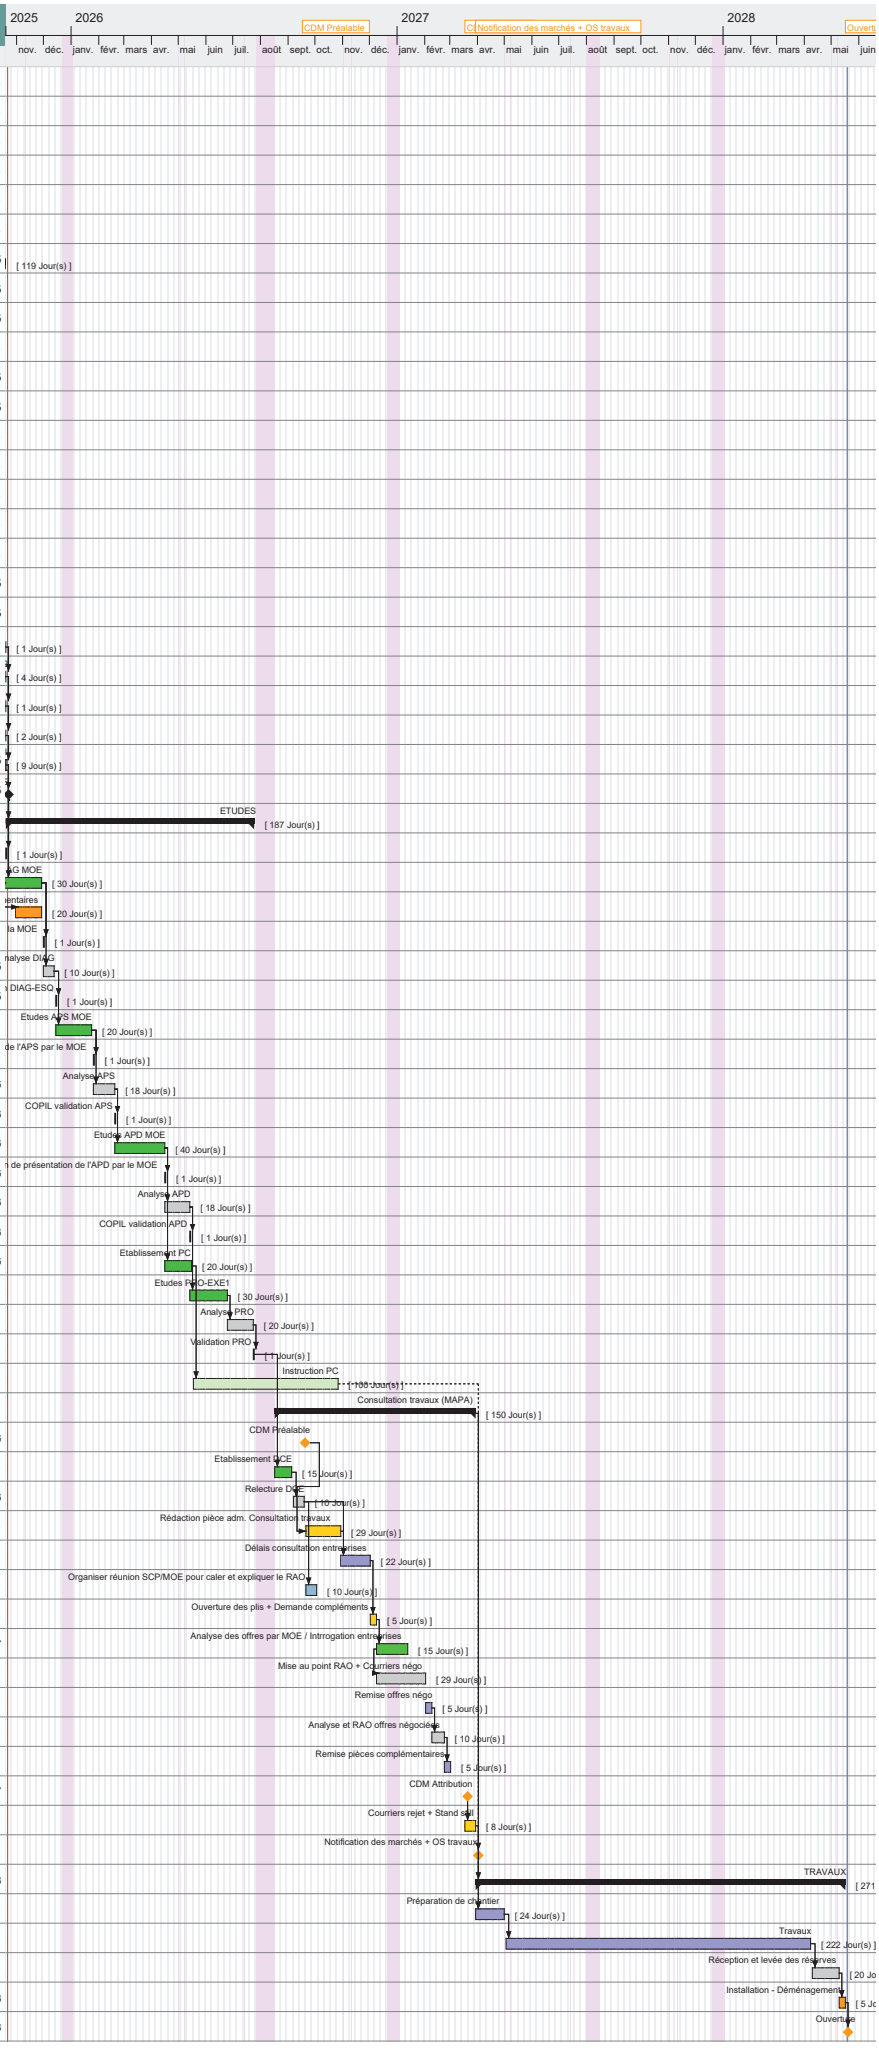
Nom	Date de début	Date de fin
PROGRAMME	21/02/2025	04/04/2025
Finalisation programme	21/02/2025	20/03/2025
Relecture préprogramme	21/03/2025	03/04/2025
COPIL validation programme	21/03/2025	21/03/2025
Rédaction DCE MOE	21/02/2025	04/04/2025
Recrutement CSPS-CT	18/04/2025	20/06/2025
CONSULTATION MOE (AO restreint)	07/04/2025	16/10/2025
finalisation DCE et Publi AAPC	07/04/2025	18/04/2025
Délai remise des candidatures	22/04/2025	19/05/2025
analyse candidatures	20/05/2025	02/06/2025
Analyse RAO v1 par SCP	03/06/2025	12/06/2025
demande pièces fisc et soc et envoi des rejets	13/06/2025	16/06/2025
Réception pièces fiscales et signature RAO	17/06/2025	26/06/2025
finalisation DCE offres	05/05/2025	01/07/2025
Mise à la signature des courri...	27/06/2025	30/06/2025
Envoi des courriers de rejet e...	02/07/2025	02/07/2025
DLRO phase offres	02/07/2025	08/09/2025
Analyse des 5 offres	09/09/2025	18/09/2025
échanges avec le SCP	19/09/2025	19/09/2025
demandes compléments ou précisions offres	22/09/2025	22/09/2025
RAO V2	23/09/2025	26/09/2025
relecture RAO V2 SCP	29/09/2025	29/09/2025
circuit signature et envoi lettres rejet	30/09/2025	01/10/2025
stand still	02/10/2025	14/10/2025
Notification marché MOE	17/10/2025	17/10/2025
ETUDES	17/10/2025	24/07/2026
réunion lancement marché MOE	20/10/2025	20/10/2025
Etudes DIAG MOE	17/10/2025	28/11/2025
Diags complémentaires	31/10/2025	28/11/2025
réunion présentation du DIAG par la MOE	01/12/2025	01/12/2025
Analyse DIAG	01/12/2025	12/12/2025
COPIL validation DIAG-ESQ	15/12/2025	15/12/2025
Etudes APS MOE	15/12/2025	23/01/2026
réunion présentation de l'APS par le MOE	26/01/2026	26/01/2026
Analyse APS	26/01/2026	18/02/2026
COPIL validation APS	19/02/2026	19/02/2026
Etudes APD MOE	19/02/2026	15/04/2026
réunion de présentation de l'APD par le MOE	16/04/2026	16/04/2026
Analyse APD	16/04/2026	13/05/2026
COPIL validation APD	14/05/2026	14/05/2026
Etablissement PC	16/04/2026	15/05/2026
Etudes PRO-EXE1	14/05/2026	24/06/2026
Analyse PRO	25/06/2026	23/07/2026
Validation PRO	24/07/2026	24/07/2026
Instruction PC	18/05/2026	26/10/2026
Consultation travaux (MAPA)	17/08/2026	29/03/2027
CDM Préalable	17/09/2026	17/09/2026
Etablissement DCE	17/08/2026	04/09/2026
Relecture DCE	07/09/2026	18/09/2026
Rédaction pièce adm. Consultation travaux	21/09/2026	29/10/2026
Délais consultation entreprises	30/10/2026	01/12/2026
Organiser réunion SCP/MOE pour...	21/09/2026	02/10/2026
Ouverture des plis + Demande compléments	02/12/2026	08/12/2026
Analyse des offres par MOE / Intrrogation entreprises	09/12/2026	12/01/2027
Mise au point RAO + Courriers négo	09/12/2026	01/02/2027
Remise offres négo	02/02/2027	08/02/2027
Analyse et RAO offres négociées	09/02/2027	22/02/2027
Remise pièces complémentaires	23/02/2027	01/03/2027
CDM Attribution	18/03/2027	18/03/2027
Courriers rejet + Stand still	18/03/2027	29/03/2027
Notification des marchés + OS travaux	30/03/2027	30/03/2027
TRAVAUX	30/03/2027	16/05/2028
Préparation de chantier	30/03/2027	30/04/2027
Travaux	03/05/2027	07/04/2028
Réception et levée des réserves	10/04/2028	09/05/2028
Installation - Déménagement	10/05/2028	16/05/2028
Ouverture	17/05/2028	17/05/2028
