Agence Emmanuel Géhin
Pilote de Chantier
5, rue de la Butte
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03 83 38 25 06 - 06 84 22 26 26

UNIVERSITE DE LORRAINE
Mise en sécurité incendie de la BU au Campus Brabois Santé - 9 avenue de la forêt de Haye 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy
Calendrier prévisionnel des travaux
2 mois de préparation et 4 mois de travaux

12 janvier 2026
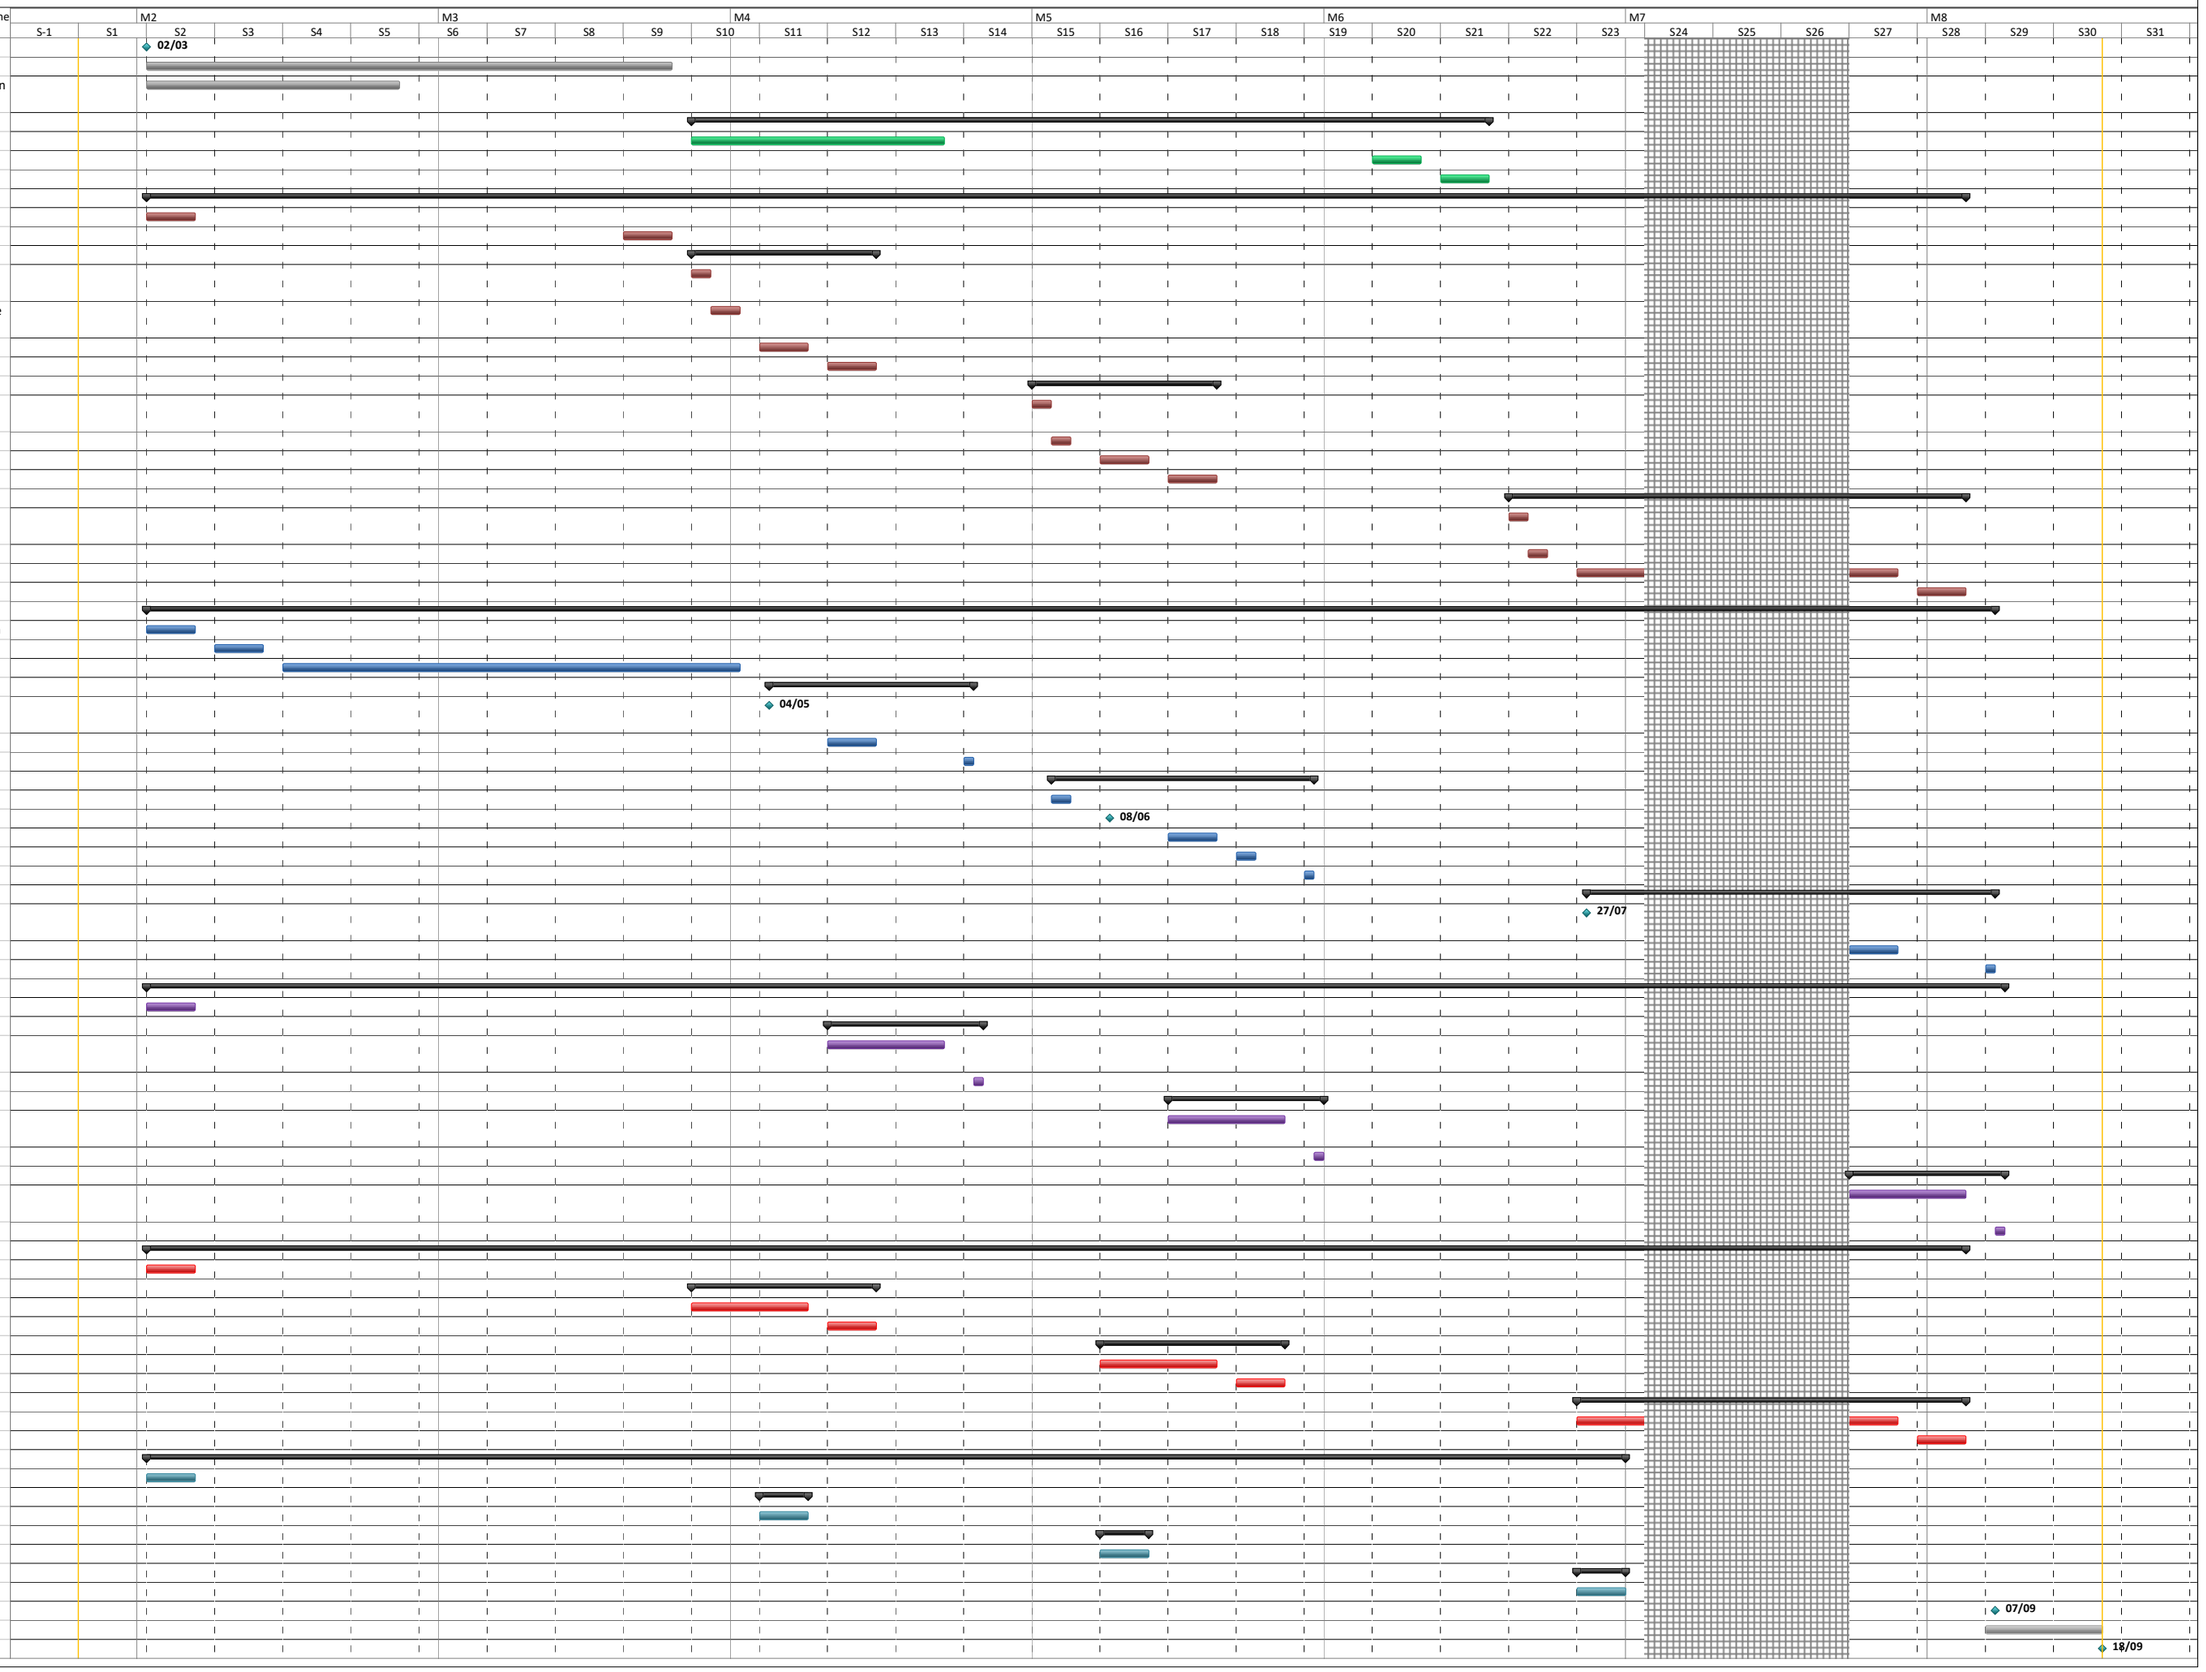
N°	Remarques	Nom de la tâche
1		Ordre de service de démarrage
2		Période de préparation
3		Etablissement des documents d'exécution
4	**LOT 01**	**DESAMIANTAGE**
5		Plan de retrait
6		Désamiantage cloisons du RDC
7		Mesures libératoires
8	**LOT 02**	**PLATRERIE - FAUX PLAFONDS**
9		Dossier technique
10		Installations de chantier
11		**Travaux du R+2**
12		Protections sols et écran anti-poussière
13		Démolitions de cloison et dépose de faux plafonds
14		Cloisons neuves
15		Reprises de faux plafonds
16		**Travaux du R+1**
17		Protections sols et écran anti-poussière
18		Dépose de faux plafonds
19		Cloisons neuves
20		Reprises de faux plafonds
21		**Travaux du RDC**
22		Protections sols et écran anti-poussière
23		Dépose de faux plafonds
24		Cloisons neuves
25		Reprises de faux plafonds
26	**LOT 03**	**MENUISERIE INTERIEURE BOIS**
27		Dossier technique et plans d'exécution
28		Validation des plans techniques
29		Commande des portes
30		**Travaux du R+2**
31		Livraison des huisseries et châssis bois
32		Pose des portes
33		Pose de la signalétique
34		**Travaux du R+1**
35		Dépose d'étagères
36		Livraison des huisseries
37		Pose des portes
38		Pose d'étagères
39		Pose de la signalétique
40		**Travaux du RDC**
41		Livraison des huisseries et châssis bois
42		Pose des portes
43		Pose de la signalétique
44	**LOT 04**	**PEINTURES**
45		Dossier technique
46		**Travaux du R+2**
47		Mise en peinture des portes et cloisons
48		Nettoyage
49		**Travaux du R+1**
50		Mise en peinture des portes et cloisons
51		Nettoyage
52		**Travaux du RDC**
53		Mise en peinture des portes et cloisons
54		Nettoyage
55	**LOT 05**	**ELECTRICITE**
56		Dossier technique
57		**Travaux du R+2**
58		Câblage
59		Appareillage
60		**Travaux du R+1**
61		Câblage
62		Appareillage
63		**Travaux du RDC**
64		Câblage
65		Appareillage
66	**LOT 06**	**GENIE CLIMATIQUE**
67		Dossier technique
68		**Travaux du R+2**
69		Pose des clapets CF
70		**Travaux du R+1**
71		Pose des clapets CF
72		**Travaux du RDC**
73		Pose des clapets CF
74		**OPR**
75		**Levées des réserves**
76		**Réception de chantier**
