PRÉFET
DE LOIR-ET-CHER
Liberté
Égalité
Fraternité

Création d'un COD Préfecture de Loir-et-Cher
PLANNING PREVISIONNEL1

Secrétariat Général Commun de Loir-et-Cher
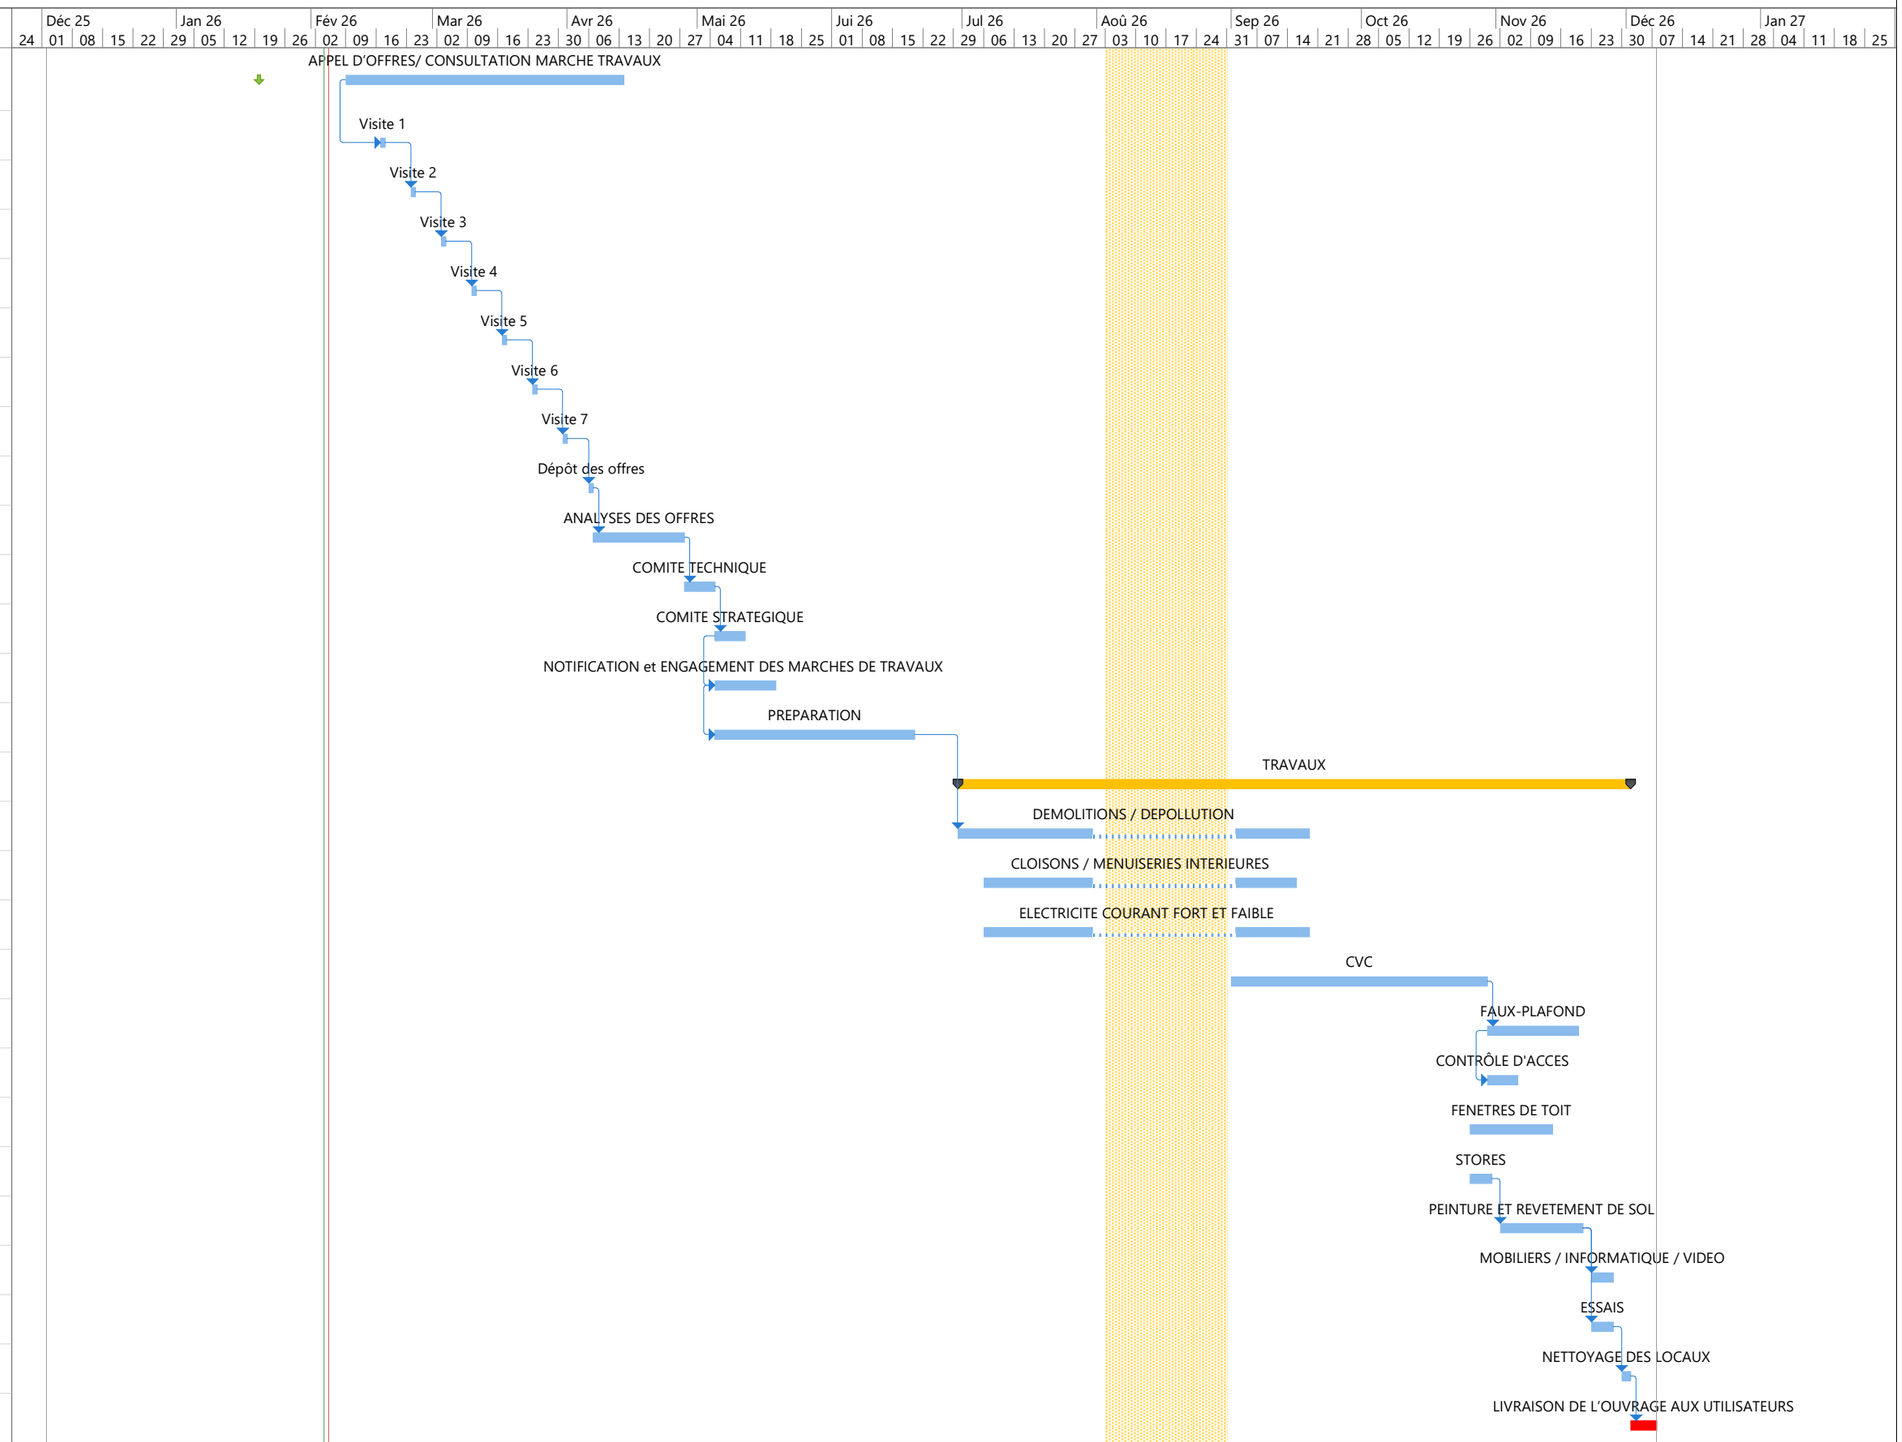
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**APPEL D'OFFRES/ CONSULTATION MARCHE TRAVAUX**	46 jours	Lun 09/02/26	Lun 13/04/26
2	Visite 1	1 jour	Mar 17/02/26	Mar 17/02/26
3	Visite 2	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26
4	Visite 3	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26
5	Visite 4	1 jour	Mar 10/03/26	Mar 10/03/26
6	Visite 5	1 jour	Mar 17/03/26	Mar 17/03/26
7	Visite 6	1 jour	Mar 24/03/26	Mar 24/03/26
8	Visite 7	1 jour	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26
9	Dépôt des offres	1 jour?	Lun 06/04/26	Lun 06/04/26
10	**ANALYSES DES OFFRES**	**15 jours**	**Mar 07/04/26**	**Lun 27/04/26**
11	**COMITE TECHNIQUE**	5 jours	Mar 28/04/26	Lun 04/05/26
12	**COMITE STRATEGIQUE**	5 jours	Mar 05/05/26	Lun 11/05/26
13	**NOTIFICATION et ENGAGEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX**	10 jours	Mar 05/05/26	Lun 18/05/26
14	**PREPARATION**	34 jours	Mar 05/05/26	Ven 19/06/26
15	**TRAVAUX**	89 jours	Mar 30/06/26	Mar 01/12/26
16	DEMOLITIONS / DEPOLLUTION	36 jours	Mar 30/06/26	Ven 18/09/26
17	CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES	29 jours	Lun 06/07/26	Mar 15/09/26
18	ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE	32 jours	Lun 06/07/26	Ven 18/09/26
19	CVC	43 jours	Mar 01/09/26	Jeu 29/10/26
20	FAUX-PLAFOND	15 jours	Ven 30/10/26	Jeu 19/11/26
21	CONTRÔLE D'ACCES	5 jours	Ven 30/10/26	Jeu 05/11/26
22	FENETRES DE TOIT	15 jours	Lun 26/10/26	Ven 13/11/26
23	STORES	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
24	PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL	15 jours	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
25	MOBILIERS / INFORMATIQUE / VIDEO	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
26	ESSAIS	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
27	NETTOYAGE DES LOCAUX	2 jours	Lun 30/11/26	Mar 01/12/26
28	**LIVRAISON DE L'OUVRAGE AUX UTILISATEURS**	4 jours	Mer 02/12/26	Lun 07/12/26
