MULHOUSE_MAISON DU DON
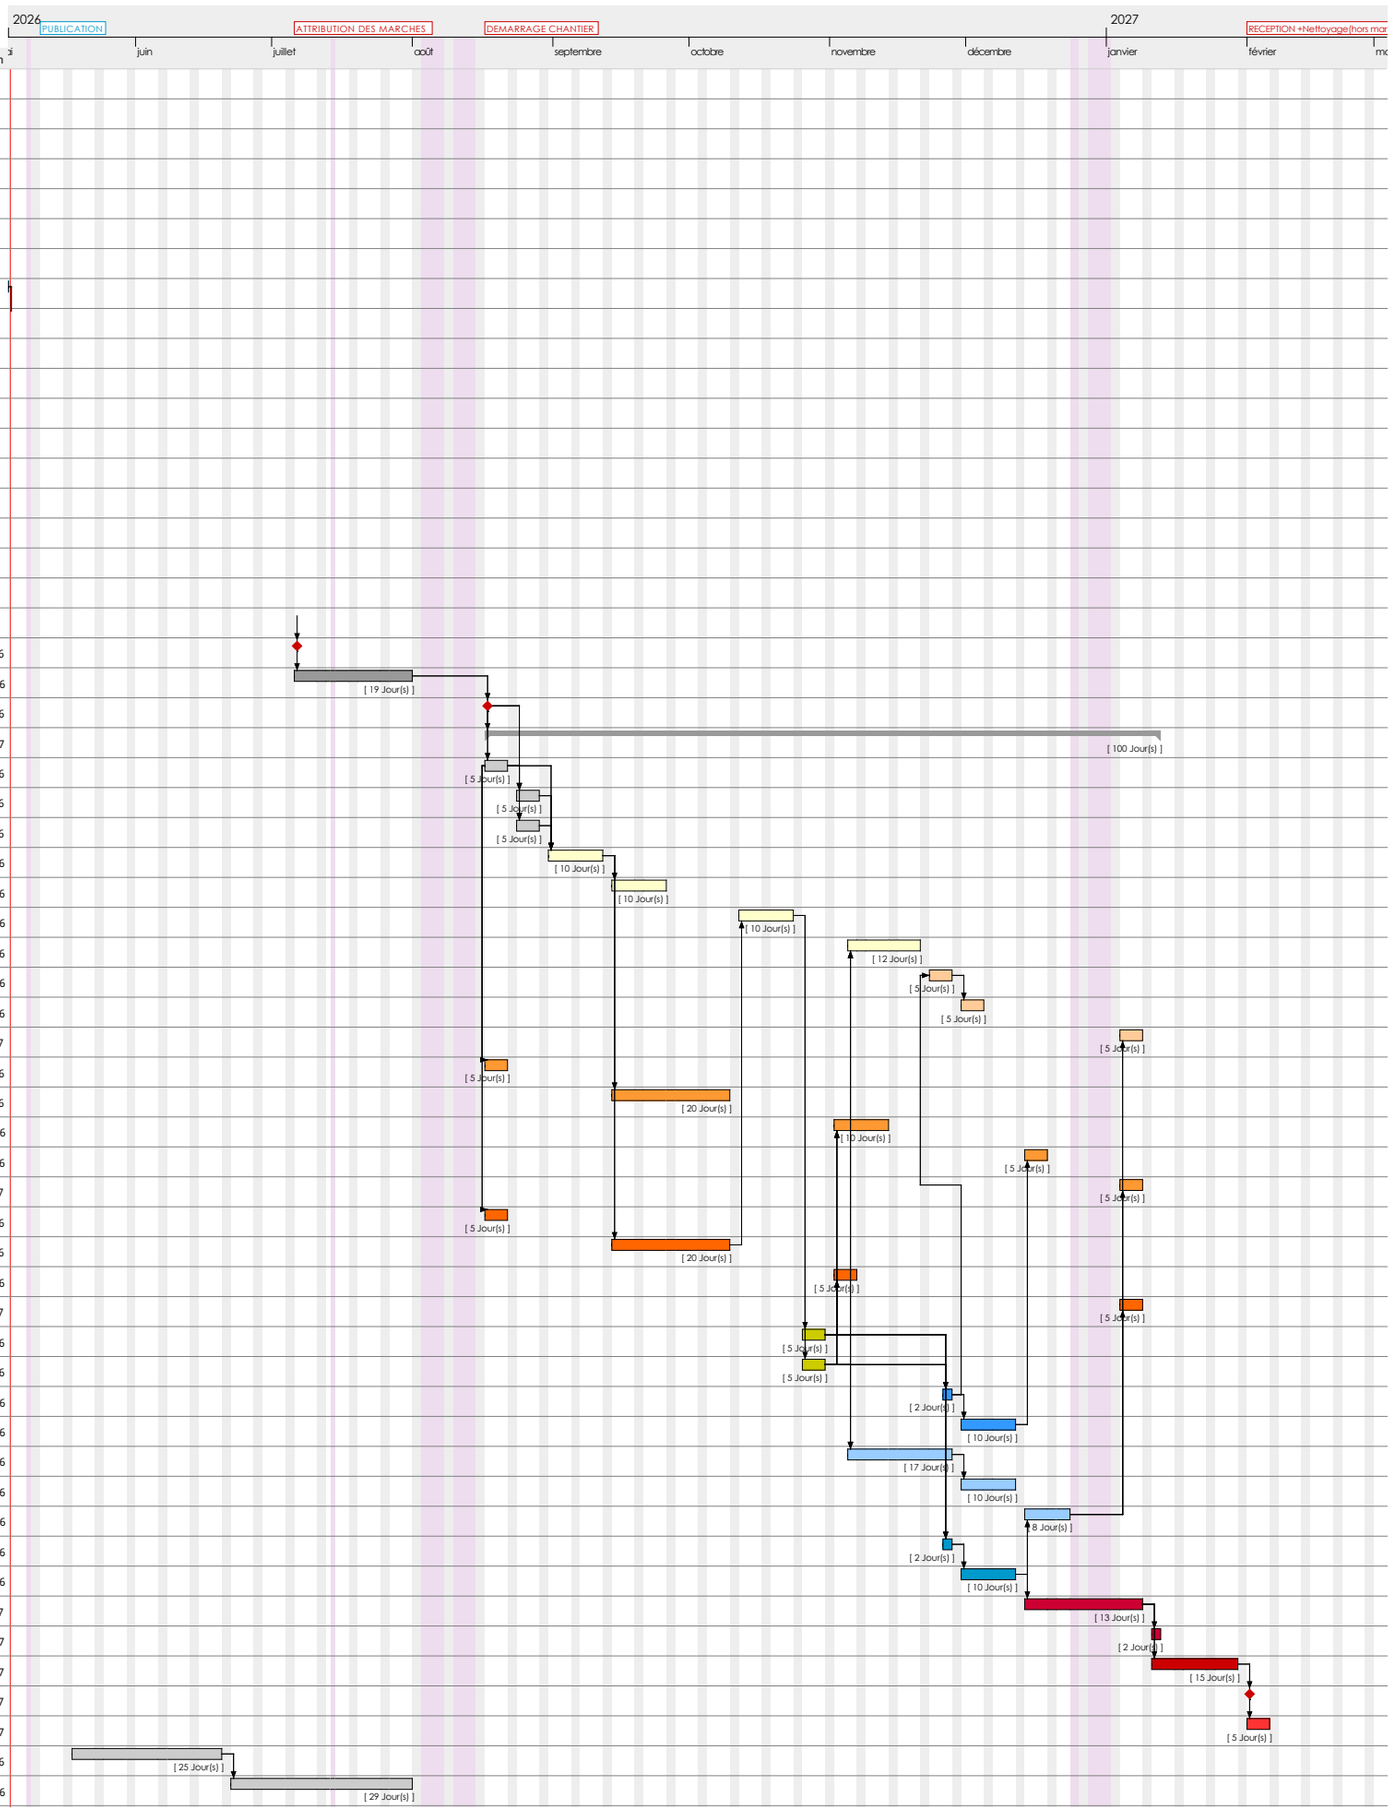
Nom	Date...	Date de fin
ATTRIBUTION DES MARCHES	06/0...	06/07/2026
MOIS DE PREPARATION	06/0...	31/07/2026
DEMARRAGE CHANTIER	17/0...	17/08/2026
CHANTIER	17/0...	12/01/2027
Lot 01- démolitions et curage	17/0...	21/08/2026
Lot 01-création ouvertures et r...	24/0...	28/08/2026
Lot 01-réseaux et dallage	24/0...	28/08/2026
Lot 02_flocage et doublage périphérique	31/0...	11/09/2026
Lot 02_pose des cloison et cont...	14/0...	25/09/2026
Lot 02_fermeture des cloisons	12/1...	23/10/2026
Lot 02_ossature des faux plafonds	05/1...	20/11/2026
Lot 03_pose des cadre de portes	23/1...	27/11/2026
Lot 03_pose des chassis vitrés	30/1...	04/12/2026
Lot 03_finitons et pose des battants	04/0...	08/01/2027
Lot 04 _consignation,dépose et préparation	17/0...	21/08/2026
Lot 04 _passage des réseaux	14/0...	09/10/2026
Lot 04 _équipements des plénums	02/1...	13/11/2026
Lot 04 _pose des équipements sanitaires	14/1...	18/12/2026
Lot 04 _finalisation de l'installation	04/0...	08/01/2027
Lot 05_consignation,dépose et préparation	17/0...	21/08/2026
Lot 05_passage des réseaux	14/0...	09/10/2026
Lot 05_équipements des plénum	02/1...	06/11/2026
Lot 05_Lot 05_Finalisation de l'installation	04/0...	08/01/2027
Lot 06_réalisation de la chape ...	26/1...	30/10/2026
Lot 06_séchage de la chape	26/1...	30/10/2026
Lot 07_Ragréage	26/1...	27/11/2026
Lot 07_Pose faiences et carrelages	30/1...	11/12/2026
Lot 08_Préparation support et accroche	05/1...	27/11/2026
Lot 08_Peinture	30/1...	11/12/2026
Lot 08_Peinture de finition	14/1...	23/12/2026
Lot 09_Préparation du supports et ragréage	26/1...	27/11/2026
Lot 09_Pose du sol	30/1...	11/12/2026
Lot 10_Pose du mobilier fixe	14/1...	08/01/2027
Lot 10_Approvisionnement mobilier	11/0...	12/01/2027
OPR	11/0...	29/01/2027
RECEPTION +Nettoyage(hors marché)	01/0...	01/02/2027
EMMENAGEMENT UTILISATEUR	01/0...	05/02/2027
TRAVAUX HORS MARCHES- approvisionnement	18/0...	19/06/2026
TRAVAUX HORS MARCHES- travaux	22/0...	31/07/2026
