N°	Nom de la tâche	Durée
1	**CONSULTATION MOE**	**50 jours**
2	**Candidatures MOE**	**50 jours**
3	Consultation candidatures/offres (procédure négociée sans remise de prestations)	4 semaines
4	Analyse candidatures + offres technique	4 semaines
5	Audition/négociation et attribution en commission	3 jours
6	Mise au point du marché	6 jours
7	Notification du marché MOE	1 jour
8		
9	**PHASE 4 - SUIVI DES ETUDES ET CONSULTATION ENTREPRISES**	**175 jours**
10	Production d'une esquisse	2 semaines
11	Analyse Validation ESQ	1 semaine
12	Rédaction APS	3 semaines
13	Analyse validation APS	2 semaines
14	Rédaction APD	4 semaines
15	Analyse validation APD	2 semaines
16	Conception Permis Construire	1 semaine
17	Instruction PC	3 mois
18	Arrêté PC	0 jour
19	Recours des tiers	2 mois
20	Rédaction PRO / DCE	3 semaines
21	Analyse validation PRO	1 semaine
22	Envoi marché travaux en consultation	4 semaines
23	Ouverture des offres	0 jour
24	Dépouillement / rapport d'analyse des offres	2 semaines
25	Négociation	2 semaines
26	Vérification rapport d'analyse pour attribution des marchés de travaux	1 semaine
27	Signature et Notification marché travaux	0 jour
28		
29	**Réalisation travaux**	**160 jours**
30	Ordre de service démarrage	0 mois
31	Travaux dont période de préparation	8 mois
32		
33	**Réception**	**30 jours**
34	OPR+Délais approbation proposition réception	2 semaines
35	Réception	0 jour
36	Levée de réserves	1 mois

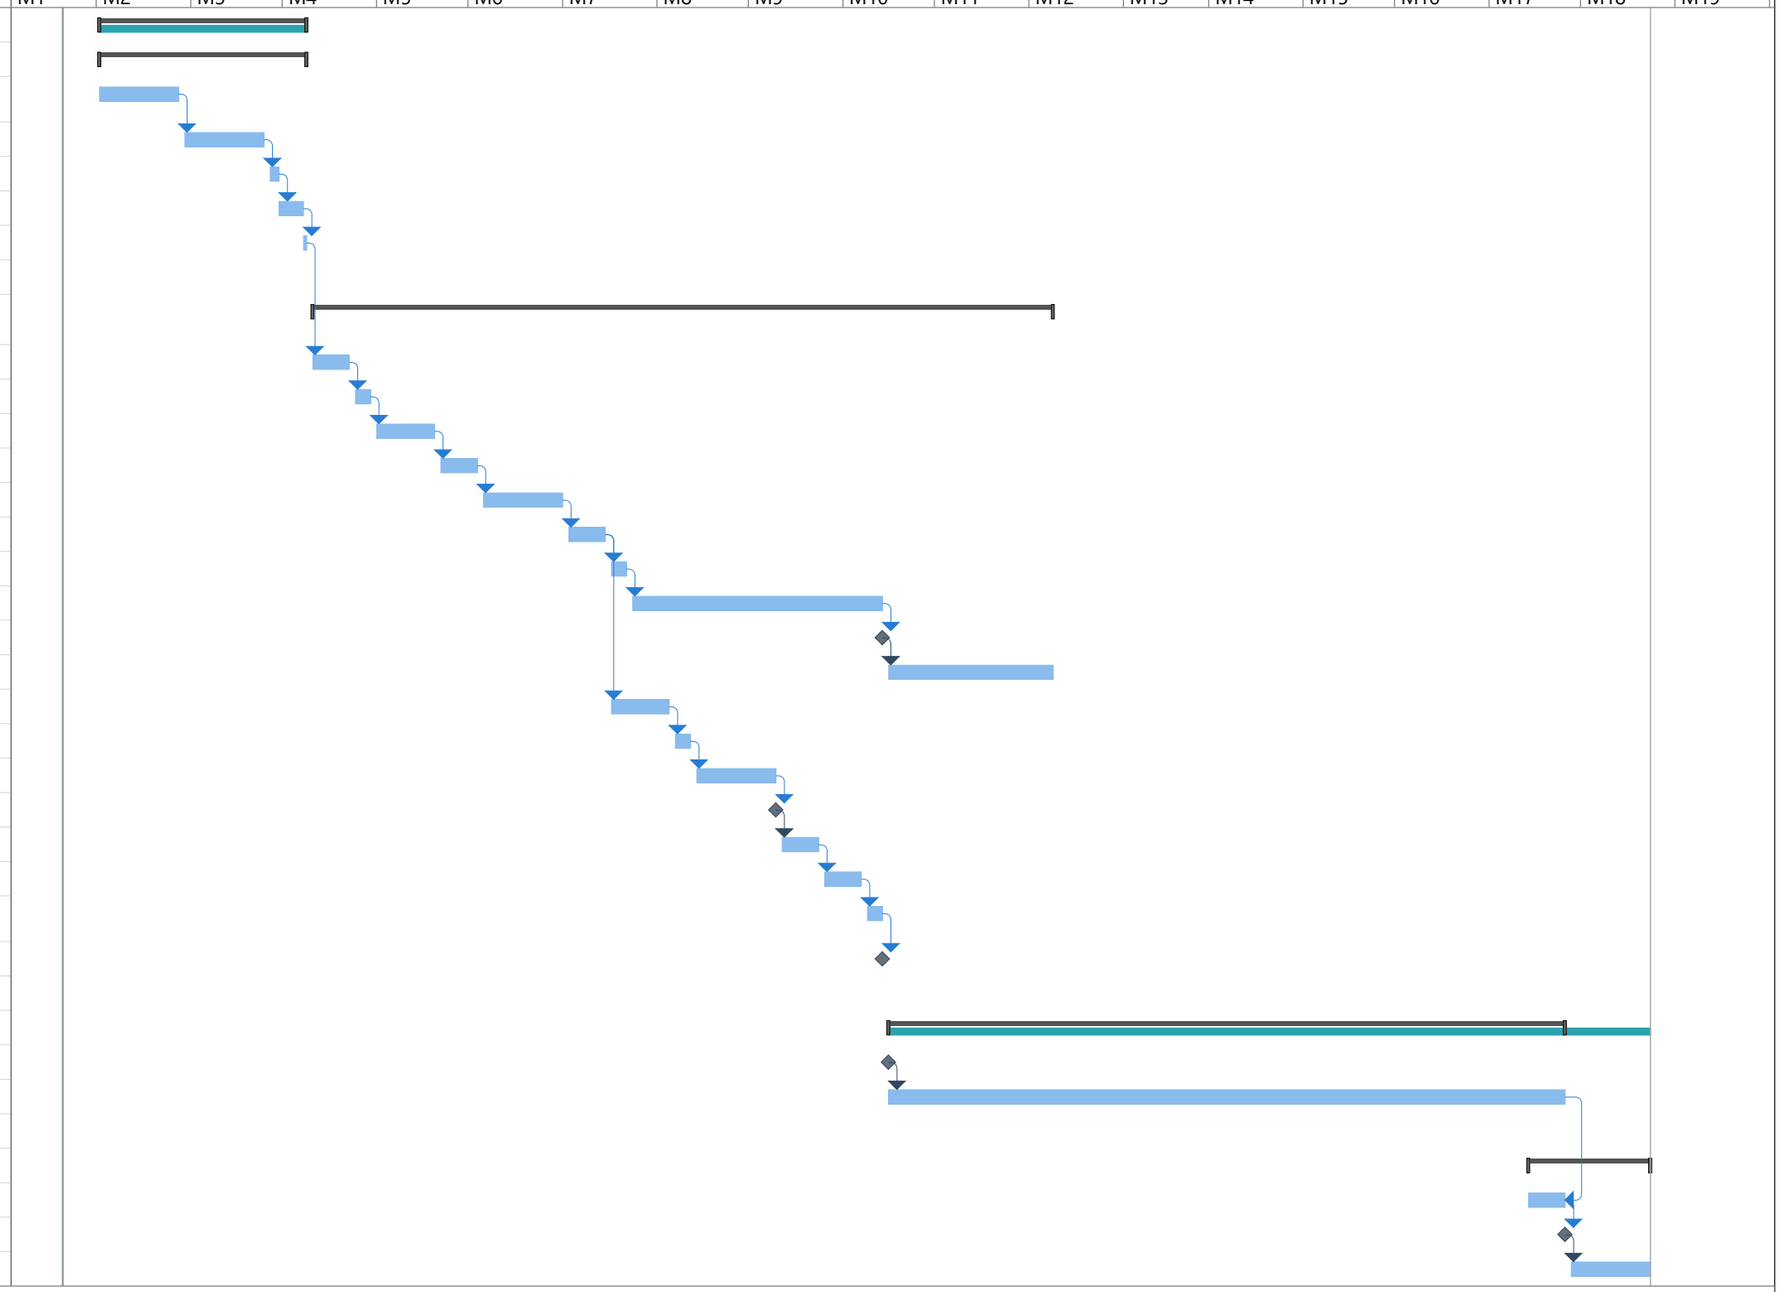

Planning prévisionnel INRAE
