Indice 0

# Planning Enveloppe

## Chantier : Réhabilitation et extension de la base hélicoptère - OCTEVILLE

| N° | Nom de la tâche | Durée |
|---|---|---|
| 1 | **Réhabilitation de la base hélicoptère - OCTEVILLE** | **300 jrs** |
| 2 | OS de démarrage | 0 jr |
| 3 | Période de préparation | 20 jrs |
| 4 | **Phase 1 - Démolition / construction neuve** | **180 jrs** |
| 5 | Désamiantage / Démolition | 2 mois |
| 6 | Infrastructure | 15 jrs |
| 7 | Superstructure | 35 jrs |
| 8 | Echafaudage commun | 20 jrs |
| 9 | Clos Couvert | 20 jrs |
| 10 | Aménagement Intérieur | 50 jrs |
| 11 | Lots technique | 105 jrs |
| 12 | Transition phase 1 vers phase 2 | 5 jrs |
| 13 | AOR - Phase 1 | 20 jrs |
| 14 | **Phase 2 - Réhabilitation zone existante** | **120 jrs** |
| 15 | Désamiantage | 15 jrs |
| 16 | Superstructure - Reprise de Gros-Œuvre - Curage | 20 jrs |
| 17 | Echafaudage commun | 20 jrs |
| 18 | Clos Couvert | 20 jrs |
| 19 | Aménagement Intérieur | 55 jrs |
| 20 | Lots technique | 85 jrs |
| 21 | AOR - Phase 2 | 20 jrs |

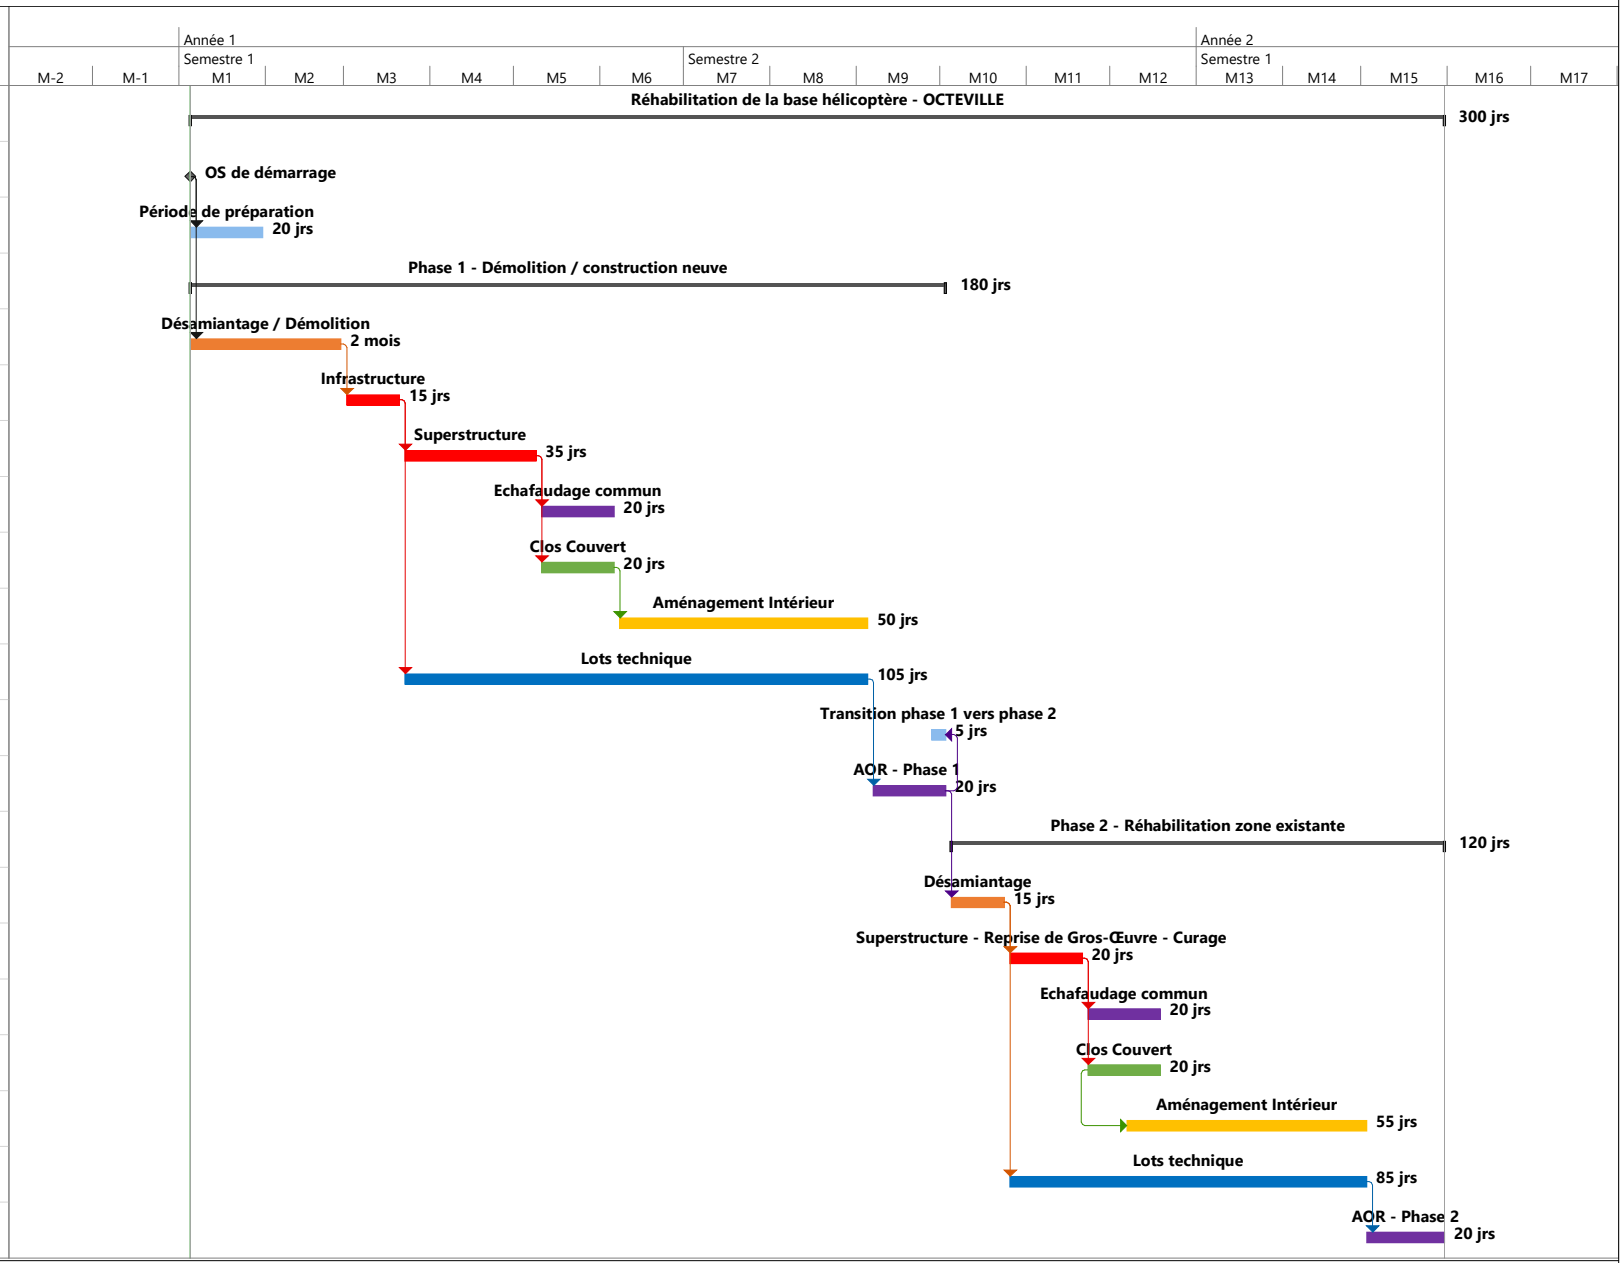


Etabli le 05-09-2025
