PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
INRAE - Bâtiment AGROBIOTECH

02/04/2026
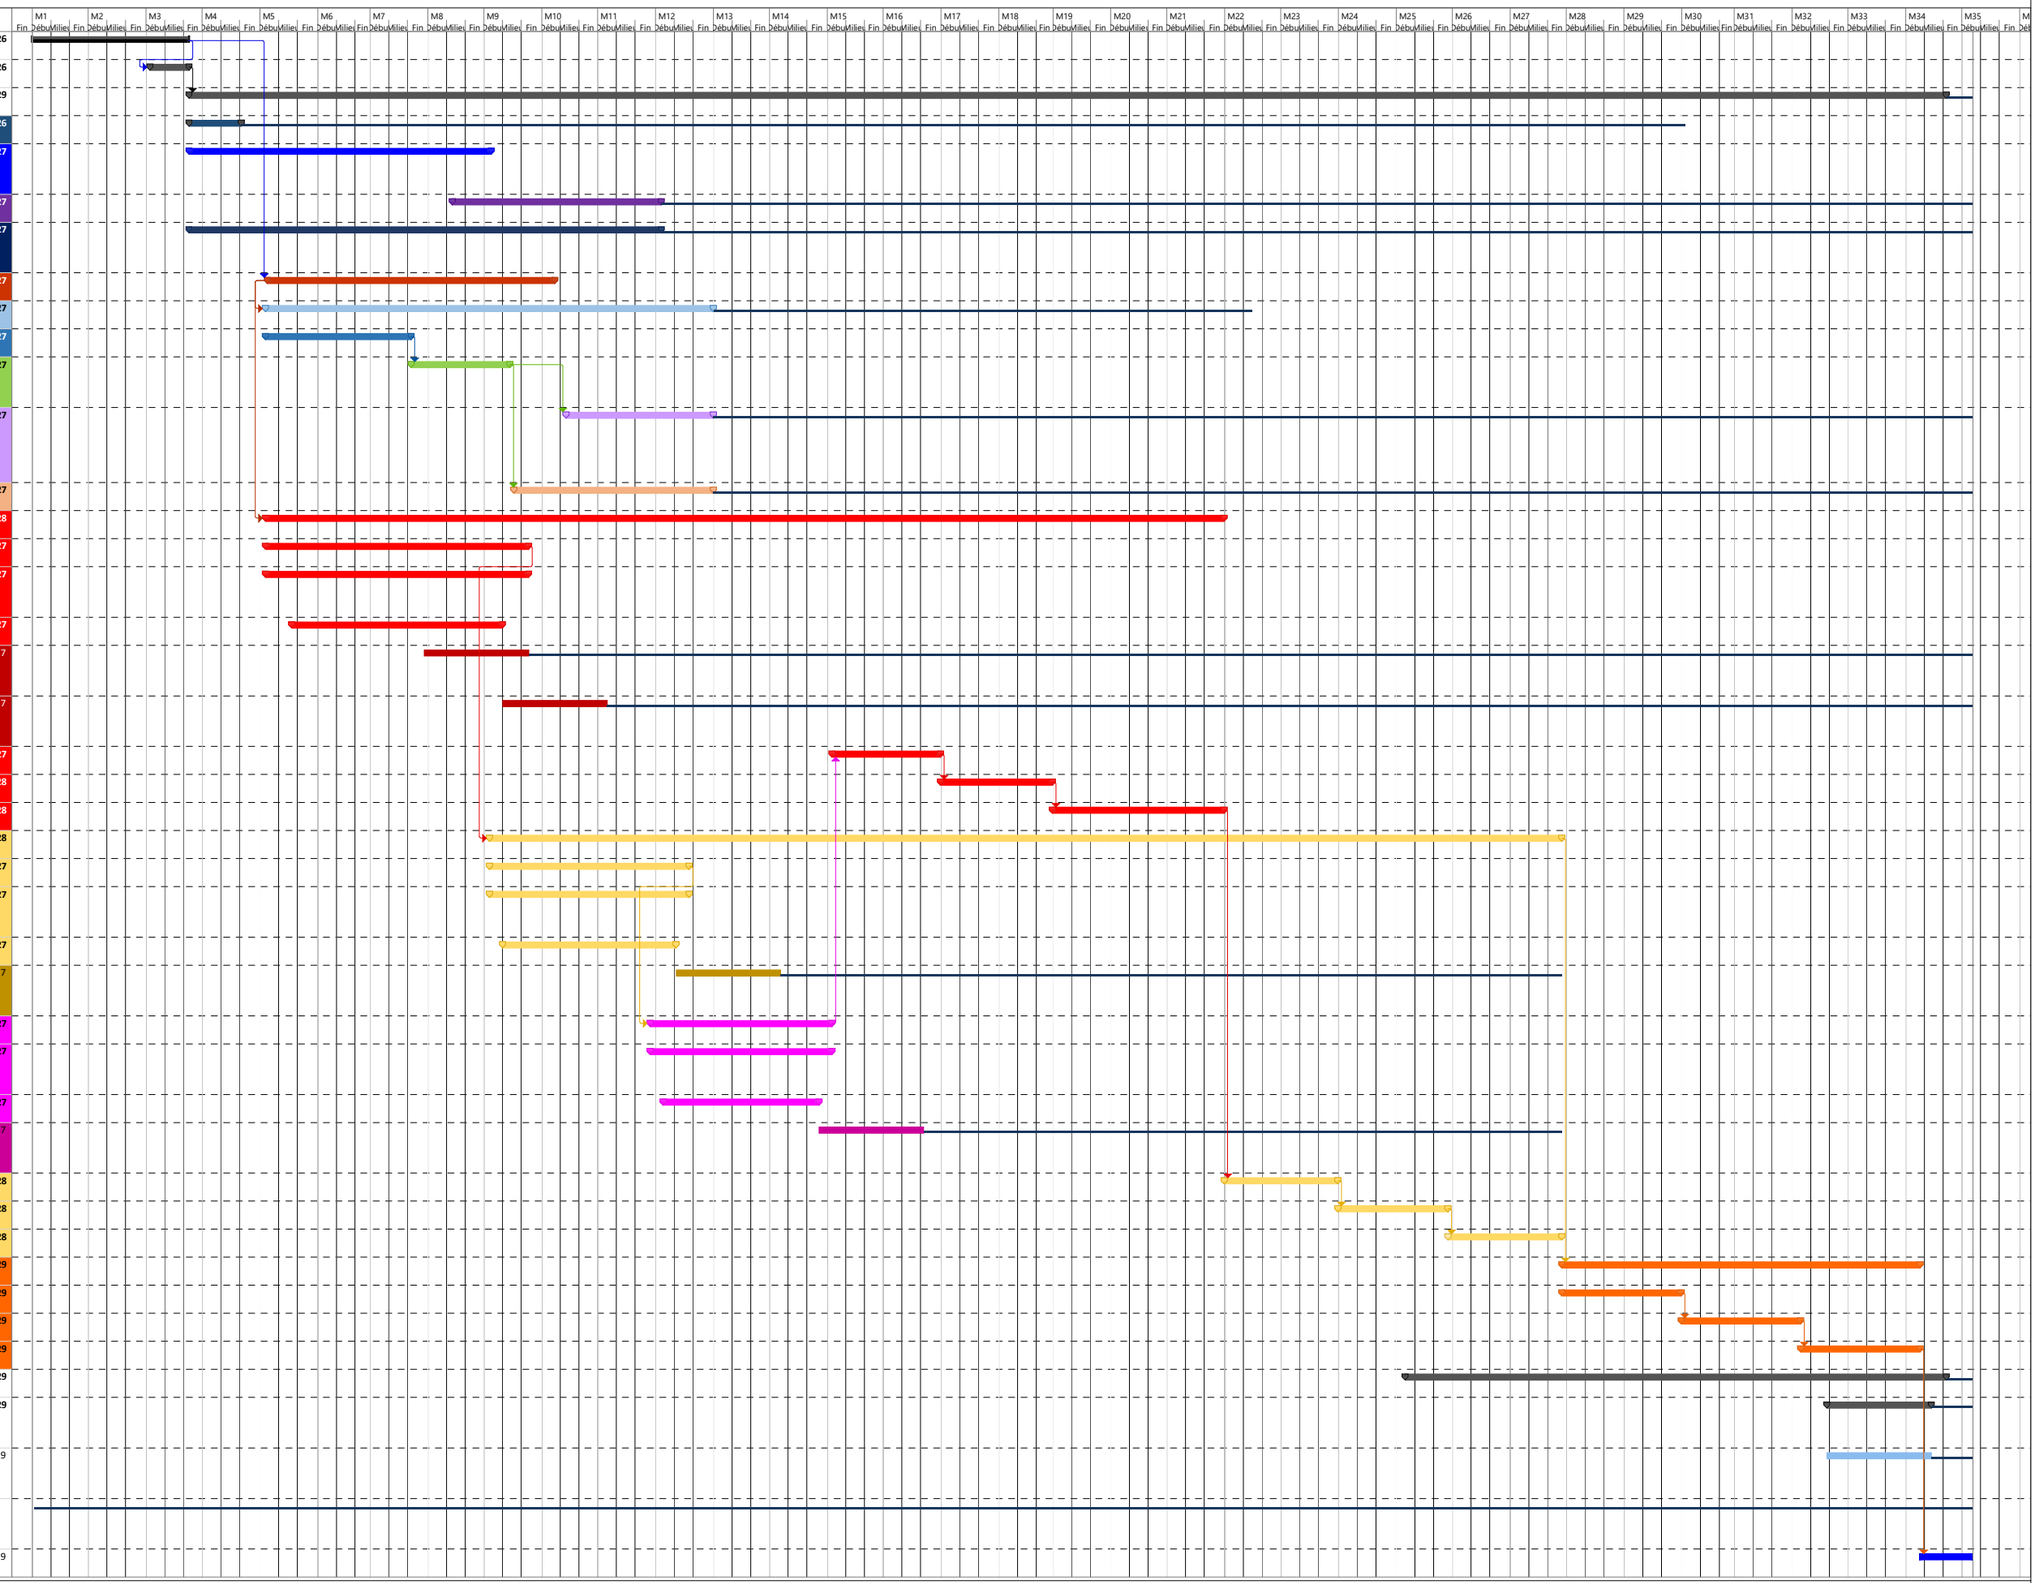
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Préparation de Chantier et études EXE**	**12 semaines**	**01/09/2026**	**23/11/2026**
3	**Installation de Chantier**	**15 jours**	**03/11/2026**	**23/11/2026**
5	**Phase travaux**	**673,5 jours**	**24/11/2026**	**22/06/2029**
6	**Travaux Préparatoires**	**20 jours**	**24/11/2026**	**21/12/2026**
10	**Local technique production thermique et réseaux généraux**	**116 jours**	**24/11/2026**	**04/05/2027**
22	**LT CTA CUISINE**	**80 jours**	**14/04/2027**	**03/08/2027**
30	**LT CTA Salle Polyvalente + VRV - avec livraisons intermédiaires**	**181 jours**	**24/11/2026**	**03/08/2027**
45	**LT TGBT et Principaux**	**110 jours**	**05/01/2027**	**07/06/2027**
48	**Bât A RDC et R+1 - Bât B RDC**	**172 jours**	**04/01/2027**	**31/08/2027**
49	**Zone EST A0.1 et A1.1**	**56 jours**	**04/01/2027**	**22/03/2027**
59	**Zone Centre A0.2 et A1.2-Travail en horraires décalés**	**39 jours**	**23/03/2027**	**14/05/2027**
67	**Zone OUEST A0.3-Travail en 2×8h – Délai 2 mois non prorogeable-Exécution impérative Juillet/Août**	**57 jours**	**14/06/2027**	**31/08/2027**
76	**Zone B0-Galerie A-B et A1.3**	**77 jours**	**17/05/2027**	**31/08/2027**
84	**Bât D**	**367,5 jours**	**04/01/2027**	**31/05/2028**
85	**Zone D0**	**101 jours**	**04/01/2027**	**24/05/2027**
86	**Marché Réfection des installation de chauffage et climatisation**	**101 jours**	**04/01/2027**	**24/05/2027**
96	**Marché Pièces Climatiques**	**81 jours**	**18/01/2027**	**10/05/2027**
105	Ajustements et réglages INTERNE INRAE-Phase 1	2 mois	30/03/2027	24/05/2027
106	Ajustements et réglages INTERNE INRAE-Phase 2	2 mois	11/05/2027	05/07/2027
107	**Zone D1**	**42 jours**	**03/11/2027**	**31/12/2027**
116	**Zone D2**	**42 jours**	**31/12/2027**	**29/02/2028**
126	**Zone D3**	**66 jours**	**29/02/2028**	**31/05/2028**
136	**Bât C**	**410,5 jours**	**04/05/2027**	**28/11/2028**
137	**Zone C0.1-OUEST**	**77 jours**	**04/05/2027**	**18/08/2027**
138	**Marché Réfection des installation de chauffage et climatisation**	**77 jours**	**04/05/2027**	**18/08/2027**
148	**Marché Pièces Climatiques**	**67 jours**	**11/05/2027**	**11/08/2027**
153	Ajustements et réglages INTERNE INRAE-Phase 1	2 mois	12/08/2027	06/10/2027
154	**Zone C0.2-EST**	**69,5 jours**	**29/07/2027**	**03/11/2027**
155	**Marché Réfection des installation de chauffage et climatisation**	**69,5 jours**	**29/07/2027**	**03/11/2027**
165	**Marché Pièces Climatiques**	**59,5 jours**	**05/08/2027**	**27/10/2027**
170	Ajustements et réglages INTERNE INRAE-Phase 2	2 mois	27/10/2027	22/12/2027
171	**Zone C1**	**43 jours**	**31/05/2028**	**31/07/2028**
181	**Zone C2**	**43 jours**	**31/07/2028**	**28/09/2028**
191	**Zone C3**	**43 jours**	**28/09/2028**	**28/11/2028**
200	**Bât B**	**138 jours**	**28/11/2028**	**08/06/2029**
201	**Zone B1**	**46 jours**	**28/11/2028**	**31/01/2029**
211	**Zone B2**	**46 jours**	**31/01/2029**	**05/04/2029**
221	**Zone B3**	**46 jours**	**05/04/2029**	**08/06/2029**
231	**GTB: interbâtiment et mise en service**	**208 jours**	**05/09/2028**	**22/06/2029**
234	**Dépose chaufferie et LT GF existant + réseaux existants généraux**	**40 jours**	**19/04/2029**	**14/06/2029**
235	Dépose chaufferie et LT GF existant + réseaux existants généraux	8 semaines	19/04/2029	14/06/2029
236	*Les OPR et mise en services se feront zone par zone*			
237	**Levée de réserves après Réception Finale**	1 mois	08/06/2029	06/07/2029
